

## PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA



## BILAN NATIONAL ANNUEL 2018

*Mars 2019*

---

## SOMMAIRE

---

<b>sOMMAIRE</b>	<b>2</b>
<b>Résumé exécutif</b>	<b>8</b>
<b>1 contexte</b>	<b>10</b>
<b>2 Présentation du PN-AEUE</b>	<b>11</b>
2.1 Objectifs	11
RAPPEL DES POINTS CLES DE LA SESSION A MI-PARCOURS DE 2018	11
2.2	11
Source : Rapport bilan à mi-parcours du PN-AEUE 2018	11
<b>3 Bilan physique DES REALISATIONS DE 2018</b>	<b>12</b>
3.1 Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	12
Produit 1: La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages	12
Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement	14
a) Sensibilisation de masse	14
b) Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint)	16
3.2 Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	20
Produit 1 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des secteurs urbains	20
Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement	20
3.1 Action 3 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	21
Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu rural (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)	21
Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	Erreur ! Signet non défini.
Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural	29
3.2 Action 4 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain	31
Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu urbain (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)	31
Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	32
Produit 3 : développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)	33
Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	33
3.3 Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	34
Produit 1 : Structuration et développement de la chaîne de valeur de l'assainissement	34
Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire	35
3.4 Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta	35

Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l'assainissement, à travers des thématiques pertinentes _____	35
Produit 2 : Amélioration des technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta _____	35
Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement _____	35
<b>3.5 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur</b>	<b>35</b>
Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées _____	35
Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats _____	36
Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages. _____	36
Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance _____	38
Produit 6 : La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA. _____	43
<b>4 bilan financier _____</b>	<b>45</b>
<b>4.1 Action1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural _____</b>	<b>45</b>
<b>4.2 Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain _____</b>	<b>45</b>
<b>4.3 Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural</b>	<b>45</b>
<b>4.4 Action 4 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain</b>	<b>50</b>
<b>4.5 Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale _____</b>	<b>51</b>
<b>4.6 Action 6 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale _____</b>	<b>51</b>
<b>4.7 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur</b>	<b>52</b>
<b>5 ANALYSE DES PERFORMANCES ET EVOLUTION DES INDICATEURS _____</b>	<b>55</b>
<b>5.1 Assainissement en milieu rural _____</b>	<b>55</b>
<b>5.2 Assainissement en milieu urbain _____</b>	<b>62</b>
<b>5.3 Assainissement national _____</b>	<b>64</b>
<b>6 Financement du programme _____</b>	<b>65</b>
<b>7 Principaux freins, actions correctives et recommandations _____</b>	<b>65</b>
<b>7.1 Principaux freins _____</b>	<b>65</b>
<b>8 Recommandations _____</b>	<b>67</b>
<b>9 CONCLUSION _____</b>	<b>68</b>
<b>ANNEXES _____</b>	<b>69</b>
<b>Annexe1 : Evolution du taux d'accès par province _____</b>	<b>70</b>

## LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Récapitulatif des résultats au 30 juin 2018	11
Tableau 2: Récapitulatif des taux d'exécution physiques par action	12
Tableau 3: Suivi des activités de promotion de l'abandon de la défécation à l'air libre (DAL) dans les villages au cours de l'année par région	12
Tableau 4: Récapitulatif de l'abandon de la DAL dans les villages depuis la mise en œuvre de l'ATPC	13
Tableau 5: Activités de sensibilisations de masse	14
Tableau 6: Bilan de la sensibilisation de proximité	16
Tableau 7: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural	21
Tableau 8: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural	22
Tableau 9: Situation des latrines semi-finies	23
Tableau 10: Bilan de la réalisation de latrines familiales et puisards domestiques	23
Tableau 11: Bilan de la réhabilitation des latrines familiales	24
Tableau 12: Situations et performance physiques relatives aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural	26
Tableau 13: Situation et performances physiques relatives aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural	27
Tableau 14: Situations et performance physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural	28
Tableau 15: Activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l'assainissement	29
Tableau 16: Réalisations des latrines familiales et puisards domestiques en milieu urbain	31
Tableau 17: Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics	32
Tableau 18: Extension du réseau collectif	33
Tableau 19: Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges	34
Tableau 20: Bilan des activités en matière de recherche	35
Tableau 21: mobilisation de ressources financières	36
Tableau 22: Exécution physique et financière des fonds 2018 transférés aux collectivités territoriales en milieu rural	37
Tableau 23: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu urbain par l'ONEA	38
Tableau 24: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux	38
Tableau 25: Voyages d'études et partage d'expérience réalisés dans le cadre des voyages	42
Tableau 26: Cadres de concertation communal en matière d'assainissement	43
Tableau 27: Taux d'exécution financière de l'Action 1 : éradication de la DAL en milieu rural	45
Tableau 28: Taux d'exécution financière de l'Action 2	45
Tableau 29: Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)	45
Tableau 30: Situation financière de la réalisation des puisards	47
Tableau 31: Situation de l'exécution des latrines dans les écoles (en millions de FCFA)	48
Tableau 32: Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé (en millions de FCFA)	49
Tableau 33: Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics	49
Tableau 34: Taux d'exécution financière de l'Action 4	50
Tableau 35 Taux d'exécution financière de l'action 7	52
Tableau 36: Exécution financière global selon les sources de financement (en millions de FCFA)	53
Tableau 37: Exécution financière du CUI selon les sources de financement (en millions de FCFA)	53
Tableau 38: Exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA)	54
Tableau 39: Taux d'exécution financière de l'Action 4	54
Tableau 40: Taux d'exécution financière globale du PN-AEUE	54
Tableau 41: Evolution du taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural par région	56
Tableau 42: Proportion des latrines par acteur	58
Tableau 43: Situation de l'état de Fin de défécation à l'air libre	59
Tableau 44: Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural	60

Tableau 45: Réalisation comparée de la phase 1 du PN-AEUE en milieu rural	61
Tableau 46: Taux d'accès à l'assainissement par zone administrative en milieu urbain	62
Tableau 47 : Récapitulatif des réalisations physiques en assainissement en milieu urbain	63
Tableau 48: Récapitulatif des réalisations sur le plan national	64
Tableau 49 : Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA)	65
Tableau 50: Difficultés et propositions de solutions	65
Tableau 51: Evolution du taux d'accès par province	70
Tableau 52: Indicateurs	72

## LISTES DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Taux d'exécution financière par source de financement	53
Figure 2 : Taux d'exécution financière du pilotage par source de financement	53
Figure 3 : Taux d'accès à l'assainissement familial en 2018 par région	55
Figure 4 : évolution du taux d'accès et population desservie	56
Figure 5 : Situation de disponibilité de dispositif de lavage des mains (DLM)	57
Figure 6 : Situation de la pratique de lavage des mains par les ménages	57
Figure 7 : situation de l'entretien des latrines dans les ménages	58
Figure 8 : Evolution du taux d'accès en milieu urbain	63
Figure 9 : Evolution du taux d'accès national	64

## SIGLES ET ABREVIATIONS

<b>ABS</b>	: Appui Budgétaire Sectoriel
<b>ACF</b>	: Association Chant de Femme
<b>ADAE</b>	: Association pour le Développement des Adductions d'Eau
<b>AEP</b>	: Approvisionnement en eau potable
<b>AEPA</b>	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
<b>AEPHA</b>	: Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement
<b>AEUE</b>	: Assainissement des Eaux Usées et Excréta
<b>AFDH</b>	: Approche Fondée sur les Droits Humains
<b>AMOC</b>	: Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
<b>ATPC</b>	: Assainissement Total Piloté par les Communautés
<b>ATPL</b>	: Assainissement Total Porté par les Leaders
<b>ASBC</b>	: Agents de Santé à Base Communautaire
<b>BD</b>	: Base de Données
<b>BPO</b>	: Budget Programme par Objectifs
<b>CADEPAC</b>	: Cellule d'Appui à la Décentralisation et à la Participation Citoyenne
<b>CAP</b>	: Connaissance Aptitude et Pratiques
<b>CCEA</b>	: Cadre de Concertation sur l'Eau et l'Assainissement
<b>CEMEau</b>	: Centre des Métiers de l'Eau
<b>CMP</b>	: Cadre de Mesure de Performance
<b>CNP</b>	: Comité National de Pilotage
<b>CRP</b>	: Comité Régional de Pilotage
<b>CSPS</b>	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
<b>CSD</b>	: Cadre Sectoriel de Dialogue
<b>CUCA</b>	: Cadre Unifié de Coordination de l'Assainissement
<b>CUI</b>	: Cadre Unifié d'Intervention
<b>DAL</b>	: Défécation à l'Air Libre
<b>DAO</b>	: Dossier d'Appel d'Offres
<b>DGA</b>	: Direction Générale de l'Assainissement
<b>DGESS</b>	: Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels
<b>DGEP</b>	: Direction Générale de l'Eau Potable
<b>DISE</b>	: Dispositif Intégré de Suivi Evaluation
<b>DPEA</b>	: Direction Provinciale de l'Eau et de L'Assainissement
<b>DREA</b>	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
<b>ENA</b>	: Enquête Nationale sur l'Assainissement
<b>ECOSAN</b>	: Ecological Sanitation (Assainissement Ecologique)
<b>FDAL</b>	: Fin de la Défécation à l'Air Libre
<b>GBV</b>	: Gestion des Boues de Vidange
<b>GEIS</b>	: Groupe Eau et Ingénierie Sociale

<b>GTEA</b>	: Groupe Thématiques Eau et Assainissement
<b>IEC</b>	: Information-Education-Communication
<b>IMS</b>	: Intermédiation Sociale
<b>INOA</b>	: Inventaire National des Ouvrages d'Assainissement en milieu rural
<b>INSD</b>	: Institut National des Statistiques et de la Démographie
<b>LSF</b>	: Latrines Semi Finies
<b>MEA</b>	: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement
<b>MOC</b>	: Maitrise d'Ouvrage Communal
<b>OCADES</b>	: Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité
<b>ODD</b>	: Objectifs du Développement Durable
<b>OMD</b>	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
<b>ONEA</b>	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
<b>ONG</b>	: Organisation Non Gouvernementale
<b>PAAMU</b>	: Promotion de l'Assainissement Autonome en milieu urbain
<b>PCD-EPA</b>	: Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
<b>PEA/GIZ</b>	: Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande
<b>PGEA</b>	: Programme Gouvernance Eau et Assainissement
<b>PHA</b>	: Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement
<b>PHA-BID-UEMOA</b>	: Programme d'Hydraulique et Assainissement financement BID-UEMOA
<b>PN-AEPA</b>	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
<b>PN-AEUE</b>	: Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excreta
<b>PNDES</b>	: Plan National de Développement Economique et Sociale
<b>PNGT</b>	: Programme National de Gestion des Terroirs
<b>PTF</b>	: Partenaire Technique et Financier
<b>RGPH</b>	: Recensement Général de la Population et de l'Habitat
<b>SAMOC</b>	: Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
<b>SNE</b>	: Stratégie Nationale de l'Eau
<b>STEP</b>	: Station d'Epuraton
<b>STBV</b>	: Station de Traitement des Boues de Vidange
<b>TCM</b>	: Toilette à Chasse Manuelle
<b>TIC</b>	: Technologie de l'Information et de la Communication
<b>UNICEF</b>	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
<b>VIP</b>	: Ventilated Improved Pit (Latrine à fosses ventilées)
<b>WHH</b>	: Welf Hunger Hilfe (ONG Allemande)

---

## RESUME EXECUTIF

---

Au 31 décembre 2018, le bilan d'exécution des activités du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta se résume ainsi qu'il suit.

### ❖ Pour l'action1

En 2018, 209 villages ont été déclenchés, 139 villages déclarés FDAL et 81 certifiés. Au total 1 342 villages ont été déclenchés depuis la mise en œuvre de l'ATPC dont 390 déclarés FDAL et 159 certifiés, portant ainsi le taux de certification à 11,8%. En ce qui concerne les sensibilisations de masse, 944 émissions ont été réalisées dans 9 régions portant sur divers thèmes. Pour les sensibilisations de proximité, 204 903 personnes ont pu être touchées dont 77 521 femmes, dans les ménages, dans 752 écoles et centres de formation, 880 centres de santé et 165 lieux publics.

### ❖ Pour l'action2

Pour cette action, seule la stratégie de fin de défécation à l'air libre en milieu urbain a été élaborée en cette année 2018. Au-delà de cela, aucune autre activité n'a pu être menée.

### ❖ Sur l'action3

Le bilan est le suivant:

- 22 174 latrines familiales avec un taux de réalisation de 58,1% ;
- 1 286 puisards réalisés pour un taux est de 56,6% ;
- 1035 latrines institutionnelles et publiques.

### ❖ Sur l'action 4

Les taux de réalisation ont été faibles avec respectivement 14,1% pour les latrines familiales soit 6906 latrines, 8,7% pour les puisards (2971) et 26,7% pour les latines institutionnelles et publiques.

### ❖ Sur l'action 5

Le taux de réalisation des stations de traitement des eaux usées et boues de vidange est resté nul. Cependant dans les stations existantes à Ouaga, Bobo et Dori, les quantités de boues de vidange et eaux usées collectées sont de 353 012 m<sup>3</sup> et 352 612 m<sup>3</sup>

### ❖ Sur l'action 6 :

Un thème de recherche à savoir « Recherche des barrières aux changements de comportement » a été identifié et mené par l'ONG Action contre la Faim dans la Province du Kéné Dougou dans la Région des Hauts-Bassins

### ❖ Sur l'action 7

- 199,461 millions ont été mobilisés par 5 régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre, Centre-Est et Sud-Ouest) à travers des sanithons, les fonds propres des collectivités, la coopération décentralisée et la diaspora.
- Sur les fonds transférés aux communes, 3 608 latrines sur 8 280 ont été réalisées soit un taux d'exécution physique de 43,6% pour un montant de 512,971 millions sur 920 millions transférés soit un taux d'exécution financière de 55,8%



- 2 337 personnes dont 703 femmes ont vu leurs capacités renforcées sur divers thématiques en lien avec l'assainissement.

### **Bilan financier**

Le taux d'exécution financière en milieu rural est de 65,6% soit 5 649,5 millions exécutés sur 8 617 millions programmés.

En milieu urbain, le taux d'exécution financière est de 55,2% soit 1 570,7 millions exécutés sur 2 844 millions programmés.

Le taux d'exécution globale financière est de 63%, soit 7 220,2 millions réalisées sur 1 1461 millions programmés.

### **Performance et évolution des indicateurs**

En milieu rural le taux d'accès à l'assainissement est passé de 15,1% à 16,4% pour une cible de 17%. La population totale desservie en milieu rural est égale- de **2 313 548 personnes**.

Le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain est passé de 38,3% en 2017 à 38,2% en 2018. Soit une régression de 0,1point. La cible qui était de 41% n'a pas été atteinte. La population desservie en milieu urbain est de **2 313 548 personnes**.

En milieu urbain le taux de réalisation a drastiquement chuté à 14,1% soit 6906 latrines familiales contre 89% en 2017. Le nombre total de puisards réalisés est également faible avec 2971 puisards. Ces réalisations ont permis de desservir 91 410 personnes additionnelles.

Sur le plan national le taux d'accès à l'assainissement est passé de 21,6% en 2017 à 22,6% en 2018 contre une cible de 24% qui n'est donc pas atteinte.

La population totale desservie à l'échelle nationale est de **4 468 907 personnes** sur une population totale du pays de **19 776 728 personnes**

---

## 1 CONTEXTE

---

Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel **N°2017-041/MEA/CAB** du 23 mars 2017, le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) à l'horizon 2030, qui est le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d'assainissement des eaux usées et excréta. L'objectif stratégique du programme est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Il comporte sept (7) actions réparties sur cinq (5) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs : les structures étatiques (MEA, MS, MENA, MUH, MATD, l'ONEA), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les associations et ONG, les privés, etc. La coordination est assurée par la Direction Générale de l'Assainissement (DGA).

Le programme est piloté par un Comité de Revue et supervisé par un Comité National de Pilotage (CNP) des Programmes de la Politique Nationale de l'Eau.

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au cours de l'année 2018. IL fait ressortir les informations relatives à l'avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le Plan Opérationnel 2016-2020 en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur la base des rapports bilans annuels régionaux, du rapport bilan annuel en milieu urbain et des données du Budget Programme par Objectif (BPO) pour le volet rural.

### 2.1 Objectifs

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement;
- assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques ;
- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L'objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats suivants.

### 2.2 RAPPEL DES POINTS CLES DE LA SESSION A MI-PARCOURS DE 2018

Tableau 1: Récapitulatif des résultats au 30 juin 2018

Désignation	Programmation physiques révisées au 30 juin 2018	Réalisations physiques au 30 juin 2018	Programmation financières révisées au 30 juin 2018 (en millions)	Montant engagé au 30 juin 2018 (en millions)
Latrines familiales neuves	32 609	14 957	3521,704	2 122,31
Latrines familiales réhabilitées	2 690	1 181	137	
Latrines écoles neuves	502	135	1598,932	539,561
Latrines écoles réhabilitées	44	40	7,463	
Latrines CSPS neuves	125	25	417,3274	139,076
Latrines CSPS réhabilitées	12	4	2,56	
Latrines publiques neuves	97	48	120,43	80,965
Latrines publiques réhabilitées	0	0	0	
Puisards domestiques neufs	2 273	3 605	35,98	22,25

Source : Rapport bilan à mi-parcours du PN-AEUE 2018

En rappel le taux d'accès national à l'assainissement au 31 décembre 2017 était de 21,6%.

Tableau 2: Récapitulatif des taux d'exécution physiques par action

Actions mise en œuvre en région	Taux d'exécution physique (%)
Action 1 :	85,1
Action 2 :	33,3
Action 3 :	100,6
Action 4 :	13,8
Action 5 :	50,0
Action 6 :	83,3
Action 7 :	86,7
<b>Programme</b>	<b>69,43</b>

Source : tableau d'évaluation des programmes du MEA

NB : la méthode de calcul ne prend pas en compte le volet financier et aussi les programmations financières globales n'étaient pas clairement données ; voilà pourquoi les taux financiers ne ressortent pas. en cas d'extrême besoin, se référer à la DAF/MEA

### 3.1 Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

**Produit 1: La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages**

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l'abandon de la défécation à l'air libre (DAL) dans les villages au cours de l'année par région

Régions	Nombre total de villages	Nombre de villages déclenchés	Nombre de villages déclarés FDAL	Nombre de villages certifiés FDAL	Coût d'exécution (millions)
Boucle du Mouhoun	1 019	17	0	1	-
Cascades	301	0	-	-	-
Centre	208	0	-	-	-
Centre-Est	756	0	0	0	-
Centre-Nord	829	35	13	0	-
Centre-Ouest	610	64	28	17	-
Centre-Sud	564	0	0	0	0
Est	874	16	61	55	108,74
Hauts-Bassins	535	1	0	0	-
Nord	862	0	0	0	0
Plateau Central	558	0	0	0	0
Sahel	684	74	36	7	0
Sud-Ouest	1 092	2	1	1	-
<b>Total National</b>	<b>8 892</b>	<b>209</b>	<b>139</b>	<b>81</b>	<b>108,74</b>

Source : Rapports bilan régionaux

Au cours de l'année 2018, les acteurs de mise en œuvre de l'ATPC ont déclenché 209 villages de 7 régions sur 340 villages programmés soit un taux de réalisation de 61,47%. Sur l'ensemble des villages déclenchés, 139 ont été déclarés FDAL et 81 ont été certifiés FDAL. Cinq (05) régions à savoir le Centre-Nord, le Centre-Ouest, l'Est, le Sahel et le Sud-Ouest enregistrent des villages ayant abandonné la défécation à l'air libre avec un pic de 61 villages pour la région de l'Est. Cette dernière compte également le plus grand nombre de villages certifiés FDAL (55 villages).

Les 7 autres régions n'ont pas connu d'activités d'ATPC à savoir : Cascades, du Centre, du Centre- Est, du Centre-Sud, du Nord et du Plateau Central.

**Tableau 4 : Récapitulatif de l'abandon de la DAL dans les villages depuis la mise en œuvre de l'ATPC**

Régions	Nombre total de villages	Nombre total de villages déclenchés depuis le début	Nombre de villages déclarés FDAL depuis le début	Taux de déclaration FDAL (%)	Nombre de villages certifiés FDAL depuis début	Taux de certification (%)
Boucle du Mouhoun	1 019	136	2	1,5	1	0,7
Cascades	301	5	0	0	0	0
Centre	208	44	0	0	0	0
Centre-Est	756	209	4	1,9	4	1,9
Centre-Nord	829	119	27	22,7	9	7,6
Centre-Ouest	610	119	73	61,3	44	37
Centre-Sud	564	0	0		0	-
Est	874	349	170	48,7	89	25,5
Hauts-Bassins	535	33	0	0	0	0
Nord	862	28	0		0	-
Plateau Central	558	90	0		0	-
Sahel	684	168	109	64,9	7	4,2
Sud-Ouest	1 092	42	5	11,9	5	11,9
<b>Total National</b>	<b>8 892</b>	<b>1 342</b>	<b>390</b>	<b>29,1</b>	<b>159</b>	<b>11,8</b>

Source : BD-AEUE, DGA

D'une manière générale, on constate un faible taux de certification FDAL des villages déclenchés dans les différentes régions sauf pour les régions du Centre-Ouest (37%) et de l'Est (25,5%). Cependant, le taux de programmation de villages à certifier en 2018 qui était de 10% a été atteint. Dans la région des Cascades, plusieurs acteurs ont entamé le processus de l'abandon de la Défécation à l'Air Libre sans pour autant l'achevé. Il serait intéressant de poursuivre les sensibilisations et le suivi des communautés afin d'atteindre un bon niveau de certification. Le constat est similaire pour la région du Centre ou une rencontre avec les acteurs de mise en œuvre a été tenue le 16 Novembre 2018 au sein de la Direction pour les interpellier afin que des efforts soient consentis pour l'accompagnement des villages déclenchés à atteindre le statut FDAL.

:

## Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement

### a) Sensibilisation de masse

Tableau 5: Activités de sensibilisations de masse

Régions	Nombre d'émissions	Thèmes abordés	Coût global des émissions de la région (engagé visé)	Coût global des émissions de la région Coût (liquidé visé)	Acteurs de mise en œuvre
<b>Boucle du Mouhoun</b>	502	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Construction, utilisation et entretien des latrines</li> <li>- Lavage des mains au savon</li> <li>- Hygiène corporelle, alimentaire, du milieu de vie et de l'eau de boisson</li> </ul>	4 000 000	-	SANYA-KAGNI SOS SAHEL
<b>Cascades</b>	02	Promotion de la réalisation de latrines à travers la campagne Faso Toilettes	16 550 000	16 550 000	Mairie de Banfora
<b>Centre</b>	-	-	-	-	-
<b>Centre-Est</b>	-	-	-	-	-
<b>Centre-Nord</b>	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le lavage des mains aux moments critiques</li> <li>- La consommation de l'eau sure</li> </ul>	-	-	CRS
<b>Centre-Ouest</b>	187	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les inconvénients de la défécation à l'air libre</li> <li>- Importance, utilisation et entretien des latrines</li> <li>- Amélioration des ouvrages d'assainissement</li> <li>- Hygiène et gestion du cadre de vie des populations</li> <li>- L'approche en matière d'assainissement familial mis en œuvre par APS dans la Sissili</li> <li>- Principes de base, signification et étapes de mise en œuvre de l'ATPC</li> <li>- Les moments critiques de lavage des mains</li> <li>- La gestion des fèces des enfants</li> <li>- La chaîne de l'eau</li> <li>- Les maladies liées au manque d'hygiène</li> <li>- Critères d'évaluation de la Fin de la Défécation à l'air Libre (FDAL)</li> </ul>	7 187 500	-	DREA-COS APS

Régions	Nombre d'émissions	Thèmes abordés	Coût global des émissions de la région (engagé visé)	Coût global des émissions de la région Coût (liquidé visé)	Acteurs de mise en œuvre
Centre-Sud	3	- Utilisation et entretien des latrines ; - Voies de contamination et barrières	275 000		MORIJA
Est	207	- Hygiène en milieu scolaire - Redevabilité sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement - Promotion des bonnes pratiques en matière d'eau, d'hygiène et d'assainissement - Importance des latrines : possession, utilisation et entretien - Lavage des mains : importance, technique et moments critiques - Hygiène corporelle et vestimentaire, du milieu et alimentaire ; - Salubrité autour des PEM (approvisionnement, consommation et conservation de l'eau potable)	24 375 000	23 875 000	HELVETAS/LAAFIA Programme Faso DREA/ consortium de radios SNV
Hauts-Bassins	38	- Lutte contre le péril fécal	-	-	ADAE/Wateraid
Nord	-	- La consommation de l'eau sure	-	-	-
Plateau Central	0	-	0	0	-
Sahel	117	- Sensibilisations sur les maladies hydriques - Promotion du maintien du statut FDAL ; - Utilisation et entretien des latrines; - Entretien des ouvrages hydrauliques; - Lavage de mains - Sensibilisations sur l'approche ATPC, - Sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène et les effets néfastes du manque d'infrastructures d'assainissement.	16 070 000	-	Commune de Dori DRC Commune de Falagountou UNHCR ECED OXFAM
Sud-Ouest	4	- Vulgarisation de l'arrêté portant hygiène et assainissement de la ville de Diébougou ; - Vision de la politique de l'eau et de l'assainissement - Salubrité et hygiène.	-	-	PEA-GIZ
<b>Total National</b>	<b>1130</b>	-	<b>68 457 500</b>	<b>40 425 000</b>	-

Les activités de sensibilisation de masse ont permis de toucher un grand nombre de personnes dont l'estimation demeure difficile au vu de la non disponibilité des données concernant le nombre de personnes ou de femmes touchées lors de certaines activités menées par les partenaires. La région de la Boucle du Mouhoun a réalisé le plus grand nombre d'émissions de sensibilisation de masse par les médias avec l'appui de ses partenaires et aussi dans le cadre des activités en prélude à la commémoration cette année de la Journée Mondiale de Toilettes et de la nuit de l'assainissement dans la région. A contrario, les régions du Centre, du Centre-Est et du Plateau Central n'ont enregistré aucune activité de sensibilisation de masse.

Dans la région des Cascades, hormis les émissions réalisées dans le cadre de la sensibilisation de masse, le partenaire WaterAid a réalisé des pièces de théâtre-forum. Afin d'engendrer un changement de comportement des populations des provinces de la Sissili, du Ziro et du Sanguié en matière d'hygiène et d'assainissement, la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre-Ouest a signé des partenariats avec des radios locales pour la mise en œuvre des actions de communication prévues à cet effet.

b) Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint)

Tableau 6: Bilan de la sensibilisation de proximité

Régions	Nombre de personnes touchées dans les ménages (a)	Nombre de femmes touchées dans les ménages (a1)	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (b)	Nombre d'élèves filles touchées (b1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (c)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (c1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (d)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (d1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)+(d)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)+(d1)	Thèmes	Coût
<b>Boucle du Mouhoun</b>	0	0	46	2621	1235	5	50	8	92	20000	10000	22 671	11 243	-Importance de l'assainissement dans le développement local	0
<b>Cascades</b>	36	0	76	5330	224	10	0	0	5	0	0	5 366	224	-promotion de la réalisation des latrines à travers la campagne Faso Toilettes ; -Propreté des latrines ; -Promotion de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire	14,55



Régions	Nombre de personnes touchées dans les ménages (a)	Nombre de femmes touchées dans les ménages (a1)	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (b)	Nombre d'élèves filles touchées (b1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (c)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (c1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (d)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (d1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)+(d)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)+(d1)	Thèmes	Coût
<b>Centre</b>	4	2	4	637	374	0	0	0	12	16210	8760	16 851	9 136	-IEC -Utilisation et entretien des latrines Ecosan et des produits dévirés de l'assainissement dans l'agriculture ; -Sensibilisation sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement	-
<b>Centre-Est</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1405	473	1 405	473	-Hygiène et assainissement -Voies de contamination par les fèces -Entretien et utilisation de latrines	-
<b>Centre-Nord</b>	-	-	472	14382	-	-	-	-	-	-	-	14 382	-	-Lavage des mains au savon ; -Consommation de l'eau sûre -Utilisation des toilettes et Gestion de l'hygiène menstruelle	-
<b>Centre-Ouest</b>	7616	3147	0	0	0	0	0	0	29	1250	850	8 866	3 997	-Construction et utilisation des latrines -Lavage des mains aux moments critiques Consommation et conservation de l'eau potable -Hygiène des aliments et du cadre de vie .	

Régions	Nombre de personnes touchées dans les ménages (a)	Nombre de femmes touchées dans les ménages (a1)	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (b)	Nombre d'élèves filles touchées (b1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (c)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (c1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (d)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (d1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)+(d)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)+(d1)	Thèmes	Coût
<b>Centre-Sud</b>	1025	-	5	-	-	0	0	0	0	0	0	1 025	-		0
<b>Est</b>	75137	38467	-	-	-	-	-	-	-	11628	6138	86 765	44 605	-promotion de l'hygiène, l'eau et de l'assainissement -Mise en œuvre de l'ATPC.	17,425
<b>Hauts-Bassins</b>	7817	4480	34	6068	2994	7	-	-	10	-	-	13 885	7 474	-Promotion de l'Hygiène et Assainissement en milieu scolaire -Utilisation sécurisée de l'eau de boisson à domicile et en milieu scolaire -Eau Hygiène et Assainissement -Gestion hygiéniques des Menstrues	-
<b>Nord</b>	4386	1012	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4 386	1 012	-Promotion des bonnes pratiques de l'hygiène et de l'assainissement	
<b>PCL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
<b>Sahel</b>	50823	25190	61	7657	3509	857	840	756	0	0	0	59 320	29 455	-Fin de la DAL -Utilisation et entretien des latrines	-
<b>Sud-Ouest</b>	0	0	53	782	369	0	0	0	0	0	0	782	369	-Gestion Hygiénique des menstrues	
<b>Total National</b>	<b>146 844</b>	<b>72 298</b>	<b>752</b>	<b>37 477</b>	<b>8 705</b>	<b>880</b>	<b>890</b>	<b>764</b>	<b>159</b>	<b>50 493</b>	<b>26 221</b>	<b>235 704</b>	<b>107 988</b>	-	<b>31, 975</b>

Source : Rapports bilan régionaux

Pour l'année 2018, les acteurs de l'assainissement ont mené plusieurs activités de promotion des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les ménages, dans 752 établissements scolaires et centres de formation, dans 880 centres de santé et dans 159 lieux publics (marchés, gares lieux de cultes.). Ces activités se sont menées à travers

des sensibilisations de proximité (VAD, causeries débats, théâtres forums) dans les ménages et la vulgarisation des stratégies PHA dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics.

Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ces campagnes de sensibilisations menées dans les différentes régions et ont porté entre autre sur :

- la promotion de l'hygiène et assainissement en milieu scolaire;
- la construction, l'utilisation et l'entretien des latrines ;
- le lavage des mains au savon ;
- la gestion hygiénique des menstrues ;
- les voies de contamination par les fèces;
- l'utilisation sécurisée de l'eau de boisson à domicile et en milieu scolaire;
- l'hygiène corporelle, alimentaire, du milieu de vie.

Ces actions de communication pour le changement de comportement ont permis de toucher environ 235 704 personnes dont 37 477 élèves. Certaines régions et acteurs de mise en œuvre, n'ont pas pu capitaliser ces actions de sensibilisation ainsi que le nombre de personnes touchées par leurs activités.

Seule la Région du Plateau Central n'a pas enregistré d'activités de sensibilisation de proximité

### **3.2 Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain**

#### **Produit 1 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des secteurs urbains**

Seule la stratégie de fin de défécation à l'air libre en milieu urbain a été élaborée en cette année 2018.

#### **Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement**

Les informations relatives au produit 2 n'ont pas été fournies

### 3.1 Action 3 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural

#### Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu rural (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)

Tableau 7: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural

Région	Traditionnelles sans dalle en béton (a)	Traditionnelles avec dalle en béton (b)	Sanplat / VIP une fosse (c)	VIP double fosse (d)	Ecosan (e)	Toilette à chasse d'eau manuelle (f)	Toilette à chasse d'eau mécanique (g)	Total latrines homologuées (b+c+d+e+f+g)	Total latrines (a+b+c+d+e+f+g)	Puisards	Fosses septiques
Boucle du Mouhoun	120	274	3 206	19	13	2	2	3 516	3 636	207	0
Cascades	12	80	1183	1	0	1	1	1 266	1 278	24	0
Centre	0	157	66	2	145	0	0	370	370	1	0
Centre-Est	0	321	356	7	4	0	1	689	689	7	1
Centre-Nord	10	822	595	0	48	0	0	1 465	1 475	8	0
Centre-Ouest	2 188	622	585	3	2	1	3	1 216	3 404	12	2
Centre-Sud	0	83	1 199	7	37	0	1	1 327	1 327	72	2
Est	62	308	781	0	0	0	2	1 091	1 153	65	0
Hauts-Bassins	74	95	5 561	4	0	0	1	5 661	5 735	744	1
Nord	99	970	1 110	1	1	0	2	2 084	2 183	16	0
Plateau Central	0	72	379	0	30	16	0	497	497	22	0
Sahel	1 010	13	1 199	34	0	0	0	1 246	2 256	55	0
Sud-Ouest	2	77	1 293	3	1	0	0	1 374	1 376	53	2
<b>National</b>	<b>3 577</b>	<b>3 894</b>	<b>17 513</b>	<b>81</b>	<b>281</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>21 802</b>	<b>25379</b>	<b>1 286</b>	<b>8</b>

Source : INOA 2018

En 2018, on note 21 802 nouvelles latrines homologuées réalisées sur l'ensemble du territoire national. Ces latrines sont en majorité des VIP (80,3%). Ces ouvrages proviennent majoritairement des Hauts-Bassins avec 26,0% des ouvrages suivi de la Boucle du Mouhoun avec 16,1%. Ces résultats sont à mettre à l'actif de l'Etat à travers l'ABS et ses partenaires. Ces réalisations sont inférieures à celles de l'an dernier qui était de 23 250 latrines.

A ces latrines homologuées, s'ajoutent 3 577 latrines traditionnelles sans dalle en béton qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du taux d'accès à l'assainissement. Pour ce type de latrines, ce sont les régions du Centre-Ouest et du Sahel qui en ont majoritairement réalisés avec respectivement 61,2% et 28,2%. Cela pourrait s'expliquer par la mise en œuvre de l'ATPC dans ces deux régions. L'an passé également, c'était le Centre-Ouest qui avait le dessus avec 55,1% suivi de l'Est 23,9%.

Enfin, dans l'ensemble, 25 379 latrines ont été réalisées au Burkina Faso. En 2018, les Hauts-Bassins demeurent en tête avec 22,6%, suivis de la Boucle du Mouhoun (14,3%) et du Centre-Ouest 13,4%.

En ce qui concerne la gestion des eaux usées, un total de 1 286 puisards et 8 fosses septiques ont été construits en 2018. La plupart des puisards a été réalisée dans les Hauts-Bassins (57,9%) et la Boucle du Mouhoun (16,1%).

Tableau 8: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

Régions	Traditionnelles avec dalle en béton (a)	Sanplat / VIP une fosse (b)	VIP double fosse (c)	Ecosan (d)	Toilette à chasse d'eau manuelle (e)	Toilette à chasse d'eau mécanique (f)	Total latrines homologuées (a+b+c+d+e+f)
Boucle du Mouhoun	6	8	0	0	0	0	14
Cascades	10	37	0	0	0	0	47
Centre	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	1	3	0	0	0	0	4
Centre-Nord	8	5	0	0	0	0	13
Centre-Ouest	71	4	0	0	0	0	75
Centre-Sud	1	0	0	0	0	0	1
Est	5	1	0	0	0	0	6
Hauts-Bassins	5	144	0	0	0	0	149
Nord	7	9	0	0	0	0	16
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	44	0	0	0	0	44
Sud-Ouest	2	1	0	0	0	0	3
<b>National</b>	<b>116</b>	<b>256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372</b>

Source : INOA 2018

Dans l'ensemble, 372 latrines ont été améliorées à travers des réhabilitations en 2018 au Burkina Faso. La majorité de ces réhabilitations ont été effectuées dans les hauts-bassins et le Centre-Ouest avec respectivement 40,1% et 20,2%.

De façon générale, pour ce qui est des nouvelles réalisations et des réhabilitations de latrines sur le plan national en 2018, on a enregistré à 25 751 dont 22 174 latrines homologuées et 3 577 latrines traditionnelles sans dalle

en béton. On dénote un recul des réalisations depuis l'avènement du PNAEUE car : en 2016 on comptait 31 614, en 2017 à 28 942 et à en 2018, 22 174 soit un recul de 8,5% en 2017 et 11,0% en 2018. Cela témoigne donc du supplément d'efforts qu'il y a à faire pour l'atteinte des objectifs du PNAEUE.

Tableau 9 : Situation des latrines semi-finies

Régions	Boucle du Mouhoun	Cascades	Centre	Centre-Est	Centre-Nord	Centre-ouest	Centre-Sud	Est	Hauts-Bassins	Nord	Plateau Central	Sahel	Sud-Ouest	Total
<b>Nombre</b>	860	623	870	686	571	869	1 662	648	1 173	149	526	1 655	235	<b>10 527</b>

Source : INOA 2018

En 2018, 10 527 latrines semi-finies ont été enregistrées. Cette situation résulte d'une insuffisance de l'intermédiation sociale (ImS) pour susciter l'intérêt pour l'achèvement des superstructures par les ménages d'une part, et d'autre part de la réticence des populations à adhérer au principe de l'assainissement. Cela témoigne d'un manque d'exploitation des ouvrages et la persistance de la défécation à l'air. Ces informations interpellent une fois de plus l'ensemble des acteurs sur les efforts à consentir afin de faire abstraction aux méfaits du péril fécal.

Tableau 10: Bilan de la réalisation de latrines familiales et puisards domestiques

Régions	Latrines familiales					Puisards domestiques				
	Program-mation révisée (a)	Réalizations				Program-mation révisée (a)	Réalizations			
		Issue de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (b+c)	Taux de (100*b/a) en %		Issue de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (b+c)	Taux de (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	4 633	3 516	0	3 516	75,9	388	-	207	207	-
Cascades	1 382	663	603	1 266	48	-	16	8	24	-
Centre	1 734	368	2	370	21,2	-	-	1	1	-
Centre-Est	1 382	675	14	689	48,8	-	-	7	7	-
Centre-Nord	1 016	1 016	449	1 465	100	-	-	8	8	-
Centre-Ouest	900	900	316	1 216	100	-	-	12	12	-
Centre-Sud	3 833	1 327	0	1 327	34,6	10	-	72	72	-
Est	1 550	1 080	11	1 091	69,7	-	-	65	65	-
Hauts-Bassins	8 336	5 194	467	5 661	62,3	1675	744	0	744	44,4
Nord	1 834	796	1 288	2 084	43,4	-	-	16	16	-
Plateau Central	1 794	497	0	497	27,7	-	-	22	22	-
Sahel	2 495	1 231	15	1 246	49,3	200	55	0	55	27,5
Sud-Ouest	1 720	928	446	1 374	54	-	-	53	53	-
<b>National</b>	<b>32 609</b>	<b>18 956</b>	<b>2 846</b>	<b>21 802</b>	<b>58,1</b>	<b>2273</b>	<b>815</b>	<b>471</b>	<b>1 286</b>	<b>56,6</b>

Source : INOA et rapports bilans régionaux 2018

Le taux de réalisation des latrines améliorées en 2018 est de 58,1% soit 21 802 latrines sur 32 609 programmées avec 2 846 hors programmations. Ce taux est largement supérieur à celui de 2017 qui était de 47,4%. En effet, le taux de réalisation en 2018 varie de 21,2% dans la région du Centre à 100% dans les régions du Centre-Nord et du Centre-Ouest. Seulement 6 régions ont un taux de réalisation supérieur à 50%. Ce sont les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, de l'Est, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest.

Les faibles taux enregistrés dans les autres régions s'expliquent entre autres par la défaillance des entreprises attributaires des travaux de réalisation des latrines familiales, la faible réalisation des latrines par les communes sur les ressources transférées de l'Etat, le retard accusé par certains projets comme PHA/BID-UEMOA dans les Hauts-Bassins et la non-exécution de certaines programmations des acteurs.

En outre, l'un des éléments qui expliquent les faibles taux de réalisation des latrines familiales est le non achèvement des latrines semi-finies des directions régionales par les ménages à qui incombe la réalisation des superstructures. Pour cette année, 10 527 latrines semi-finies non achevées ont été enregistrées. Il est aussi à remarquer que le nombre total (y compris les réhabilitations) de réalisations de latrines décroît de façon significative d'années en années depuis le début de la mise en œuvre du PNAEUE. En effet, en 2016, 28 535 latrines neuves ont été construites, 24 170 en 2017, contre 22 174 en 2018. Cette situation est préoccupante pour l'atteinte des cibles du programme afin de réaliser l'accès universel à l'assainissement. C'est pourquoi, tous les acteurs sont interpellés à redoubler d'efforts pour améliorer les taux de réalisation.

En ce qui concerne les puisards domestiques, 815 puisards ont été réalisés sur une programmation de 2 273 soit un taux de réalisation de 56,6%. Ce taux est meilleur que celui de l'année précédente qui était de 26,1%. Sur les quatre régions ayant programmé des réalisations, deux sont en dessous des 50% (Hauts-Bassins et Sahel) et les deux sont ont enregistré des réalisations hors-programmation (Cascades et Centre-Sud). Les raisons de cette défaillance pourraient être les mêmes que celles des latrines. Ainsi, il a été noté 471 réalisations en hors programmations, faisant passer le nombre total puisards réalisés à 1 286.

Tableau 11 : Bilan de la réhabilitation des latrines familiales

régions	Programmation révisée (a)	Réhabilitations			Taux (100*b/a) en %
		Issues de la programmation (b)	Réalisations hors programmation (c)	Total (b+c)	
Boucle du Mouhoun	0		14	14	-
Cascades	100	38	9	47	38
Centre	0		0	0	-
Centre-Est	0		4	4	-
Centre-Nord	0		13	13	-
Centre-Ouest	0		75	75	-
Centre-Sud			1	1	-
Est	0		6	6	-
Hauts-Bassins	2 090	149	0	149	7
Nord	0		16	16	-
Plateau Central	0		0	0	-
Sahel	500	1	43	44	0
Sud-Ouest	0		3	3	-
<b>National</b>	<b>2 690</b>	<b>188</b>	<b>184</b>	<b>372</b>	<b>7</b>

Source : INOA et rapports bilans annuels régionaux 2018



De l'observation du tableau, on note que 372 latrines familiales ont été réhabilitées en 2018 dont 188 issues des programmations sur 2 690 programmées et 184 en hors programmation soit un taux de réalisation de 7%. Ces réhabilitations sont enregistrées principalement dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et des Cascades

Dans un contexte de mise en œuvre des approches communautaires notamment l'ATPC, la réhabilitation des latrines (traditionnelles en améliorées) devant traduire l'amélioration de l'échelle de l'assainissement devrait s'effectuer dans toutes les régions. Cependant, les faibles taux des réhabilitations effectuées par les ménages et les acteurs ne sont pas encourageants et interpellent une fois de plus sur l'importance de l'ImS dans la mise en œuvre des activités.

## Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rura

Tableau 12: Situations et performance physiques relatives aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural

Régions	Programmation révisée		Réalizations						Programmation révisée		Réhabilitations					
	Globale (a)	Réservée aux filles(b)	Globale (c) issue de la programmation	Réalisées issues de la programmation réservée aux filles (d)	Hors programmation (e)	total f= c+e	Taux global programmé (c/a*100)	Taux réservé aux filles d/b*100)	Globale (a)	Réservée aux filles(b)	Globale (c) issue de la programmation	Réalisées issues de la programmation réservée aux filles (d)	Hors programmation (e)	total f= c+e	Taux global programmé c/a*100	Taux réservé aux filles d/b*100
Boucle du Mouhoun	33	2	33	3	29	62	100	100	1	0	0	0	0	0	0	-
Cascades	10	0	10	1	14	24	100	-	0	0	0	0	0	0	-	-
Centre	19	2	19	4	21	40	100	100	0	0	0	0	0	0	-	-
Centre-Est	29	0	22	2	12	34	75,9	-	0	0	1	0	0	1	-	-
Centre-Nord	149	0	79	32	1	80	53	-	0		2	1	0	2	-	-
Centre-Ouest	28	7	28	15	43	71	100	100	0	0	2	0	0	2	-	-
Centre-Sud	10	5	10	3	20	30	100	60		0	0	0	0	0	-	-
Est	36	2	36	9	25	61	100	100	1	0	1	0	2	3	100	-
Hauts-Bassins	23	0	23	9	24	47	100	-	0	0	0	0	0	0		-
Nord	25	1	20	9	40	60	80	100	2	0	1	0	0	1	50	-
Plateau Central	16	1	16	7	32	48	100	100	0	0	0	0	0	0	-	-
Sahel	101	1	9	16	47	56	8,9	100	40	0	0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	23	10	21	6	39	60	91,3	60	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>National</b>	<b>502</b>	<b>31</b>	<b>326</b>	<b>116</b>	<b>347</b>	<b>673</b>	<b>64,9</b>	<b>100</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>15,9</b>	<b>-</b>

Source : INOA et rapports bilans annuels régionaux 2018

Le taux de réalisation des blocs de latrines dans les écoles primaires est de 64,9% au niveau national soit 326 blocs de latrines réalisées. Ce taux est plus faible que celui de l'an dernier qui était de 85,2%. Au niveau des régions, le taux varie entre 8,9% et 100%. La région du Sahel enregistre le plus faible taux 8,9% : On note par ailleurs 347 réalisations en hors programmation soit 69,1% du total réalisé.

Au total 683 blocs de latrines ont été réalisées en 2018 dont 116 réservés aux filles soit 17,2%. Ce taux peut être jugé non équitable dans le contexte de l'approche fondée sur les droits humains où les acteurs doivent avoir un regard particulier sur les groupes vulnérables notamment la jeune fille. Cependant, les répartitions se font plus équitablement après la réalisation et au moment de l'utilisation des ouvrages.

On note également 9 réhabilitations des latrines dont 7 issues de la programmation sur 44 programmées soit 15,9%.

Tableau 13: Situation et performances physiques relatives aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural

Régions	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	13	13	1	14	100	2	0	0	0	0
Cascades	9	3	0	3	33,3	0		2	2	-
Centre	4	2	5	7	50	0		0	0	-
Centre-Est	13	13	3	16	100	0		0	0	-
Centre-Nord	17	17		17	100	0		0	0	-
Centre-Ouest	10	10	8	18	100	0		0	0	-
Centre-Sud	7	7	9	16	100	0		0	0	-
Est	3	3	21	24	100	0		0	0	-
Hauts-Bassins	5	5	7	12	100	0		0	0	-
Nord	13	13	4	17	100	0		0	0	-
Plateau Central	3	3	4	7	100	0		0	0	-
Sahel	17	0	11	11	0	10	0	0	0	0
Sud-Ouest	11	8	19	27	72,7	0		0	0	-
National	125	97	92	189	77,6	12	0	2	2	0

Source : INOA et rapports bilans annuels régionaux 2018

Le taux de réalisation des latrines dans les centres de santé est de 77,6% en 2018 contre 86,6% en 2017 soit une baisse de 10% en termes de performance. Deux régions ont un taux d'exécution inférieur à 50% : ce sont les régions des Cascades (33,3%), Sahel (0%). Ces contre-performances sont imputables aux procédures

de passation des marchés car des programmations n'ont pas pu être exécutées. Cependant 92 blocs ont été réalisés en hors programmation portant ainsi le total des réalisations à 189 latrines.

Aucune réhabilitation sur les 12 programmés mais 2 hors programmations ont été enregistrées.

Tableau 14 : Situations et performance physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural

Régions	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	5	5	16	21	100	0	0	1	1	-
Cascades	3	0	3	3	0	0	0	0	0	-
Centre	12	2	5	7	16,7	0	0	2	2	-
Centre-Est	13	13	6	19	100	0	0	0	0	-
Centre-Nord	5	4	1	5	80	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	10	10	14	24	100	0	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	2	2	-	0	0	0	0	-
Est	3	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	1	1	2	3	100	0	0	0	0	-
Nord	3	1	13	14	33,3	0	0	0	0	-
Plateau Central	19	12	5	17	63,2	0	0	0	0	-
Sahel	19	3	0	3	15,8	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	4	4	1	5	100	0	0	0	0	-
<b>National</b>	<b>97</b>	<b>55</b>	<b>68</b>	<b>123</b>	<b>56,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

Source : INOA et rapports bilans annuels régionaux 2018

Le taux de réalisation des latrines dans les lieux publics en 2018 est de 56,7% contre 71,3% l'an dernier soit une baisse de 14,6%. Le taux de réalisation varie de 0% dans les régions de l'Est et des Cascades à 100% dans les régions Boucle du Mouhoun, Centre-Est, Centre-Ouest, Hauts-Bassins, Sud-Ouest. Sur les 123 blocs de latrines réalisés 68 blocs sont des hors programmations.

Les Contre-performances enregistrés sont dues principalement au gel de lignes budgétaires, à la régulation du budget des structures étatiques, à la défaillance de certaines entreprises et au manque d'efficience de certains acteurs de mise en œuvre.

### Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

- a) Formations des acteurs au niveau communal (formation à l'endroit des acteurs de mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures : maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES...

Tableau 15 : Activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l'assainissement

Régions	Types de latrines (institutionnelles, publiques)	Nombre latrines confiées à un gestionnaire	Mode de gestion	Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements...)	Public cible	Nombre de participants			Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)	observation
						Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total			
Hauts-Bassins	Institutionnelles (VIP)	7	Communautaire	Mise en place de clubs d'hygiène ou de COGES	Elèves, enseignants, chef de poste et COGES	14	14	28	-	-	Péni, Toussiana
Boucle du Mouhoun	Institutionnelles et publiques	-	-	Formation en ATPC, formation sur la construction des latrines familiales à travers 94 foras	Elèves, enseignants, directeurs d'écoles, maires, SG des communes, associations, agents DREA, maçons, commerçants riverains	144	8	152	-	-	BID UEMOA, TDH, SOS SAHEL
Centre	Institutionnelles	-	-	Etat des lieux,	Elèves, enseignants, APE, AME	319	386	705	5,558	-	Ecoles primaires de Kuiti, de

				Sensibilisation à travers l'approche SARAR – PHAST, Mise en place et formation des Clubs de Santé Scolaires							Wapassi, angma, Rawilgue
<b>Centre-Est</b>	Latrines institutionnelles et publiques	18	-	Rencontres d'échanges, d'accompagnement des communes Formation/recyclage sur la gestion des latrines	Premiers responsables CSPS, Communes, potentiels gestionnaires.	11	6	17		-	-
<b>National</b>		<b>25</b>	-			<b>488</b>	<b>414</b>	<b>902</b>		-	

Source : Rapports bilans annuels régionaux 2018

Dans le cadre de la gestion des latrines, quatre (4) régions ont enregistré des renforcements de capacités. Au total 902 personnes ont été formées dont 46% de femmes. Le mode de gestion, le nombre de latrines gérées et le coût n'ont pas été précisés par les acteurs. Ces formations ont touché principalement le monde de l'enseignement et celui de la santé.

### 3.2 Action 4 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain

#### Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu urbain (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)

##### Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques

Tableau 16: Réalisations des latrines familiales et puisards domestiques en milieu urbain

Région	centres concernés	Latrines Familiales (nombre)			Puisards domestiques		
		Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %	Prévisions	Réalisations	Taux en %
Boucle du Mouhoun	Dédougou, Toma, Tougan, Boromo, Nouna, Solenzo	3 450	374	10,8	2 415	269	11,1
Cascades	Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou	750	123	16,4	525	144	27,4
Centre	Ouagadougou, Saaba, Pabré	18 500	120	0,6	12 950	80	0,6
Centre-Est	Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga	3 400	126	3,7	2 380	111	4,7
Centre-Nord	Kaya, Kongoussi, Boulsa	2 200	221	10,0	1 540	220	14,3
Centre-Ouest	Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Fara, Poura	2 900	1 929	66,5	2 030	272	13,4
Centre-Sud	Manga, Kombissiri, Pô	1 600	515	32,2	1 120	8	0,7
Est	Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama	1 200	157	13,1	840	139	16,5
Hauts-Bassins	Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé	9 050	1 839	20,3	6 335	1195	18,9
Nord	Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy	2 250	406	18,0	1 575	333	21,1
Plateau Central	Ziniare, Lombila, Bousé, Zorgho	1 000	445	44,5	700	19	2,7
Sahel	Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba	1 200	132	11,0	840	2	0,2
Sud-Ouest	Diébougou, Gaoua	1 500	519	34,6	1 050	179	17,0
<b>TOTAL NATIONAL</b>		<b>49 000</b>	<b>6 906</b>	<b>14,1</b>	<b>34 300</b>	<b>2971</b>	<b>8,7</b>

Source : Rapport ONEA 2018

On constate globalement une disparité des taux de réalisation d'une Direction régionale à l'autre. Notons que pour l'année 2018, nous constatons une grande contre-performance des réalisations aussi bien pour les latrines que pour les puisards domestiques, c'est ainsi que :

Le taux de réalisation le plus bas est enregistré au Centre avec 1% alors que c'est cette région qui devrait largement soutenir l'activité avec une prévision de 18 500 latrines à réaliser. Les taux de réalisations les plus élevés sont observés au Plateau Central avec 44,5% et au Centre-Ouest avec 66,5%.

De même que les latrines, les taux de réalisation des puisards sont également globalement faibles. Le nombre de puisards réalisés est de 2 971 constructions sur 34 300 attendues soit un taux de 9%. Les régions du Sahel, du Centre et du Centre-Sud enregistrent les plus faibles taux avec 0,2% pour le Sahel et 0,7% pour les deux autres. Les taux les plus élevés sont observés aux Cascades (27,4%) et au Nord (21,1%).

Les très faibles taux enregistrés s'expliquent par :

- la suspension des activités à Ouagadougou depuis septembre 2017 avec la fin du contrat du prestataire ;

- l'achèvement de plusieurs contrats au cours du premier semestre 2018 parmi lesquels on peut citer (i) le contrat du prestataire intervenant dans la ville de Bobo-Dioulasso, le 16 mars 2018, (ii) les contrats relatifs aux activités dans 8 villes (Yako, Gourcy, Dédougou, Nouna, Tougan, Kaya, Tenkodogo, Garango), le 29 avril 2018.

L'absence de prestataires pour la conduite des activités, notamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso a porté un énorme préjudice à la bonne exécution des activités. Le processus pour la sélection des nouveaux prestataires a accusé un sérieux retard et aussi les résultats de l'analyse technique des offres relatives au dossier de demande de propositions sont en attente de publication. En plus de cela il faut aussi noter que les objectifs 2018 devant obligatoirement s'aligner sur les objectifs du Contrat Plan qui était à sa dernière année avec des cumuls de gaps, étaient très optimistes.

## Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

### a) Principales activités de PHA menées dans les institutions et lieux publics en milieu urbain :

Les informations relatives au produit 2 n'ont pas été fournies

### b) Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics

Tableau 17: Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics

Régions	Latrines Scolaires (nombre)			Lieux publics (y compris les centres de santé)		
	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation (100*b/a) en %	Prévisions	Réalisations	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	8	0	0,0	20	3	15,0
Cascades	-	-	-	13	-	-
Centre	29	10	34,5	57	26	45,6
Centre-Est	12	0	0,0	11	-	-
Centre-Nord	11	-	-	11	-	-
Centre-Ouest	16	0	0,0	20	2	10,0
Centre-Sud	-	1	-	-	1	-
Est	5	0	0,0	6	-	-
Hauts-Bassins	22	3	13,6	26	24	92,3
Nord	-	-	-	14	5	35,7
Plateau Central	-	-	-	-	3	-
Sahel	-	-	-	-	2	-
Sud-Ouest	9	0	0,0	10	-	-
<b>Total National</b>	112	14	12,5	188	66	35,1

Source : ONEA 2018

Pour ce qui est de la réalisation des ouvrages dans les établissements scolaires, les taux sont faibles dans l'ensemble et varient entre 0% et 34%. Le taux le plus élevé est observé dans la région du Centre suivi de la région des Hauts-Bassins. Le taux est nul dans les 11 autres régions.

En ce qui les lieux publics, les taux sont également faibles dans l'ensemble. Cinq régions ont un taux non nul qui varie entre 10% et 92% et les huit autres ont un taux nul.



Le faible taux de réalisation des ouvrages publics est dû d'une part à la suspension des activités de réalisation des ouvrages communautaires par l'ONEA en raison des difficultés financières, et d'autre part au retard enregistré pour la réalisation des ouvrages communautaires prévus dans le cadre du projet AAB/KFW.

**Produit 3 : développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)**

Tableau 18: Extension du réseau collectif

Régions concernées	Réseaux d'assainissement collectifs (Km)			Nombre de raccordements aux réseaux collectifs		
	Prévisions	Réalisation	Taux (100*d/a) en %	Prévisions	Réalisation	Taux (100*d/a) en %
Centre (Ouagadougou)	10	0	0	10	4	40
Hauts Bassins (Bobo)	0	0	-	0	0	-
<b>Total National</b>	10	0	0	10	4	40

Source : ONEA 2018

L'extension du réseau d'assainissement collectif prévue pour 2018 n'a pas été réalisée. Une petite prévision a été faite pour les raccordements sachant qu'il existe toujours quelques parcelles avec des difficultés de raccordement. Ces difficultés sont levées au fur et à mesure et c'est ce qui explique que 4 parcelles ont pu être raccordées au réseau d'assainissement collectif.

- a) Intermédiation sociale en matière d'AEUE

Il n'est pas mené d'intermédiation sociale dans ce domaine.

- b) Etudes et réalisation des ouvrages d'assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP et STBV)

Les études d'extension du réseau d'assainissement collectif de Ouaga sont en cours.

**Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain**

- a) Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l'adaptant aux principes d'accès durable à l'assainissement, d'équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé :
- b) Adoption, diffusion et mise en œuvre de la stratégie PPP sectorielle :
- c) Formations des acteurs communaux en milieu urbain :

Les informations sont faiblement capitalisées en milieu urbain sur cette activité.

### 3.3 Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

#### Produit 1 : Structuration et développement de la chaîne de valeur de l'assainissement

Tableau 19 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges

Régions	Nombre de site de dépotage des boues de vidange	Quantité de boues collectées (m <sup>3</sup> )	Quantité de boues traitées (m <sup>3</sup> )	Nombre de vidangeur informel	Nombre de vidangeur professionnel	Existence d'association de vidangeurs (1=oui ; 2=non)
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	-
Cascades	-	-	-	-	-	-
Centre	3	330 368	330 368	-	151	1
Centre-Est	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	1	-	-	-	-	2
Centre-Ouest	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	-	-	-	-	-	-
Est	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	1	21 944	21 944	23	49	1
Nord	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	-	-	-	-	-	-
Sahel	1	700	300	4	1	-
Sud-Ouest	-	-	-	-	-	2
<b>Total National</b>	6	353 012	352 612	27	201	-

Source : ONEA 2018

La valorisation des boues de vidange au niveau régional est un domaine en cours d'opérationnalisation. En 2018, ce secteur a connu très peu d'activités car seules les régions du Centre, du Centre-Nord, des Hauts-Bassins et du Sahel ont enregistré des données pour ce point.

Dans la région du Centre et plus précisément dans la ville de Ouagadougou, l'activité s'est résumée à la collecte et au traitement de 330 368 m<sup>3</sup> sur une prévision de 105 663 m<sup>3</sup> soit un taux de collecte de 334%. On remarque donc un dépassement des capacités de collecte des 3 STBV qui ne sont réalisées qu'à 50%.

Dans la Région du Centre-Nord, la seule activité menée est le choix d'un site de dépotage des boues de vidange.

Pour la région des Haut-Bassins, un contrat existant entre la société minière Houndé Gold Operation et la Commune de Houndé confère à la commune la fonction de vidangeur professionnel, chargé de la collecte et du traitement des boues de vidange produites au niveau de la mine. Dans la ville de Bobo, il y a eu 20 984 m<sup>3</sup> de boues traitées sur une prévision de 78 750 m<sup>3</sup> donc une sous exploitation de la STBV de cette ville.

En ce qui concerne la région du Sahel, un seul acteur a entrepris des activités entrant dans le cadre de la gestion des boues de vidange dont les études sont en cours (de quoi et par qui ?). En plus de cela, la Commune de Dori a à son actif 700 m<sup>3</sup> de boues de vidanges collectées avec 300 m<sup>3</sup> traitées. Un seul (01) vidangeur professionnel est recensé à Dori, les autres exercent dans l'informel.

## Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire

### 3.4 Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

**Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l'assainissement, à travers des thématiques pertinentes**

Tableau 20 : Bilan des activités en matière de recherche

Thèmes identifiés	Thèmes traités	Acteurs	Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)
Recherche des barrières aux changements de comportement	Barrières à l'utilisation des latrines	ONG Action contre la Faim	-	-

Un thème de recherche à savoir « recherche des barrières aux changements de comportement est identifié et mené par l'ONG Action contre la Faim dans la province du Kénédougou dans la région des Hauts-Bassins.

### **Produit 2 : Amélioration des technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta**

Aucune activité n'a été capitalisée pour le compte de ce produit.

### **Produit 3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement**

Aucune activité n'a été capitalisée pour le compte de ce produit

### 3.5 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

**Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées**

Au cours de l'année, 199,461 millions ont été mobilisés par 5 régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre, Centre-Est et Sud-Ouest) à travers des sanithons, les fonds propres des collectivités, la coopération décentralisée et la diaspora.

En effet, dans le cadre de la Nuit de l'assainissement tenue à Dédougou le 24 Novembre 2018, les leaders et acteurs de la région ont mobilisé 47,095 millions de FCFA pour la subvention de latrines pour la Région. Les différentes mobilisations financières des communes issues des sanithons s'élèvent à 5,195 millions de FCFA.

Dans la Région du Centre, les communes ont mobilisé 52,6 millions sur fonds propres et plus de 30 millions à travers la coopération décentralisée (jumelage). Egalement, cette coopération décentralisée a permis à des communes du Centre-Est (Boussouma, Garango et Komtoèga) de mobiliser 24,5 millions pour le financement de l'assainissement. On note aussi que la commune de Diébougou dans le Sud-ouest a organisé un Sanithon communal qui a permis de récolter 7,875 millions, ce qui est une initiative à encourager et à perpétuer dans toutes les communes.

Tableau 21: mobilisation de ressources financières

Régions	Montant total mobilisé (millions)	Sanithon	Mécanismes endogènes de financement		Stratégie de mobilisation de ressources extérieures				Autres stratégies (à préciser)
			Fonds propres	Ménages	Diaspora	Coopération décentralisée (jumelage)	PTF	Tables-rondes	
Boucle du Mouhoun	47,095	46,945	0	0	0	0	0,15	0	0
Cascades	34,8	0	0	9,975	24,825	0	0	0	0
Centre	85,183	-	52,568	2,300	-	30,315	-	-	-
Centre-Est	24,508	0	0	0	0	24,508	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	7,875	7,875							
<b>TOTAL</b>	<b>199,461</b>	<b>54,820</b>	<b>52,568</b>	<b>12,275</b>	<b>24,825</b>	<b>54,823</b>	<b>0,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Source : Rapports bilan régionaux 2018

**Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats**

**Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.**

Grâce aux activités d'intermédiation sociale et l'ATPC menés par les acteurs, on constate une progression des autoréalisations des ouvrages d'assainissement par les ménages. En plus de l'achèvement des latrines semi-finies par les ménages, des fonds sont mobilisés sur fonds propre des ménages (12,275 millions) dans les régions du Centre et des Cascades pour la promotion de l'assainissement.

**Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance**

Tableau 22: Exécution physique et financière des fonds 2018 transférés aux collectivités territoriales en milieu rural

Région	Nombre communes bénéficiaires	Nouvelles réalisations de latrines						
		Nombre			Montants			
		Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé)%
Boucle du Mouhoun	2	1350	639	47,3	150	64,48	42,98	43,0
Cascades								
Centre	2	1350	1073	79,5	150	104,320	-	69,5
Centre-Est	2	1350	350	25,9	150,0	36,921		24,6
Centre-Nord								
Centre-Ouest	2	900	618	68,7	100	87,680	-	87,7
Centre-Sud	2	1080	0	0	120	0		0,0
Est								
Hauts-Bassins	2	900	450	50	100	98,200	-	98,2
Nord								
Plateau Central								
Sahel	2	1350	478	35,4	150	121,370	-	80,9
Sud-Ouest								
<b>TOTAL</b>	<b>14</b>	<b>8280</b>	<b>3608</b>	<b>43,6</b>	<b>920</b>	<b>512,971</b>	<b>42,980</b>	<b>55,8</b>

Source : Rapports GTEA régionaux 2018

En 2018, le MEA à travers la DGA a transféré 920 millions de FCFA à 14 communes de 7 régions pour la réalisation de 8 280 latrines. Au 31 décembre 2018, sur l'ensemble des 14 communes, seulement 3 608 latrines ont été réalisées soit un taux de réalisation de 43,6% pour un taux d'engagement financier de 55,8%. Les communes des Hauts-Bassins et du centre-ouest ont le plus fort taux de réalisation avec respectivement 98,2% et 87,7%. Par contre les communes de Béguedo au Centre-Est, de Gossina dans la Boucle du Mouhoun, de Toécé et Bindé dans le Centre-Sud et de Seytenga au Sahel n'ont effectué aucune réalisation (0%) sur les fonds transférés. Cette situation est inquiétante et interpelle toujours les acteurs sur les capacités des communes dans l'exécution des fonds transférés.

Tableau 23: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu urbain par l'ONEA

Année de transfert	Régions	Communes urbaines bénéficiaires	Montant transférés
2017	Plateau central	Zorgho	500
<b>Total 2017</b>			500
2018	Centre-Sud	Manga	700
		Kombissiri	700
	Sahel	Dori	1200
	Plateau central	Ziniaré	500
<b>Total 2018</b>			3100

Source : Rapport d'activités de l'ONEA

Les fonds transférés par l'ONEA aux communes servent à la mise en œuvre de toutes les activités d'assainissement (appui au fonctionnement du service technique communal, renforcement des capacités, intermédiation sociale, réalisation des ouvrages dans les ménages et les lieux publics, suivi-évaluation, ...)

Au total 231,5231 millions ont été transférés à quatre (4) communes urbaines pour la réalisation de 3 600 latrines.

**Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance**

Tableau 24 : Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible	Nombre de participants			Coût (engagé visé) en millions	Acteurs/com manditaires
			Hommes	Femmes	Total		
Boucle du Mouhoun	-	0	0	0	0	0	0
<b>Cascades</b>							
Cascades	Stratégies d'approche sociale et de promotion de l'hygiène et de l'assainissement au niveau local	Relais communautaires	30	20	50	0,833	DREA-CAS
	Les techniques de construction des ouvrages d'assainissement	Maçons	15		15	0	Association des maçons de Sidéradougou
<b>Total CAS</b>			45	20	65	0,833	
Centre	-	0	0	0	0	0	
Centre-Est	-	0	0	0	0	0	
Centre-Nord	-	0	0	0	0	0	

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible	Nombre de participants			Coût (engagé visé) en millions	Acteurs/com manditaires
			Hommes	Femmes	Total		
<b>Centre-Ouest</b>							
Centre-Ouest	Le nouveau canevas de collecte de données sur l'assainissement	Communes et ONG	36	2	38	1,6815	DREA-COS
	La planification, le suivi de la mise en œuvre des activités d'assainissement et d'hygiène	communes	172	160	332		UNICEF
<b>Total COS</b>			208	162	370	1,68	
Centre-Sud	-	0	0	0	0	0	
<b>Est</b>							
Est	Atelier d'échange et d'information sur la réalisation des latrines familiales	Maires, Représentants d'entreprises et de bureaux d'études	30	5	35	1,494	DREA-Est
	Le remplissage des fiches de collectes des données sur les ouvrages du PN-AEUE	SGM partenaires régionaux	45	5	50	1,611	DREA-Est
	Tenue des sessions du CRP	Membres permanents	50	10	60	1,2135	DREA-Est
	Atelier Provincial d'information sur l'ATPC	Haut-commissaire, Maires, Points focaux EA, STD, OSC	50	10	60	1,462	DREA-Est
	Concours pour la promotion et de l'hygiène et l'assainissement	Enseignants/ 17 écoles	80	26	106	3,172	SNV
	C4D : renforcement des capacités en techniques de communication sociale en matière d'eau, hygiène et assainissement	CAV/Q	195	202	397	4,0915	SNV/UNICEF
	C4D : renforcement des capacités en techniques de communication sociale en matière d'eau, hygiène et assainissement	DREA, partenaires	62	20	82	8,8992	UNICEF
	Rencontre d'information et d'échanges sur la question du transfert de la coordination de la poursuite des bonnes pratiques.	Administrations communales et relais communautaires	68	27	95	3,748	Programme Fas'Eau
<b>Total EST</b>			580	305	885	25,691	
<b>Hauts-Bassins</b>							

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible	Nombre de participants			Coût (engagé visé) en millions	Acteurs/com manditaires
			Hommes	Femmes	Total		
Hauts-Bassins	Mobilisation des ressources dans le cadre de l'AEPA	Agents et élus locaux	10	1	11		GIZ
	Formation et équipement des maçons sur les techniques de construction des ouvrages d'assainissement	Maçons	113	0	113		PHA/BID-UEMOA, GEIS
	Importance de l'assainissement dans le développement local	Eus locaux et techniciens eau et assainissement	30	8	38		PEA/GIZ
	Promotion de l'Hygiène et Assainissement	Comités EHA, Hygiénistes, clubs scolaires	146	146	292		GEIS
<b>Total HBS</b>			299	155	454	0	
<b>Nord</b>							
Nord	Formation des SG sur les fiches de collectes	SG de communes	29	2	31	0,99	DREA
<b>Total Nord</b>			29	2	31	0,99	
Plateau Central	-	0	0	0	0	0	
<b>Sahel</b>							
Sahel	Atelier de formation des DREA et structures partenaires sur la stratégie WASH United	Acteurs Wash	16	12	28		DGA
	Formation en Choléra: Réponse d'urgence et élimination	Acteurs Wash	20	5	25		OXFAM
	Formation sur la gestion des bases de données	Agent DREA	5	0	5	2	DREA-SHL
<b>Total SHL</b>			41	17	58	2	
<b>Sud-Ouest</b>							
Sud-Ouest	Le remplissage des fiches de collecte des données	Maires et SGM	26	1	27	-	DREA
	L'Approche Fondée sur les Droits Humains en eau et assainissement	Agents DREA SUO	3	0	3		SPONG
	Les Systèmes d'Information Géographique (SIG)	Agents DREA SUO	6		6		
<b>Total SUO</b>			35	1	36		
<b>DGA</b>							
DGA	La supervision régionale de la collecte de données	Agents DREA	24	15	39	6,465	DGA/DGEP



Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible	Nombre de participants			Coût (engagé visé) en millions	Acteurs/com manditaires
			Hommes	Femmes	Total		
	La collecte des données par les points focaux	Points focaux AEPHA	356	12	368	26,211	DGA/DGEP
	Le wash united	Agents DREA, MENA, santé et associations	14	13	27		DGA
	Le Suivi-évaluation axé sur les résultats et performances	agents DGA	2	0	2	7,429	DGA
	La Communication pour le changement de comportement	agents DGA	1	1	2	7,429	DGA
<b>Total DGA</b>			<b>397</b>	<b>41</b>	<b>438</b>	<b>47,534</b>	
<b>Total National</b>			<b>1 634</b>	<b>703</b>	<b>2 337</b>	<b>79</b>	

Source : rapports bilans régionaux 2018

Au cours de l'année 2018, les acteurs de l'assainissement ont réalisé plusieurs sessions de formation au profit de 2 337 personnes dont 703 femmes pour un cout d'environ 79 millions. On rappelle que le coût de certaines formations n'a pas été précisé. Ces actions de renforcement de capacités ont abordé plusieurs thématiques aussi variées et importantes pour le développement de l'assainissement dont entre autres les techniques de communication sociale pour le changement de comportement, les techniques de réalisations des ouvrages d'assainissement, l'AFDH, le suivi-évaluation et la GAR, la promotion de l'hygiène et de l'assainissement.

## Etudes réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain

Au cours de l'année 2018, seule la région du Sahel a bénéficié d'une étude menée par Wateraid pour un montant de 3 millions Ce qui dénote un faible intérêt des acteurs à effectuer des études dans le domaine de l'assainissement.

Tableau 25: Voyages d'études et partage d'expérience réalisés dans le cadre des voyages

Régions	Voyage d'étude et partage d'expérience	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Acteurs /comm anditaires	Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)
			Nombre d'hommes	Nombre de femmes	Nombre total			
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	Voyage d'études et de partage d'expérience sur la réalisation des latrines ECOSAN dans la Commune de Ziniaré	Agents de la DREA-Cen	2	1	3	DREA	0,169	0,169
Centre-Est	Voyage d'étude à Dori sur la gestion des boues de vidange	Administration communale	5	0	5	Commune de Kaya	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest								
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>		<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0,169</b>	<b>0,169</b>

Source : Rapports bilans régionaux 2018

Dans le cadre du partage d'expériences en matière d'assainissement, les acteurs de 2 régions ont effectué deux voyages d'études pour s'enquérir des expériences réussies en matière d'assainissement dans d'autres communes.

En effet, les agents de la DREA Centre ont effectué un voyage d'étude sur la réalisation des latrines ECOSAN dans la commune de Ziniaré (Plateau Central) et les autorités de la commune de Kaya sont allées acquérir des connaissances sur la gestion des boues de vidange de la ville de Dori (Sahel).

Tableau 26 : Cadres de concertation communal en matière d'assainissement

Régions	Communes	Type de cadre	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Coût (engagé visé)	Coût (liquidé visé)
				Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total		
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	Péni Toussiana	Cadre de concertations communales sur l'Eau et l'assainissement	Membre des CCEAU	32	13	45		
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	Gorom-gorom, Falagountou	Comité communal de suivi des activités du projet	Mairies, STD, Bénéficiaires et promoteurs ECED Sahel	30	10	40	2	2
Sud-Ouest								
TOTAL	4			62	23	85	2	2

Source : Rapports bilan régionaux 2012

Quatre communes (Péni, Toussiana, Gorom-gorom, et Falagountou) ont tenu chacune un cadre de concertation sur l'eau et l'assainissement.

**Produit 6 : La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA.**

### 1.1 Cadres de concertation au niveau régional et national

Plusieurs activités entrant dans le cadre des concertations ont été menées au cours de l'année 2018. Ce sont :

- la tenue des 23<sup>e</sup> Comités Régionaux de Pilotage sur l'eau et l'assainissement dans toutes les régions en juillet 2018 ;
- la tenue du 1<sup>er</sup> comité de revue du PN-AEUE en juillet 2018 Ouagadougou;
- la tenue de la revue annuelle 2017 du Cadre Sectoriel de Dialogue Environnement-Eau-Assainissement (EEA) le 29 mars 2017 Ouagadougou ;

- la tenue de deux ateliers de concertation DREA, DGA et partenaires en février et décembre 2018 à Manga et à Ouagadougou.
- la célébration de la Journée mondiale des toilettes le 24 novembre 2018 Dédougou;
- l'organisation d'un séminaire/colloque international sur l'assainissement au Burkina Faso par IRC du 20 au 21 Septembre 2018 à Ouagadougou.

## **1.2 Le suivi-évaluation du programme**

Dans le cadre du suivi-évaluation et de la programmation on peut citer :

- la participation à la rédaction du rapport d'évaluation des performances 2017 de la politique nationale de l'eau pour le décaissement de l'ABS 2018 de l'Union Européenne pour la période 2016 -2020 ;
- la rédaction du rapport d'évaluation des performances 2016 du Burkina Faso en matière d'eau et d'assainissement pour le Conseil des Ministres Africains pour l'Eau (AMCOW)
- la réalisation de la collecte nationale des ouvrages d'assainissement avec les points focaux communaux pour la mise à jour des données AEUE 2018 ;
- la saisie et le traitement des données de la mise à jour de la base de données AEUE 2017 du 04 au 26 janvier 2018 à la DGA ;
- Tenue des ateliers d'appui aux régions pour l'élaboration du BPO 2019-2021 en novembre -décembre 2018 à Ziniaré et à Koudougou;
- Suivi-évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC dans les différentes régions.

## 4 BILAN FINANCIER

### 4.1 Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Tableau 27 : Taux d'exécution financière de l'Action 1 : éradication de la DAL en milieu rural

Région	Programmation	Réalisation	Taux de réalisation
Boucle du Mouhoun	52	33	63,5
Cascades	0	21,55	-
Centre	8,038	8,038	100,0
Centre-Est	19,092	16,592	86,9
Centre-Nord	0	0	-
Centre-Ouest	23,728	23,728	100,0
Centre-Sud	0,275	0,275	100,0
Est	36,205	30	82,9
Hauts-Bassins	0	0	-
Nord	5	5	100,0
Plateau Central	0	0	-
Sahel	0	0	-
Sud-Ouest	5,4	5,4	100,0
<b>Total National</b>	<b>141,7</b>	<b>113,583</b>	<b>80,2</b>

Source : Rapports bilans régionaux 2018

Pour l'année 2018, le montant total programmé pour la réalisation des activités de l'Action 1 du PN-AEUE (Eradication de la DAL en milieu rural) s'élevait à 141,7 millions de FCFA. Le montant dépensé pour ces activités sur la base de la programmation est de 113,583 millions de FCFA, soit un taux d'exécution de 80,2%.

### 4.2 Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Tableau 28 : Taux d'exécution financière de l'Action 2

Source de financement	Prévision (millions francs CFA)	Réalisation (millions francs CFA)	Taux (%)
Financements extérieurs	880	315,8	36%
Financements propres	285	98,5	35%
<b>TOTAL</b>	<b>1 165</b>	<b>414,3</b>	<b>36%</b>

Source : ONEA

Les dépenses effectuées pour cette action ont cerné principalement les contrats d'ingénierie sociale en milieu urbain. Par ailleurs l'élaboration de la stratégie FDAL a été financée directement par le PEA/GIZ à hauteur de 14 millions sur une prévision de 15 millions. Ce qui porte le montant total exécuté à 428,3 millions

### 4.3 Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural

Tableau 29 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

Régions	Réalisation de latrines familiales					Réhabilitation de latrines familiales				
	Montant engagé en millions					Montant engagé en millions				
	Program mation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a ) en %	Program mation révisée (a)	Issues de la Programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %
Boucle du Mouhoun	543,97	367,2	0,0	367,2	67,5	0	0	0	0	
Cascades	120,08	90,9	120,0	210,9	75,7	3,2	1,995	0,27	2,265	62,3
Centre	249,39	150,6	1,0	151,6	60,4	0	0	0	0	-
Centre-Est	195,22	177,9	0,5	178,5	91,2	0	0	0	0	-
Centre-Nord	172,76	151,4	25,3	176,6	87,6	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	100,00	100,0	0,0	100,0	100,0	0	0	0	0	-
Centre-Sud	461,87	329,0	0,0	329,0	71,2	0,9	0	0	0	0
Est	157,10	130,1	95,2	225,3	82,8	0	0	0	0	
Hauts- Bassins	809,89	740,9	19,6	760,5	91,5	104,9	0	0	0	0
Nord	75,91	63,4	5,2	68,6	83,6	0	0	0	0	-
Plateau Central	543,97	161,0	3,6	164,5	29,6	0	0	0	0	-
Sahel	230,43	214,2	1,3	215,5	92,9	28	0	0	0	0
Sud-Ouest	110,50	109,9	0,0	109,9	99,4	0	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>3771,09</b>	<b>2 786,5</b>	<b>271,6</b>	<b>3 058,1</b>	<b>73,9</b>	<b>137</b>	<b>1,995</b>	<b>0,27</b>	<b>2,265</b>	<b>1,5</b>

Source : Rapports GTEA régionaux 2018

Pour l'année 2018, le montant total programmé pour la réalisation des latrines familiales en milieu rural s'élève à 3771,09 millions de FCFA. Le montant dépensé pour ces travaux (latrines familiales) sur la base de la programmation, est de 2 786,5 millions de FCFA soit un taux d'exécution de 73,9%. Cependant, 271,6 millions de FCFA ont été investis en hors programmation portant le montant des dépenses pour les latrines familiales à 3 058,1 millions de FCFA. En ce qui concerne leur réhabilitation, sur une programmation totale de 137 millions de FCFA, seulement 2,265 millions a été dépensé dans la région des Cascades. Les régions des Hauts-Bassins et les Cascades n'ont effectué aucune exécution sur leur programmation. C'est ce qui explique le taux d'exécution très faible de 1,5% pour les travaux de réhabilitation.

Au total **3 060,37 millions** ont été investis dans les travaux des latrines familiales.

Tableau 30 : Situation financière de la réalisation des puisards

Régions	Montant engagé				Taux (100*b/a) en %
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
Boucle du Mouhoun	4,4	4,4	5,0	9,4	100,0
Cascades	0,0	0,0	0,4	0,4	-
Centre	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Centre-Est	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Centre-Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Centre-Ouest	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Centre-Sud	0,0	0,0	0,2	0,2	-
Est	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Hauts-Bassins	3,6	3,6	0,0	3,6	100,0
Nord	0,0	0,0	0,0	0,0	-!
Plateau Central	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Sahel	19,6	16,7	0,0	16,7	85,3
Sud-Ouest	0,0	0,0	0,0	0,0	-
<b>Total National</b>	<b>35,980</b>	<b>24,7</b>	<b>5,6</b>	<b>30,2</b>	<b>68,6</b>

Source : Rapports GTEA régionaux 2018

Pour l'année 2018, le montant total 35,98 millions de FCFA programmé dans quatre (04) régions que sont la Boucle du Mouhoun (4,41 millions de FCFA), les Hauts-Bassins (3,56 millions de FCFA), le Plateau Central (4,41 millions de FCFA) et le Sahel (19,6 millions de FCFA) pour la réalisation des puisards domestiques en milieu rural. Le montant dépensé pour ces travaux (puisards domestiques) sur la base de la programmation est de 24,7 millions de FCFA soit un taux d'exécution de 68,6%. Cependant, 5,6 millions de FCFA ont été investis en hors programmation portant le montant total des dépenses pour les puisards domestiques à 30,2 millions de FCFA.

Tableau 31 : Situation de l'exécution des latrines dans les écoles (en millions de FCFA)

Régions	Réalisation de latrines dans les écoles					Réhabilitation de latrines dans les écoles				
	Montant engagé en millions					Montant engagé en millions				
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	65,9	51,1	14,8	65,9	77,6	1	0	0	0	0
Cascades	25,019	19,6	16,5	36,1	78,2	0	0	0	0	-
Centre	22,5	20,8	38,5	59,3	92,3	0	0	0	0	-
Centre-Est	72,3	23,8	30,5	54,3	32,9	0	0	0	0	-
Centre-Nord	584,3	137,7	3,0	140,7	23,6	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	99,1	20,7	4,5	25,2	20,9	0	0	0	0	-
Centre-Sud	42,5	20,8	-	20,8	49,0	0	0	0	0	-
Est	96,3	20,8	-	20,8	21,6	1,363	1,363	0	1,363	100
Hauts-Bassins	52,1	42,9	13,8	56,7	82,2	0	0	0	0	-
Nord	64,39	22,6	1,9	24,5	35,1	4,1	0	0	0	0
Plateau Central	65,91	26,4	17,9	44,3	40,0	1	0	0	0	0
Sahel	338,87	244,4	-	244,4	72,1	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	69,6	13,2	21,9	35,1	19,0	0	0	0	0	-
Total National	1 598,948	664,8	163,3	828,1	41,6	7,463	1,363	0	1,363	18,3

Source : Rapports GTEA régionaux 2018

Pour l'année 2018, le montant total programmé pour la réalisation des latrines dans les écoles en milieu rural s'élève à 1 598,932 millions de FCFA. Le montant dépensé pour ces travaux sur la base de la programmation est de 664,8 millions de FCFA soit un taux d'exécution de 41,6%. Cependant, 163,3 millions de FCFA ont été investis en hors programmation portant le montant total des dépenses pour les latrines dans les écoles à 828,1 millions de FCFA. En ce qui concerne leur réhabilitation, sur une programmation totale de 7,463 millions de FCFA, seulement 1,363 millions de FCFA ont été dépensés dans la région de l'Est. Le nord qui avait plus fait des programmations n'a réalisé aucune dépense. C'est ce qui explique le faible taux d'exécution de 18,3% pour les travaux de réhabilitation.



Tableau 32: Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé (en millions de FCFA)

Régions	Réalisation de latrines dans les centres de santé					Réhabilitation de latrines dans les centres de santé				
	Montant engagé (millions)					Montant engagé (millions)				
	Program mation révisée (a)	Issues de la program	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Program mation révisée	Issues de la program mation	Hors program mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	56,56	11,1	0	11,1	19,6	1	0	0		0
Cascades	16,5	7,329	0	7,329	44,4	0	0	0	0	-
Centre	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Est	20,05	12,642	0	12,642	63,1	0	0	0	0	-
Centre-Nord	46,145	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	40	40	0	40	100	0	0	0	0	-
Centre-Sud	25,902	5	0	5	19,3	0	0	0	0	-
Est	6	6	0	6	100	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	13,27	13,27	0	13,27	100	0	0	0	0	-
Nord	22,1	18,5	0	18,5	83,7	0	0	0	0	-
Plateau Central	56,56	3,291	0	3,291	5,8	1	0	0	0	0
Sahel	58,500	44,75	0	44,75	76,5	0,56	0	0	0	0
Sud-Ouest	41,24	33,24	0	33,24	80,6	0	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>417,328</b>	<b>195,122</b>	<b>0</b>	<b>195,122</b>	<b>46,8</b>	<b>2,56</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

Source : Rapports GTEA régionaux 2018

Pour l'année 2018, le montant total programmé pour la réalisation des latrines dans les centres de santé en milieu rural s'élève à 417,328 millions de FCFA. Le montant dépensé pour ces travaux sur la base de la programmation est de 195,122 millions de FCFA, soit un taux d'exécution de 46,8%. En ce qui concerne leur réhabilitation, sur une programmation totale de 2,56 millions de FCFA dans trois régions que sont la Boucle du Mouhoun (1 million de FCFA), le Plateau Central (1 million de FCFA) et le Sahel (0,56 million de FCFA), aucune dépense n'a été effectuée

Tableau 33 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics

Régions	Réalisation de latrines dans les lieux publics					Réhabilitation de latrines dans les lieux publics				
	Montant engagé (en millions de FCFA)					Montant engagé (en millions de FCFA)				
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	8,23	8,23	7,13	15,36	100	0	0	0	0	-
Cascades	10,5	8,108	6,672	14,78	77,2	0	0	0	0	-
Centre	8,98	5,49	0	5,49	61,1	0	0	2	2	-
Centre-Est	20,01	20,01	7,673	27,683	100	0	0	0	0	-

Régions	Réalisation de latrines dans les lieux publics					Réhabilitation de latrines dans les lieux publics				
	Montant engagé (en millions de FCFA)					Montant engagé (en millions de FCFA)				
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Centre-Nord	14,47	14,47	1,5	15,97	100	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	15,42	9,85	0	9,85	63,9	0	0	0	0	-
Centre-Sud	0	12	0	12	0	0	0	0	0	-
Est	0	10	15	25	0	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	6,1	6,1	0,06	6,16	100	0	0	0	0	-
Nord	7,45	4,71	3,9	8,61	63,2	0	0	0	0	-
Plateau Central	8,23	8,23	31,893	40,123	100	0	0	0	0	-
Sahel	20,49	6,77	0	6,77	33,0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	8	6	0	6	75	0	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>127,88</b>	<b>119,968</b>	<b>73,828</b>	<b>193,796</b>	<b>93,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>

Source : Rapports GTEA régionaux 2018

Pour l'année 2018, le montant total programmé pour la réalisation des latrines dans les lieux publics en milieu rural s'élève à 127,88 millions de FCFA. Le montant dépensé pour ces travaux sur la base de la programmation, est de 119,968 millions de FCFA soit un taux d'exécution de 93,8%. Cependant, 73,928 millions de FCFA ont été investis en hors programmation portant le montant total des dépenses pour les latrines familiales à 193,796 millions de FCFA. En ce qui concerne leur réhabilitation, une programmation n'a eu lieu. Cependant nous notons des dépenses de 2 millions en programmation dans la région du Centre.

#### 4.4 Action 4 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain

Tableau 34 : Taux d'exécution financière de l'Action 4

Source de financement	Prévision (millions francs CFA)	Réalisation (millions francs CFA)	Taux (%)
Financements extérieurs	1 359	1051,7	77%
Financements propres	250	48,7	18%
<b>TOTAL</b>	<b>1 609</b>	<b>1 100,4</b>	<b>68%</b>

En milieu urbain, pour la réalisation de l'accès universel à l'assainissement, 1100,4 millions ont été dépensés par les acteurs sur une programmation 1609 millions soit un taux d'exécution de 68%.

#### 4.5 **Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

En 2018, pour ce qui est de l'action, quelques activités ont été menées dans les régions en milieu rural mais la situation financière ne peut être faite pour indisponibilité de données. En milieu urbain notamment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso **56 millions** ont été investis dans les charges d'exploitation des STEP et des STBV.

#### 4.6 **Action 6 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

Pour l'année 2018, et pour l'action 6, une seule activité a été réalisée mais le cout financier n'a pas été établi.

#### 4.7 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Tableau 35 Taux d'exécution financière de l'action 7

Région	Montant engagé (en millions)				Taux (100*b/a) en %
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
Boucle du Mouhoun	41	39	0	39	95,1
Cascades	0	0	0,833	0,833	-
Centre	0	0	0,169	0,169	-
Centre-Est	0	0	0	0	-
Centre-Nord	1	1	0	1	100
Centre-Ouest	0	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	0	0	-
Est	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0	0	-
Nord	2,63	2,63	0	2,63	100
Plateau Central	0	0	0	0	-
Sahel	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	1,127	1,127	0	1,127	100
<b>Total National</b>	<b>45,757</b>	<b>43,757</b>	<b>1,002</b>	<b>44,759</b>	<b>95,6</b>

Source : Rapports GTEA régionaux 2018

Pour l'année 2018, pour l'atteinte des objectifs de l'action 7, quatre (04) régions ont pu programmer un montant total de 45,757 millions de FCFA à savoir la Boucle du Mouhoun pour 41 millions de FCFA, le Centre-Nord pour 1 million de FCFA, le Nord pour 2,63 millions de FCFA et le Sud-Ouest pour 1,127 millions de FCFA. Le montant dépensé sur la base de la programmation, est de 43,757 millions de FCFA soit un taux d'exécution de 95,6%. Cependant, 1,002 millions de FCFA ont été investis en hors programmation portant le montant total des dépenses à 44,759 millions de FCFA. Ces hors programmations ont été constatées dans les régions des Cascades pour 0,833 million d FCFA et du Centre pour 0,169 million de FCFA.

➤ Bilan financier global de l'AEUE en milieu rural

Figure 1 : Taux d'exécution financière par source de financement

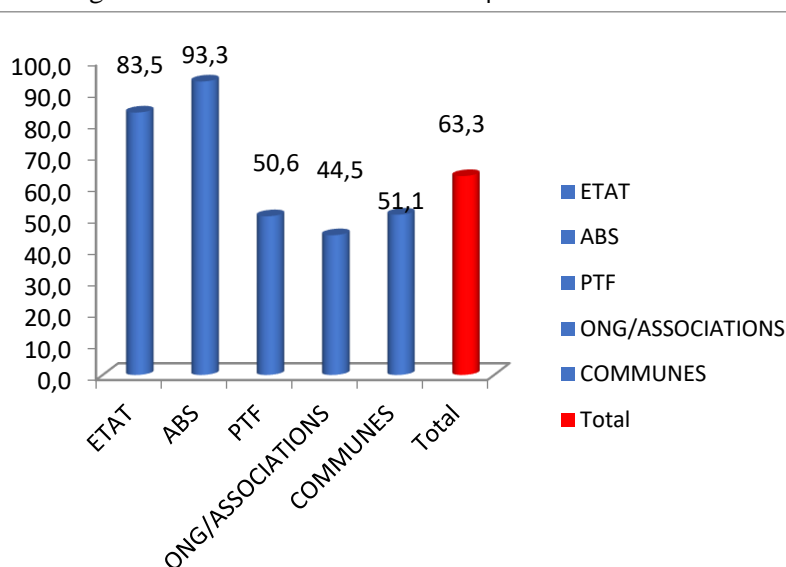


Tableau 36: Exécution financière global selon les sources de financement (en millions de FCFA)

Financement	Prévision 2018	Dépenses 2018	Taux (%)
Ressources propres	1 261,6	1 053,2	83,5
ABS	1 334,0	1 244,8	93,3
PTF (appui projets)	3 748,8	1 896,6	50,6
ONG/Associations	793,6	353,5	44,5
Communes	219,7	112,3	51,1
<b>Total</b>	<b>7 357,6</b>	<b>4 660,4</b>	<b>63,3</b>

Source : Rapport d'exécution 2018 du BPO 2018-2020

Le taux d'exécution financière globale du programme en milieu rural au cours de l'année 2018 pour l'ensemble des acteurs du secteur est de 63,3%.

Le faible taux d'exécution au niveau des communes pourrait s'expliquer entre autres par la faible attractivité des appels d'offres entraînant des marchés infructueux.

Bilan financier du pilotage de l'AEUE (CUI ou CUCA) en milieu rural

Figure 2 : Taux d'exécution financière du pilotage par source de financement

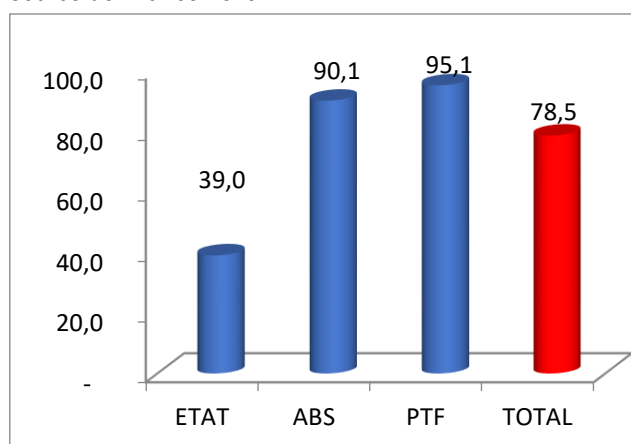


Tableau 37 : Exécution financière du CUI selon les sources de financement (en millions de FCFA)

Financement	Prévision	Dépenses	Taux (%)
Etat	341,6	133,2	39,0
ABS	340,1	306,3	90,1
PTF	577,7	549,6	95,1
<b>Total</b>	<b>1 259,4</b>	<b>989,1</b>	<b>78,5</b>

Source : Rapport d'exécution 2018 du BPO 2018-2020

Le taux de l'exécution financière de la mise en œuvre du cadre unifié d'intervention est de 78,5%. Le niveau d'exécution moyen de l'Etat traduit le fait que les paiements se poursuivent jusqu'à l'échéance de la journée complémentaire prévue en fin Février.

Tableau 38 : Exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA)

Source de financement	Budget	Engagé visé	Taux d'exécution base engagement (%)
Ressources propre de l'Etat	1 201,7	1 000,4	83,3
ABS	1 334,0	1 244,8	93,3
<b>TOTAL</b>	<b>2 535,6</b>	<b>2 245,3</b>	<b>88,5</b>

Source : CID, Février 2018

Les ressources de l'ABS, ajoutées aux ressources propres de l'Etat allouées aux dépenses d'investissement (projet nationaux et contrepartie de projet) au profit de l'AEUE en milieu rural au titre de l'année 2018 s'élèvent à 2 535,6 millions de FCFA. Le niveau d'exécution se situe à 2 245,3 millions de FCFA, soit un taux d'exécution de 88,5% base engagements visés.

### Taux d'exécution financière par source de financement milieu urbain

Tableau 39 : Taux d'exécution financière de l'Action 4

Source de financement	Prévision (millions francs CFA)	Réalisation (millions francs CFA)	Taux (%)
Financements extérieurs	1 359	1051,7	77%
Financements propres (ONEA)	250	48,7	18%
<b>TOTAL</b>	<b>1 609</b>	<b>1 100,4</b>	<b>68%</b>

Source : ONEA 2019

### Exécution financière global du PN-AEUE

Tableau 40: Taux d'exécution financière globale du PN-AEUE

Milieu	Prévision (en millions de FCFA)	Exécution (millions francs CFA)	Taux (%)
<b>Rural</b>	7 357,6	4 660,4	<b>63%</b>
<b>Urbain</b>	2 774,0	1 514,7	<b>55%</b>
<b>National</b>	10 131,6	6 175,1	<b>61%</b>

Source : Rapport d'exécution 2018 du BPO 2018-2020, ONEA 2019

Sur une prévision financière de 10 131,6 millions de franc FCFA, 6 175,1 millions ont été exécutés soit un taux d'exécution financier du PN-AEUE est de **61%**.

Aussi, 1 045,10 millions en ont été en Hors Programmation portant le montant total exécuté 7 220,2 millions

### 5.1 Assainissement en milieu rural

Figure 3 : Taux d'accès à l'assainissement familial en 2018 par région

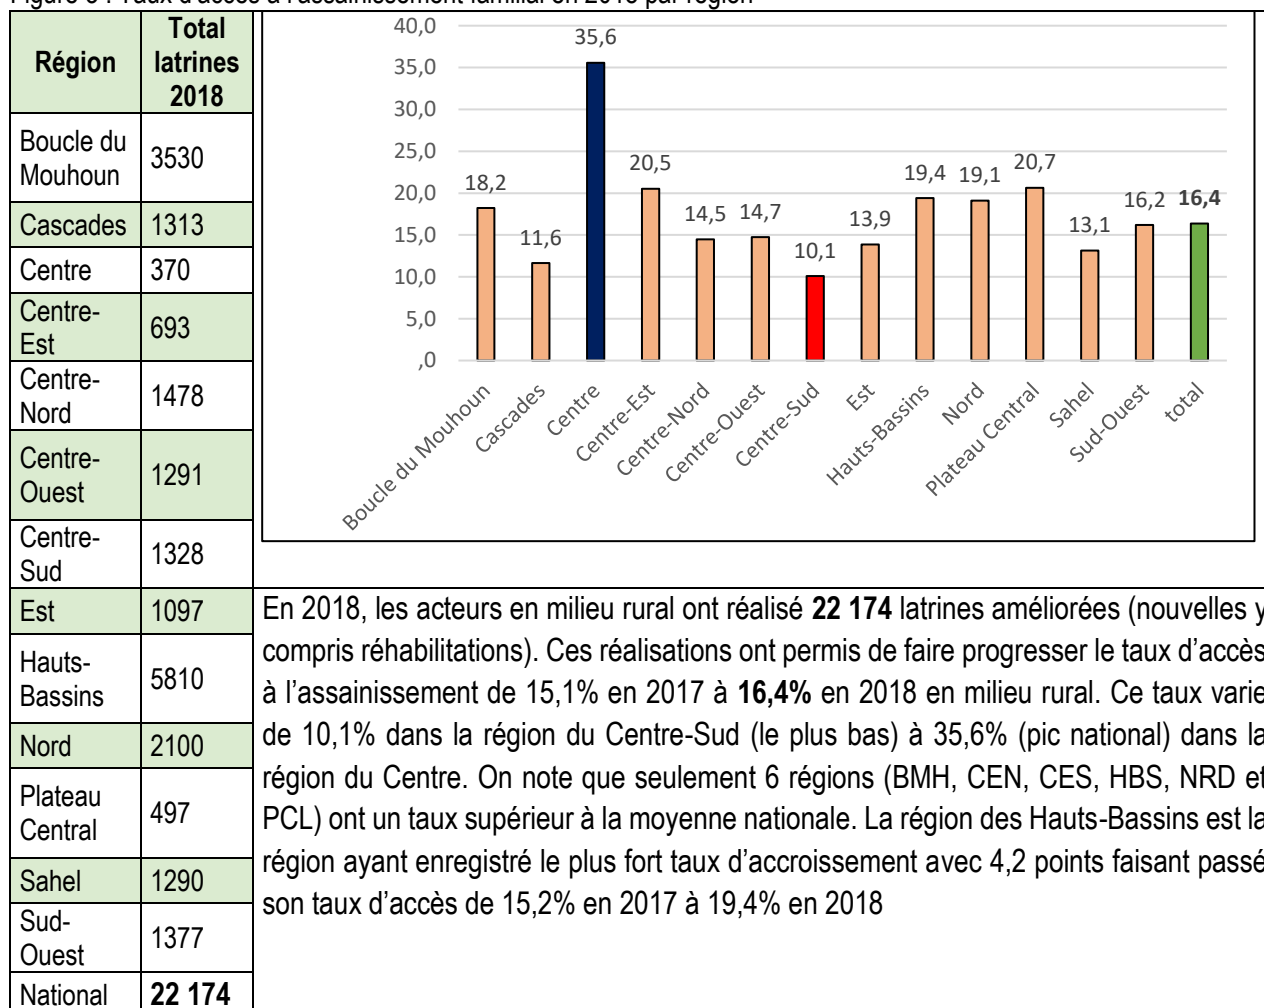


Tableau 41: Evolution du taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural par région

Année	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Boucle du Mouhoun	1,1	1,2	1,8	3,7	4,8	9,6	13,2	16,4	<b>18,2</b>
Cascades	0,5	0,5	0,9	2,6	5,9	9,2	9,6	10,3	<b>11,6</b>
Centre	2,2	3,1	9,1	15,0	20,8	24,3	30,6	34,0	<b>35,6</b>
Centre-Est	0,9	1,7	6,6	10,3	14,1	15,4	18,2	20,3	<b>20,5</b>
Centre-Nord	0,8	1,0	2,8	4,7	12,4	14,7	15,2	13,8	<b>14,5</b>
Centre-Ouest	0,4	1,2	2,6	5,1	7,3	11,9	12,5	14,0	<b>14,7</b>
Centre-Sud	0,0	0,0	0,4	1,4	3,5	5,6	6,8	8,7	<b>10,1</b>
Est	0,4	0,5	1,2	5,2	7,3	9,5	10,6	13,7	<b>13,9</b>
Hauts-Bassins	0,2	0,5	4,1	6,5	9,6	11,9	12,8	15,2	<b>19,4</b>
Nord	0,1	0,2	5,4	8,3	10,0	12,1	13,6	17,4	<b>19,1</b>
Plateau Central	2,8	5,2	10,0	15,6	17,4	19,7	19,7	20,2	<b>20,7</b>
Sahel	1,0	1,0	1,2	1,9	4,7	7,8	11,5	12,4	<b>13,1</b>
Sud-Ouest	0,7	0,9	1,3	3,0	7,7	12,2	13,4	14,3	<b>16,2</b>
<b>National rural</b>	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>3,1</b>	<b>6,0</b>	<b>9,0</b>	<b>12,0</b>	<b>13,4</b>	<b>15,1</b>	<b>16,4</b>

Source : INOA 2018 ne fait pas de calculs

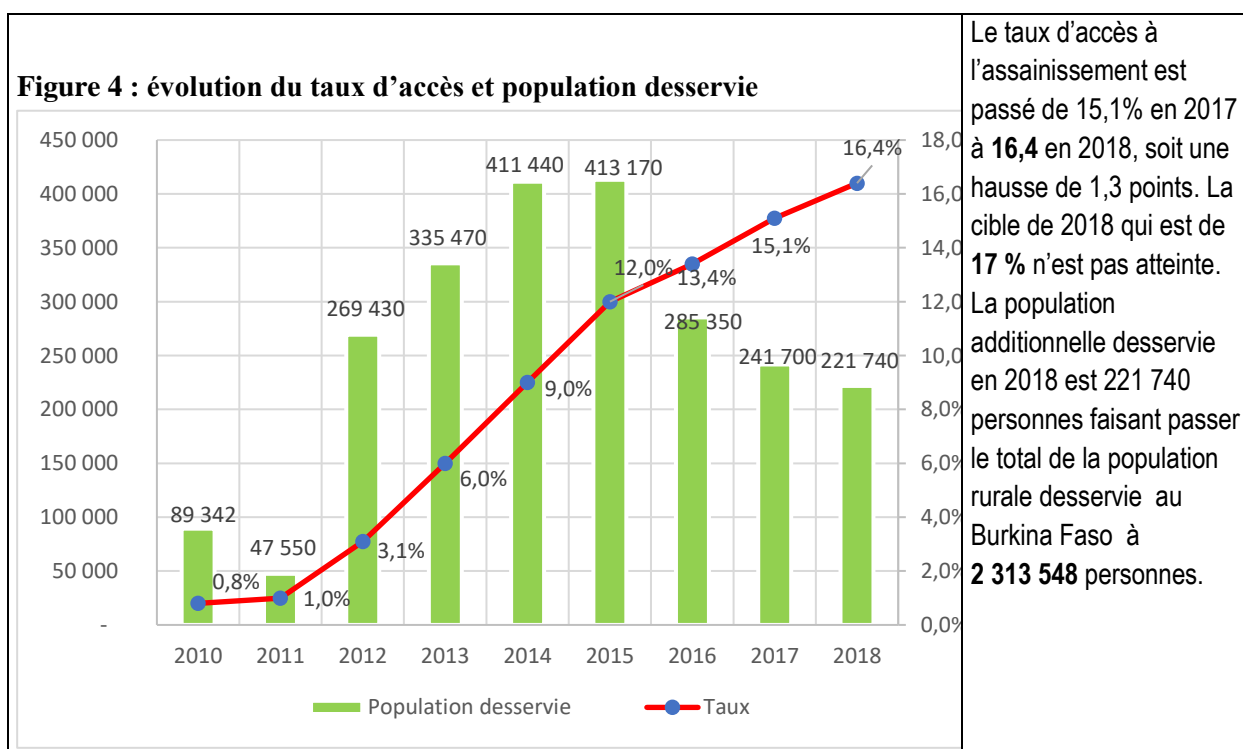




Figure 5 : Situation de disponibilité de dispositif de lavage des mains (DLM)


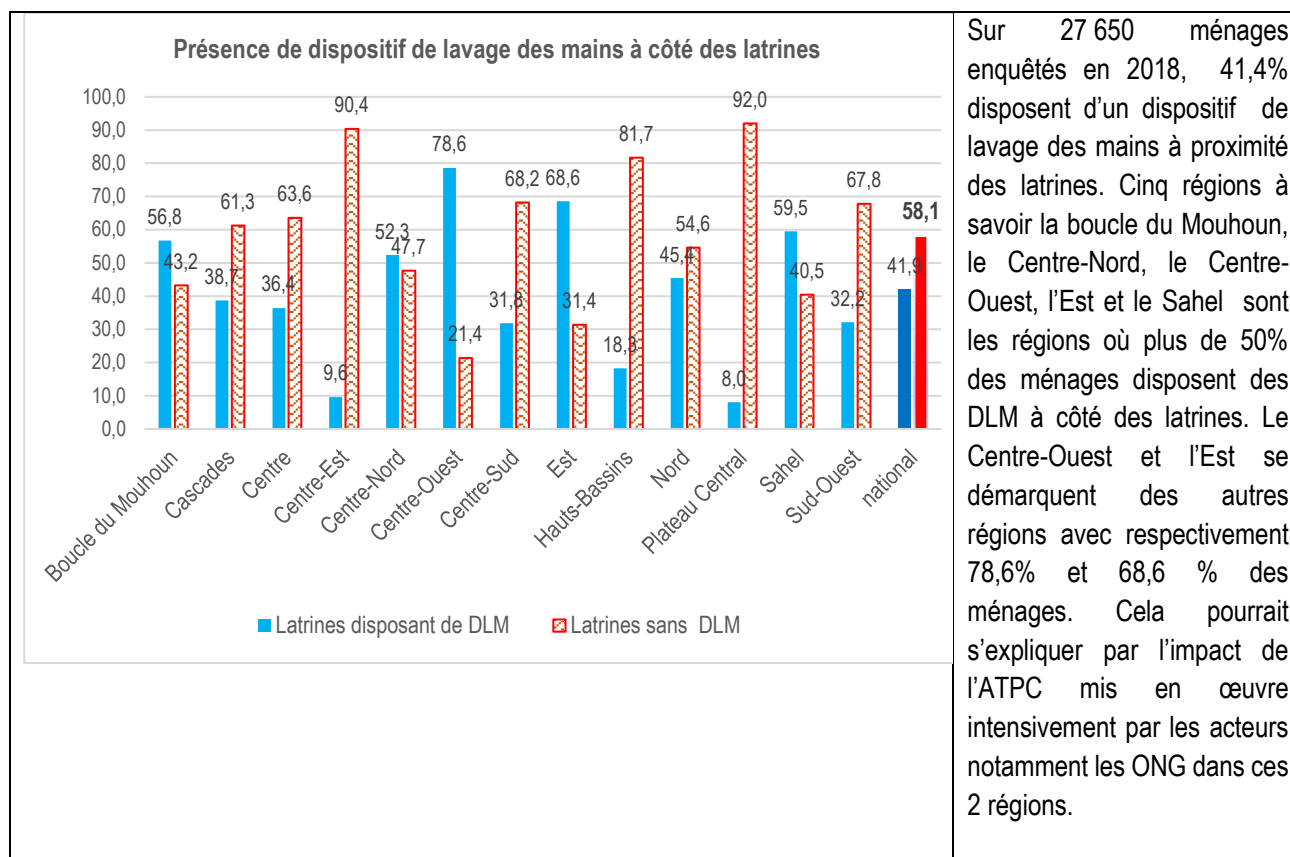



Figure 6 : Situation de la pratique de lavage des mains par les ménages

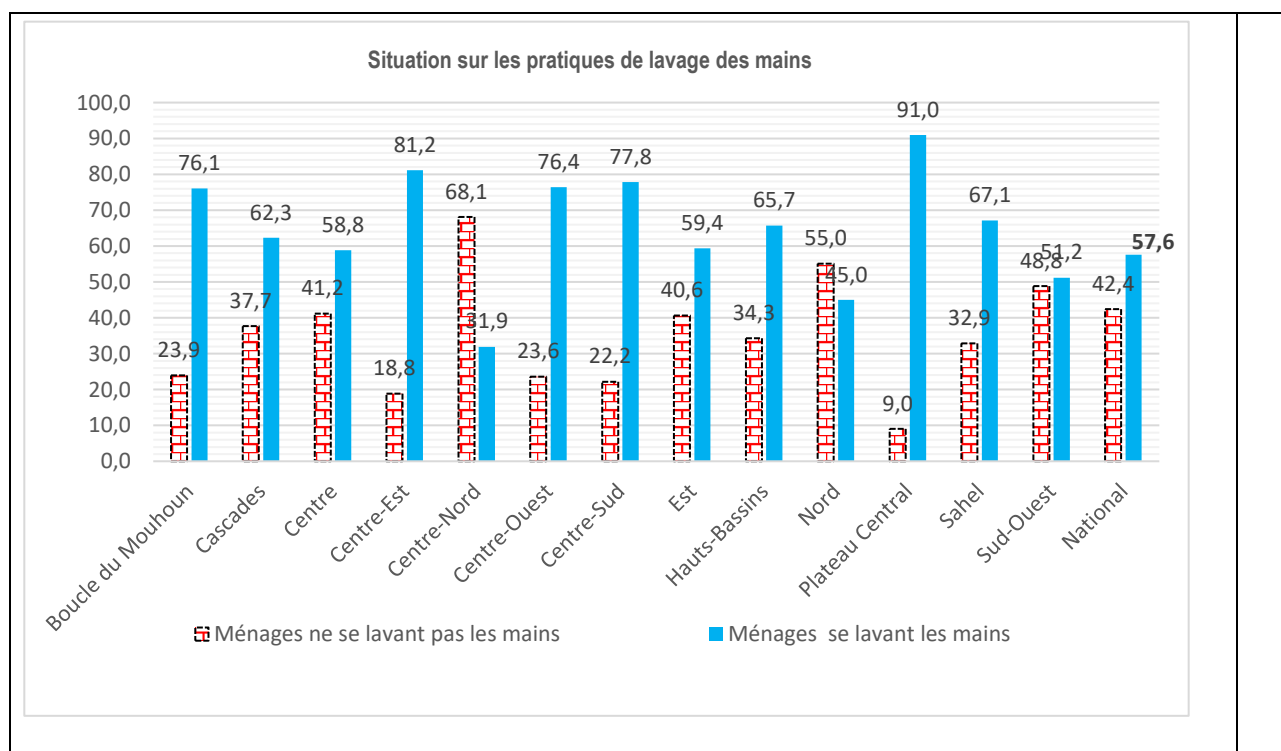

Source : BD AEUE, DGA 2018

Sur les 27 857 ménages interrogés sur les pratiques de lavages des mains aux moments critiques principalement à la sortie des toilettes, 57,6% déclarent se laver les mains au savon ou à la cendre. Seulement deux régions (Nord et Centre-Nord) ont un taux inférieur à 50%. La région du Plateau Central reste toujours en tête avec 91%. La pratique de lavage des mains a considérablement évolué au fil des ans. En effet, le taux national est passé de 35% en 2016 à 49% en 2017 et à 57,6% en 2018. Cela pourrait s'expliquer par l'impact des différentes campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène qu'effectuent des acteurs.

Figure 7 : situation de l'entretien des latrines dans les ménages

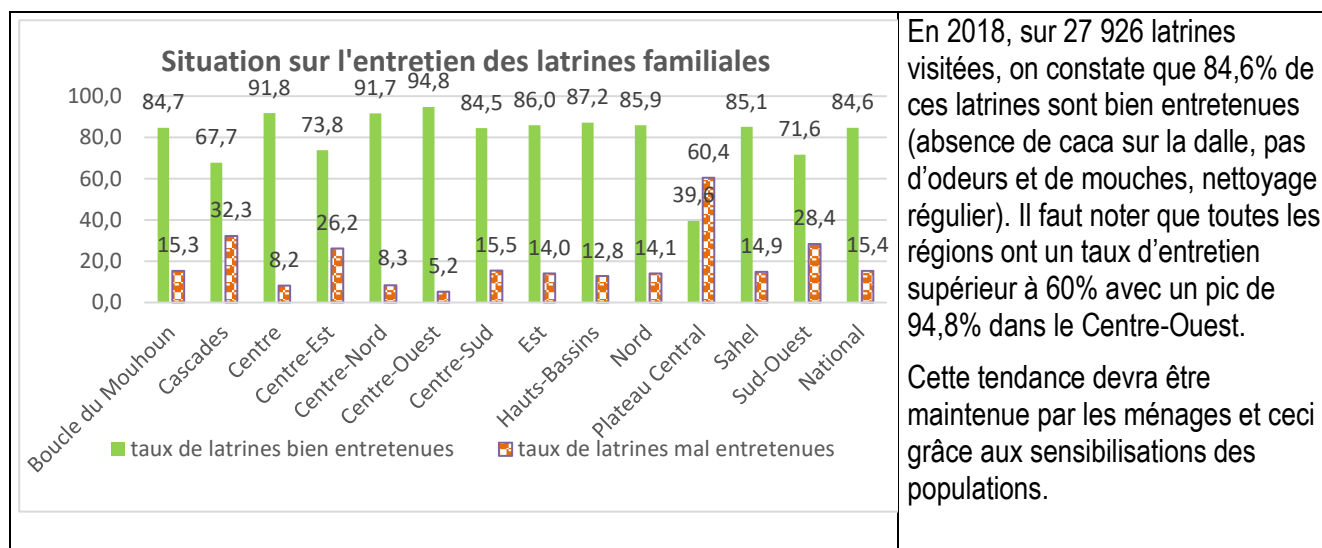

Source : BD\_AEUE, DGA 2018

Tableau 42 : Proportion des latrines par acteur

Région	Total (nombre de latrines réalisées)	Etat	Part Etat (%)	Autres acteurs (collectivités +ONG/AD)	Part autres acteurs (%)	Ménages	Part ménages (%)
Boucle du Mouhoun	3 530	2006	56,8	1 226	34,7	298	8,4
Cascades	1 313	425	32,4	786	59,9	102	7,8
Centre	370	42	11,4	169	45,7	159	43,0
Centre-Est	693	451	65,1	94	13,6	148	21,4
Centre-Nord	1 478	892	60,4	193	13,1	393	26,6
Centre-Ouest	1 291	473	36,6	247	19,1	571	44,2
Centre-Sud	1 328	496	37,3	706	53,2	126	9,5
Est	1 097	724	66,0	41	3,7	332	30,3
Hauts-Bassins	5 810	1 223	21,0	4 449	76,6	138	2,4
Nord	2 100	738	35,1	879	41,9	483	23,0
Plateau Central	497	318	64,0	51	10,3	128	25,8
Sahel	1 290	928	71,9	286	22,2	76	5,9
Sud-Ouest	1 377	1 115	81,0	184	13,4	78	5,7
<b>National</b>	<b>22 174</b>	<b>9 831</b>	<b>44,3</b>	<b>9 311</b>	<b>42,0</b>	<b>3032</b>	<b>13,7</b>

Source : BD\_AEUE, DGA 2018

Sur un total de 25 751 latrines familiales tout type confondu, l'effort de l'Etat est le plus important avec 38,3% des réalisations suivi de celui des autres acteurs (collectivités et ONG/AD) 36,3%. Les latrines non subventionnées (autoréalisations) qui traduisent l'effort de la population sont au nombre de 6 548 soit 25,4%. Cette augmentation des autoréalisations au fil des années est encourageante dans un contexte où les finances publiques et l'aide publique au développement pour les investissements d'assainissement s'amenuisent au profit de la sécurité et des actions humanitaires. Alors, des efforts doivent toujours être consentis dans la communication pour le changement de comportements des populations afin de susciter davantage les autoréalisations.

Tableau 43 : Situation de l'état de Fin de défécation à l'air libre

Régions	Nombre de villages de la région (a)	Nombre de villages déclenchés (b)	Nombre de villages déclarés FDAL ©	Nombre de villages certifiés FDAL (d)	Taux de villages déclarés FDAL (c/a*100)	Taux de villages certifiés FDAL (d/a*100)
Boucle du Mouhoun	1 019	136	2	1	1,5	0,7
Cascades	301	5	0	0	0,0	0,0
Centre	208	44	0	0	0,0	0,0
Centre-Est	756	209	4	4	1,9	1,9
Centre-Nord	829	119	27	9	22,7	7,6
Centre-Ouest	610	119	73	44	61,3	37,0
Centre-Sud	564	0	0	0		
Est	874	349	170	89	48,7	25,5
Hauts-Bassins	535	33	0	0	0,0	0,0
Nord	862	28	0	0		
Plateau Central	558	90	0	0		
Sahel	684	168	109	7	64,9	4,2
Sud-Ouest	1 092	42	5	5	11,9	11,9
<b>Total</b>	<b>8 892</b>	<b>1 342</b>	<b>390</b>	<b>159</b>	<b>29,1</b>	<b>11,8</b>

Source : BD\_AEUE, DGA 2018

Sur 1 342 villages déclenchés, 390 sont déclarés FDAL soit 29,1% et 159 villages certifiés FDAL soit 11,8%. la cible de la certification revue à 10% est donc atteinte.

La région de l'Est est celle qui enregistre toujours le plus grand nombre de villages certifiés FDAL (89) suivie du Centre-Ouest (44) et du Centre-Nord (9). Le Centre-Sud reste malheureusement la seule région où aucune activité d'ATPC n'a été menée depuis la mise en œuvre du PN-AEUE.

Les faibles taux d'atteinte de l'état FDAL des villages sont liés au manque de suivi, mais aussi du faite que beaucoup d'acteurs déclenchent les villages n'ont pas pour atteindre la FDAL mais comme un simple moyen de sensibilisation. C'est le cas par exemple des 510 villages déclenchés dans le cadre du programme assainissement familial en milieu rural (2014-2017) sur financement de l'Union Européenne qui n'ont été suivis ni évalués.

Au regard de la position stratégique de cet indicateur (indicateur de décaissement), les moyens doivent être mis par le MEA à la disposition de la DGA et les DREA pour un suivi conséquent des activités liées à la FDAL.

Tableau 44 : Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural

Régions	Ecoles primaires				CSPS			
	Nombre d'écoles (a)	Nombre d'écoles équipées de latrines (b)	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (c)	Taux (%) (c/a)	Nombre de CSPS (a)	Nombre de CSPS équipés de latrines (b)	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (c/a)	Taux (%) (c/a)
Boucle du Mouhoun	1 268	1261	952	75,1	242	190	190	78,51
Cascades	584	583	427	73,1	103	99	99	96,11
Centre	561	560	488	87,0	56	56	56	100
Centre-Est	1 007	1007	791	78,6	161	154	154	95,65
Centre-Nord	1 264	1259	927	73,3	33	31	23	69,69
Centre-Ouest	1 150	1146	883	76,8	184	165	158	85,87
Centre-Sud	573	573	470	82,0	132	132	132	100
Est	1 172	1170	878	74,9	157	142	134	85,3
Hauts-Bassins	1 049	1048	641	61,1	188	188	183	97,3
Nord	1 496	1491	927	62,0	211	204	177	83,89
Plateau Central	902	902	698	77,4				85,91
Sahel	982	977	638	65,0	1013	626	625	63
Sud-Ouest	775	774	529	68,3	127	117	117	92,1
<b>Total</b>	<b>12 783</b>	<b>12751</b>	<b>9 249</b>	<b>72,4</b>	<b>2 607</b>	<b>2 104</b>	<b>2 048</b>	<b>87,2</b>

Source : Rapports bilan régionaux 2018

En 2018, le taux d'équipement des écoles primaires est de 72,4% pour une cible de 71%. La cible est donc atteinte. Les taux varient de 61,1% dans les Hauts-Bassins à 87% au Centre.

Quant aux CSPS le taux d'équipement est de 87,2% et est inférieur de celui de 2017 qui était de 90,3%. La cible de 2018 fixée à 92% n'est donc pas atteinte. Le plus faible taux d'équipement est observé dans la sahel (63%) et le plus fort taux dans la région du Centre-Sud avec 100%.

La régression du taux d'équipement des centres de santé pourrait s'expliquer par le nombre élevé des latrines non fonctionnelles (environ 3 502) dans les centres de santé. Cette situation interpelle les acteurs à développer et mettre en place des modes de gestion adéquats des latrines dans les institutions (écoles et centres de santé) et lieux publics.

Tableau 45: Réalisation comparée de la phase 1 du PN-AEUE en milieu rural

Régions	Latrines institutionnelles et publiques				Latrines familiales				Puisards domestiques			
	Planification 2016-2020(a)	Réalisations 2016-2018 (b)	Taux d'atteinte (%) (c=b/a*100)	Gap d (d=a-b)	Planification 2016-2020(a)	Réalisations 2016-2018 (b)	Taux d'atteinte (%) (c=b/a*100)	Gap (d=a-b)	Planification 2016-2020(a)	Réalisations 2016-2018 (b)	Taux d'atteinte (%) (c=b/a*100)	Gap (d=a-b)
Boucle du Mouhoun	238	348	146,2	-110	25 000	14 842	59,4	10 158	43 027	569	1,3	42 458
Cascades	108	224	207,4	-116	11 395	2 451	21,5	8 944	19 612	436	2,3	19 176
Centre	31	123	396,8	-92	3 300	2 392	72,5	908	5 680	62	1,1	5 618
Centre-Est	164	245	149,4	-81	17 273	5 960	34,5	11 313	29 730	48	0,2	29 682
Centre-Nord	207	286	138,2	-79	21 797	4 314	19,8	17 483	37 515	237	0,6	37 278
Centre-Ouest	177	423	239,0	-246	18 629	3 934	21,1	14 695	32 064	88	0,3	31 976
Centre-Sud	115	174	151,3	-59	12 014	4 055	33,8	7 959	20 677	295	1,4	20 382
Est	248	334	134,7	-86	26 093	9 081	34,8	17 012	44 909	911	2,1	43 998
Hauts-Bassins	178	357	200,6	-179	18 756	10 077	53,7	8 679	32 280	993	3,1	31 287
Nord	159	298	187,4	-139	16 774	5 672	33,8	11 102	28 869	130	0,5	28 739
Plateau Central	103	291	282,5	-188	10 785	2 008	18,6	8 777	18 562	97	0,5	18 465
Sahel	178	594	333,7	-416	18 712	6 953	37,2	11 759	32 205	87	0,3	32 118
Sud-Ouest	94	268	285,1	-174	9 814	3 140	32,0	6 674	16 893	410	2,5	16 483
<b>Total</b>	<b>2 000</b>	<b>3965</b>	<b>198,3</b>	<b>-1965</b>	<b>210 342</b>	<b>74 879</b>	<b>35,6</b>	<b>135 463</b>	<b>362 023</b>	<b>4363</b>	<b>1,2</b>	<b>357 660</b>

Source : BD AEUE, DGA 218

## 5.2 Assainissement en milieu urbain


Tableau 46: Taux d'accès à l'assainissement par zone administrative en milieu urbain

Région	Communes concernés	Réalisations 2018	Cumule réalisations depuis 2016	Population totale desservie 2018	Taux (%)
Boucle du Mouhoun	Dédougou, Toma, Tougan, Boromo, Nouna, Solenzo	374	1 932	61 984	37,2
Cascades	Banfara, Bérégradou, Niangoloko, Sindou	123	123	41 216	22,6
Centre	Ouagadougou, Saaba, Pabré	120	25 257	1 299 565	46,5
Centre-Est	Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga	126	1 200	61 966	17,7
Centre-Nord	Kaya, Kongoussi, Boulsa	221	692	41 623	25,7
Centre-Ouest	Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Fara, Poura	1 929	4 423	88 873	35,0
Centre-Sud	Manga, Kombissiri, Pô	515	786	22 743	22,2
Est	Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama	157	182	44 336	27,0
Hauts-Bassins	Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé	1 839	5 063	350 475	37,8
Nord	Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy	406	1 159	63 289	30,6
Plateau-Central	Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho	445	495	16 653	17,0
Sahel	Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba	132	322	25 428	22,7
Sud-Ouest	Diébougou, Gaoua	519	1 368	37 207	31,4
<b>Total National</b>		<b>6 906</b>	<b>43 002</b>	<b>2 155 359</b>	<b>38,2</b>

Source : ONEA 2018

En 2018, le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain est de 38,2%, inférieur celui de 2017 qui était de 38,3%. Cette contre-performance s'explique par la faible réalisation des latrines par l'ONEA en 2018 (seulement 6 906 latrines). Ce taux varie de 17% dans les zones urbaines du Plateau Central à 46,5% dans la région du Centre. La cible de 2018 fixée à 41% n'est pas atteinte.

**Figure 8 : Evolution du taux d'accès en milieu urbain**

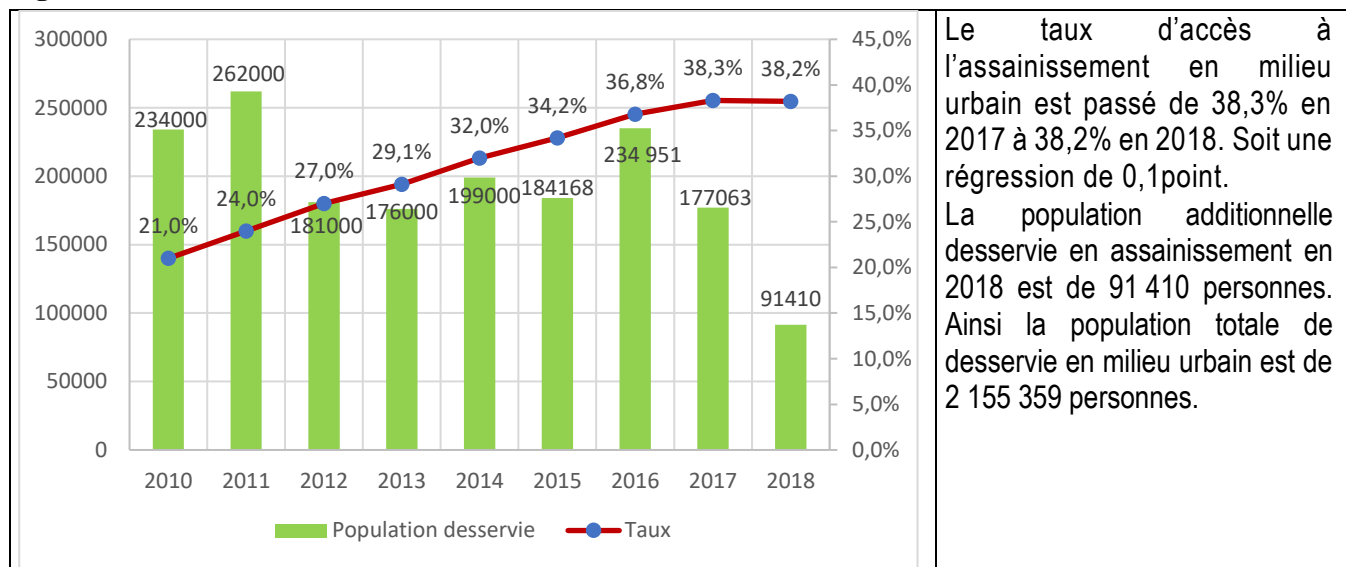

**Tableau 47 : Récapitulatif des réalisations physiques en assainissement en milieu urbain**

	PSA (nombre)	Latrines familiales (nombre)	Puisards (nbre)	Latrines institutionnelles et publiques (nombre)	STEP (nbre)	STBV (nbre)	Extension réseau collectif (Km)	Raccordement réseau collectif (nbre)
Planification 2016-2020 (a)	20	249 899	174 929	3 440	1	7	50	600
Réalisation 2016-2018 (b)	0	43 002	15 543	360	0	2	0	12
Taux d'atteinte (%)	0,0	17,2	15,3	10,5	0,0	28,6	0,0	2,0
Gap (d=a-b)	20	206 897	148 251	3 080	1	5	50	588

Source : ONEA

### Latrines hygiéniques

Aucune réalisation n'a été effectuée pour le compte de cette année 2018 sur une prévision de **10 000** latrines. Cela est dû à la fin du projet PERISAN et aux autres difficultés liées à la passation des marchés.

### 5.3 Assainissement national


Tableau 48: Récapitulatif des réalisations sur le plan national

Ouvrages	Réalisation 2018			Cumul réalisations (2016-2018)		
	Milieu rural	Milieu urbain	National	Milieu rural	Milieu urbain	National
Latrines familiales	22174	6906	<b>29 080</b>	74 879	43 002	<b>117 881</b>
Latrines institutionnelles et publiques	1035	80	<b>1115</b>	3965	360	<b>4 325</b>
<b>Puisards</b>	1286	2971	<b>4 257</b>	10 766	20 288	<b>31 054</b>
Site de dépotage et de traitement des boues de vidange (STBV)	0	0	<b>0</b>	0	4	<b>4</b>
STEP	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>
Quantité de boues traitées (m <sup>3</sup> )	0	0	351 352	0	351 352	<b>351 352</b>

Source : BD\_AEUE 2018, ONEA 2018

Sur le plan national la réalisation de 29 080 latrines familiales en 2018 a fait augmenter le nombre total de latrines familiales à **117 881** ouvrages depuis 2016. Quant aux latrines institutionnelles et publiques au total 4325 blocs de latrines ont été réalisés depuis le début de la mise en œuvre du programme.

Figure 9 : Evolution du taux d'accès national

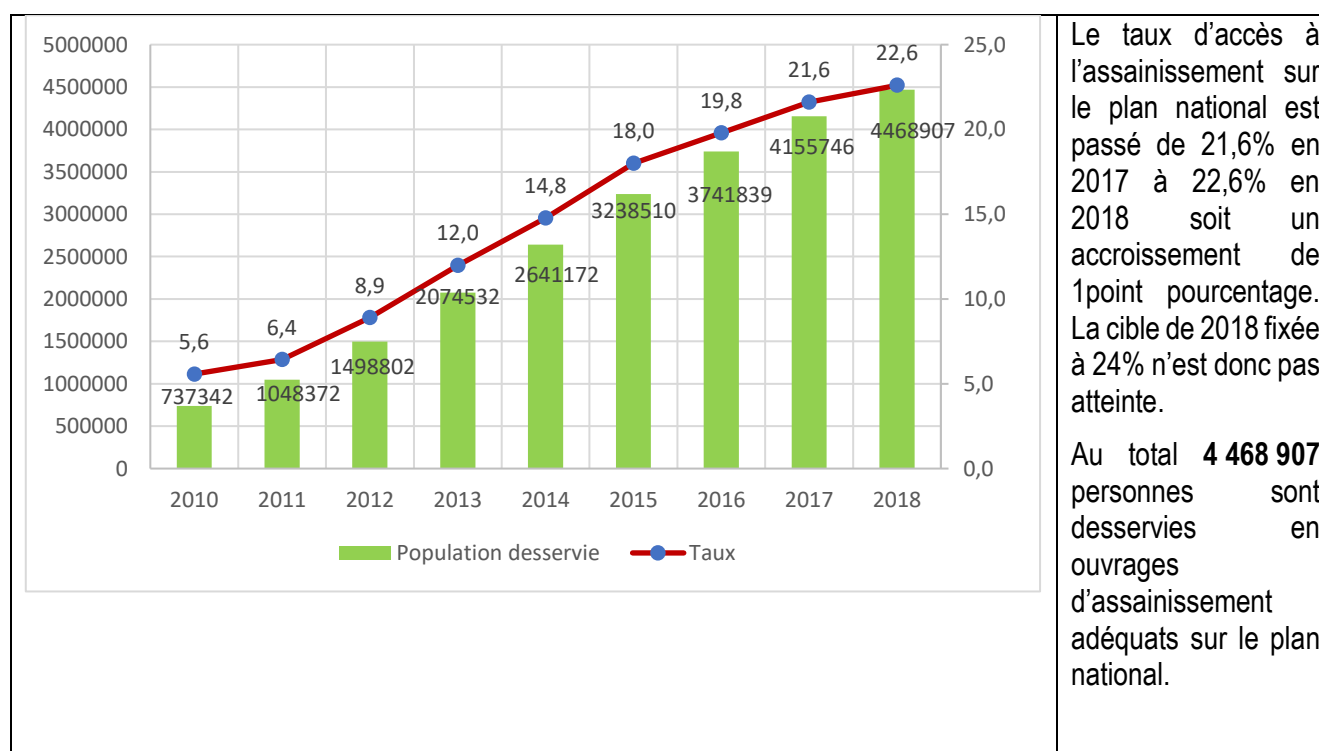



## 6 FINANCEMENT DU PROGRAMME

Tableau 49 : Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA)

Coût Total du PN-AEUE en milieu rural (a)	Coût du plan d'action 2016-2020 en milieu rural (b)	Financement acquis (c)	Taux de mobilisation par rapport au plan d'action 2016-2020 $d = c/b * 100$	Gap de financement par rapport au plan d'action 2016-2020 $e = b - c$	Taux de mobilisation par rapport cout total 2016-2020(en %) $F = c/a * 100$
735 359,1	253 789,1	64 659,1	25,5	670 699,8	8,8

Les financements acquis restent faibles par rapport à la planification après trois années de mise en œuvre. Cela interpelle une fois de plus l'ensemble des acteurs à redoubler d'effort dans la mobilisation des ressources pour le financement du PN-AEUE.

## 7 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

### 7.1 Principaux freins

Tableau 50: Difficultés et propositions de solutions

Difficultés	Propositions de solutions
Le budget programme de l'année est tardivement disponible	Rendre disponible le budget programme de l'année n à l'année n-1
Lenteur dans le processus de passation de marché	Alléger la procédure de passation de marchés publics ; traiter les dossiers à tant
Retard dans la disponibilité des budgets de fonctionnement lié à la lenteur dans le processus de déblocage	Permettre un déblocage des budgets de fonctionnement dès le premier trimestre pour permettre une meilleure mise en œuvre des activités des DREA
Insuffisance de ressources financières pour la mise en œuvre des activités des actions 1 et 5 au niveau de la DREA	Rendre disponible les ressources financières pour la mise en œuvre des activités des actions 1 et 5 au niveau de la DREA
Défaillance de certaines entreprises dans l'exécution des travaux	Accorder plus de rigueur et de vigilance dans le recrutement des entreprises
Multiplicité des acteurs sur un même site avec des approches différentes	Harmoniser les interventions
Capitalisation difficile de données et d'activités réalisées sur le terrain par les partenaires (surtout pour ce qui concerne les activités de l'ATPC) ; non maîtrise du processus ATPC	Les partenaires doivent mettre plus de sérieux dans la capitalisation de leurs interventions sur le terrain afin de permettre aux DREA de mieux faire les compilations ; se faire former sur le processus
L'endettement des DREA lié au gel de certains fonds entraînant pour payer en totalité les entreprises	-

<b>Difficultés</b>	<b>Propositions de solutions</b>
Insuffisance de moyens financiers pour un suivi efficace des travaux	Augmenter le budget alloué au suivi des travaux
Non-respect des guides en matière d'intermédiation sociale (ImS) par certains bureaux d'étude	Veiller à l'application des guides d'intermédiation sociale en assurant un suivi effectif des bureaux d'étude
Insuffisance dans les activités d'intermédiation sociale (IMS)	Intensifier les campagnes de sensibilisation
Faible engouement des bénéficiaires des latrines semi-finies dans la réalisation des superstructures par les ménages	Intensifier les campagnes de sensibilisation
Insuffisance de moyen/ manque de ressources pour mener les activités liées à l'assainissement dans les communes	Renforcer l'appui aux communes pour le volet assainissement
Difficulté d'exploitation des fichiers de rapportage bilans de la part des DREA	Renforcer les capacités des DREA sur les canevas
Méconnaissance des documents par les acteurs régionaux	Une meilleure appropriation des documents est nécessaire de la part des régions
Transfert tardif des fonds des différents ministères aux communes pour la réalisation des latrines	Transférer les fonds plutôt pour permettre la réalisation des travaux au cours de l'année du transfert
La mobilité des Directeurs provinciaux de l'eau et de l'assainissement	Renforcer les capacités en ressources humaines, matériels et financières des DPEA
Absence de service technique pour l'eau et l'assainissement au sein des communes	Doter les communes d'agents techniques
Insuffisance des fonds alloués au secteur AEUE	Faire un plaidoyer auprès de l'Etat et des PTF pour l'augmentation des fonds alloués aux programmes (mieux argumenter)
Difficultés dans la gestion des ouvrages d'assainissement par les bénéficiaires	Sensibiliser davantage les bénéficiaires à travers de l'IMS
Le nombre de points focaux et le temps réparti à la collecte des latrines familiales sont insuffisants	Augmenter le nombre de points focaux par commune surtout pour les vastes communes et aussi augmenter le temps imparti à la collecte des données.
La non-adhésion de certains villages au processus de l'ATPC	Effectuer des voyages d'étude avec les leaders de ces villages dans les villages déclarés FDAL.
Faible allocation budgétaire pour le suivi des villages déclenchés ainsi que ceux déclarés FDAL par la DREA-SHL	Faire un plaidoyer auprès des PTF pour augmenter les ressources allouées au suivi des villages déclenchés et déclarés FDAL
Manque de possibilité pour le suivi des villages déclarés FDAL en vue de maintenir leur statut pour la certification	Mettre en place un dispositif de suivi de ces villages
L'insuffisance de concertation entre les DREA et les acteurs dans la mise de certaines activités	Initier des cadres de concertation avec tous les acteurs de l'eau et l'assainissement dans les régions afin d'y remédier

Source : Rapports bilans régionaux 2018

---

## 8 RECOMMANDATIONS

---

Les différentes recommandations formulées par les acteurs pour aboutir à une bonne exécution du programme sont entre autres :

- harmoniser et coordonner les différentes interventions sur le terrain en ATPC;
- instaurer un cadre de concertation régional sur la mise en œuvre de l'ATPC ;
- augmenter les fonds alloués à la mise en œuvre du PNAEUE ;
- revoir le circuit de passation des marchés de telle sorte à l'alléger et à le rendre plus opérationnel ;
- prendre en compte les conditions idéales de mise en œuvre de l'ATPC sans subvention dans nos politiques et stratégies en matière d'assainissement ;
- opérationnaliser le DISE ;
- former le personnel d'Etat et les autres acteurs sur la mise globale en œuvre du programme ;
- former les DREA et les auteurs de mise en œuvre (communes, ONG, bureau d'étude) sur l'ATPC ;
- former les DREA et les auteurs de mise en œuvre (communes, ONG, bureau d'étude) sur les nouveaux dossiers types d'appels à concurrence ;
- opérationnaliser le plan d'action AMOC AEPHA adopté en mars 2018 ;
- Doter les directions des moyens conséquents pour la mise en œuvre effective du programme en général et en particulier l'ATPC;
- renforcer la communication et la collaboration entre les communes et les DREA ;
- Impliquer les Directeurs provinciaux dans l'exécution des ressources transférés;
- Inviter les acteurs à la mise en œuvre de l'ATPC à se conformer à la stratégie nationale de l'ATPC ;
- A l'endroit des communes, impliquer d'avantage la DREA dans l'exécution des fonds transférés pour permettre une bonne mise en œuvre des activités et ainsi réceptionner des ouvrages de qualité ;
- Inciter les différents leaders à prêter leur concours pour une mise en œuvre efficace et réussie du programme.

---

## 9 CONCLUSION

---

En milieu rural, pour l'année 2018, le bilan physique des réalisations des ouvrages d'assainissement est moyen. On note la réalisation de 22174 latrines familiales, 1035 latrines institutionnelles et publiques ainsi que la réalisation de 1286 puisards. Ces réalisations ont permis de desservir 221 740 personnes supplémentaires portant le taux d'accès à l'assainissement à 16,4% pour une cible de 17%.

Quant à l'éradication de la défécation à l'air libre, 139 villages supplémentaires ont été déclarés FDAL et 81 nouveaux certifiés portant ainsi le nombre de villages certifiés à 159 soit un taux de certification de 11,8% pour une cible révisé de 10%.

En milieu urbain, le taux de réalisation a drastiquement chuté à 14,1% soit 6906 latrines familiales contre 89% en 2017. Le nombre total de puisards réalisés est également faible avec 2971 puisards. Ces réalisations ont permis de desservir 91 410 personnes additionnelles. Le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain est passé de 38,3% en 2017 à 38,2% en 2018. Soit une régression de 0,1point.

Sur le plan national au total 29 080 latrines familiales ont été réalisées, 1115 latrines institutionnels et publiques et 4 257 puisards. Ces réalisations ont permis de porter le taux d'accès national à l'assainissement à **22,6%** contre une cible de 24% qui n'est donc pas atteinte.

La population desservie en assainissement est de **4 468 907 personnes sur une population totale du pays de 19 776 728**

Il faut noter que la mise en œuvre des activités s'est déroulé dans un contexte national particulièrement difficile marqué par l'insécurité, ayant occasionné des restrictions et ou régulations budgétaires de l'Etat couplée aux multiples grèves dans le circuit de l'administration des finances avec pour corollaire des retards dans la passation des marchés, le déblocage tardif des crédits budgétaires. Aussi, le manque de synergie dans les interventions, la défaillance et à l'insuffisance de professionnalisme de certaines entreprises ont entaché la mise en œuvre du programme.

---

# ANNEXES

---

Annexe1 : Evolution du taux d'accès par province

Tableau 51: Evolution du taux d'accès par province

REGIONS	PROVINCES	Taux d'accès à l'assainissement familial 2017	Taux d'accès à l'assainissement familial 2018
<b>Boucle du Mouhoun</b>	BALE	47,7	47,6
	BANWA	14,0	16,1
	KOSSI	9,3	13,8
	MOUHOUN	12,8	13,8
	NAYALA	9,8	11,3
	SOUROU	7,8	9,0
<b>Cascades</b>	COMOE	9,3	11,1
	LERABA	12,9	13,0
<b>Centre</b>	KADIOGO	34,0	35,6
<b>Centre-Est</b>	BOULGOU	11,9	12,7
	KOULPELOGO	27,2	27,0
	KOURITENGA	28,0	27,8
<b>Centre-Nord</b>	BAM	20,3	20,7
	NAMENTENGA	15,8	16,6
	SANMATENGA	9,7	10,5
<b>Centre-Ouest</b>	BOULKIEMDE	14,8	15,1
	SANGUIE	17,8	17,8
	SISSILI	10,4	13,1
	ZIRO	10,0	10,8
<b>Centre-Sud</b>	BAZEGA	11,0	12,2
	NAHOURI	4,9	5,1
	ZOUNDWEOGO	8,9	11,2
<b>Est</b>	GNAGNA	24,2	23,9
	GOURMA	8,6	8,4
	KOMANDJOARI	6,0	6,4
	KOMPIENGA	12,0	17,6
	TAPOA	7,3	7,1
<b>Hauts-Bassins</b>	HOUET	11,9	16,6
	KENEDOUGOU	14,3	20,2
	TUY	24,8	25,2
<b>Nord</b>	LOROUM	13,4	14,1
	PASSORE	16,7	18,1
	YATENGA	19,5	20,8
	ZONDOMA	15,6	20,1
<b>Plateau Central</b>	GANZOURGOU	16,5	17,3
	KOURWEOGO	19,2	19,4
	OUBRITENGA	25,8	26,0

REGIONS	PROVINCES	Taux d'accès à l'assainissement familial 2017	Taux d'accès à l'assainissement familial 2018
<b>Sahel</b>	OULDALAN	7,7	8,0
	SENO	13,4	14,1
	SOUM	15,0	15,6
	YAGHA	11,7	12,8
<b>Sud-Ouest</b>	BOUGOURIBA	20,7	26,6
	IOBA	9,7	11,1
	NOUMBIEL	31,7	35,7
	PONI	10,9	11,0
<b>BURKINA FASO</b>		15,1	16,4

Tableau 52: Indicateurs

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS		CODE DISE	Réalizations		
					2016	2017	2018
<b>ACTION 1 :</b> Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	<b>Objectif opérationnel :</b> Éradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages déclenchés		2A1bis.1	992	1133	1342
		Nombre de villages déclarés FDAL		??	124	251	390
		Proportion de villages certifiés FDAL		2A1.1	1,1	5	11,8
		Proportion de la population déféquant à l'air libre		3A1.1			
		Proportion de la population ayant adopté le lavage des mains au savon après utilisation des latrines		4A1.1			
		Nombre de latrines familiales construites		2A5.1	4 326	3 677	3 032
		Proportion d'ouvrages d'assainissement familial réalisés entièrement sans subvention		4A3.1	17,1	15,2	13,7
<b>ACTION 2 :</b> Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	Éradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de secteurs déclenchés		2A1bis.2			
		Nombre de secteurs déclarés FDAL					
		Proportion de secteurs certifiés FDAL		2A1.2			
		Proportion de la population déféquant à l'air libre		3A1.2			
		Proportion de la population ayant adopté le lavage des mains au savon après utilisation des latrines					
		Nombre de latrines familiales s construites		2A5.2			
		Proportion d'ouvrages d'assainissement familial réalisés entièrement sans subvention		4A3.2			
<b>ACTION 1 &amp; 2 :</b> Éradication de la		Nombre de villages et secteurs déclenchés		2A1bi	992	1133	1342



défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement au niveau national	<b>Objectif opérationnel :</b> Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages et secteurs déclarés FDAL			124	251	390
		Proportion de villages et secteurs certifiés FDAL		2A1s	1,1	5	11,8
		Proportion de la population déféquant à l'air libre		3A1			
		Proportion de la population ayant adopté le lavage des mains au savon après utilisation des latrines		4A1			
		Nombre de latrines familiales construites		2A5			
		Proportion d'ouvrages d'assainissement familial réalisés entièrement sans subvention		4A3			
<b>ACTION 3 :</b> Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	<b>Objectif opérationnel :</b> Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)	Taux d'accès des populations à l'assainissement en milieu rural		4A2.1	13,4	15,1	16,4
		Taux d'équipement des établissements scolaires et de formation en ouvrages d'assainissement (latrines)		4A4.1	67,1	70,7	72,4
		Taux d'équipement des établissements sanitaires en ouvrages d'assainissement (latrines)		4A5.1	88,2	90,3	87,2
		Taux d'équipement des lieux publics en ouvrages d'assainissement (latrines)		4A6.1			
		Taux de fonctionnalité des ouvrages d'assainissement (latrines) des établissements scolaires et de formation		3A2.1			
		Taux de fonctionnalité des ouvrages d'assainissement (latrines) des établissements sanitaires		3A3.1			
		Taux de fonctionnalité des ouvrages d'assainissement (latrines) des lieux publics		3A4.1			
		Proportion des ouvrages d'assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation		4A12.1	14,3	16,8	17,15

<b>ACTION 11204 :</b> Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain	<b>Objectif opérationnel :</b> Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)	Taux d'accès des populations à l'assainissement en milieu urbain	4A2.2	36,8	38,3	38,2
		Taux d'équipement des établissements scolaires et de formation en ouvrages d'assainissement	4A4.2			
		Taux d'équipement des établissements sanitaires en ouvrages d'assainissement	4A5.2			
		Taux d'équipement des lieux publics en ouvrages d'assainissement	4A6.2			
		Taux de fonctionnalité des ouvrages d'assainissement des établissements scolaires et de formation	3A2.2			
		Taux de fonctionnalité des ouvrages d'assainissement des établissements sanitaires	3A3.2			
		Taux de fonctionnalité des ouvrages d'assainissement des lieux publics	3A4.2			
		Proportion des ouvrages d'assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation	4A12.2			
		Taux de raccordements des industries au réseau d'égout public	4A7.2			
<b>ACTION 3 &amp; 4 :</b> Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement au niveau national	<b>Objectif opérationnel :</b> Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)	Taux d'accès des populations à l'assainissement en milieu urbain	??	19,8	21,6	22,6
		Taux d'équipement des établissements scolaires et de formation en ouvrages d'assainissement	4A4			
		Taux d'équipement des établissements sanitaires en ouvrages d'assainissement	4A5			
		Taux d'équipement des lieux publics en ouvrages d'assainissement	4A6			
		Taux de fonctionnalité des ouvrages d'assainissement des établissements scolaires et de formation	3A2			
		Taux de fonctionnalité des ouvrages d'assainissement des établissements sanitaires	3A3			

		Taux de fonctionnalité des ouvrages d'assainissement des lieux publics		3A4			
		Proportion des ouvrages d'assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation		4A12			
		Taux de raccordements des industries au réseau d'égout public		4A7			
<b>ACTION 05 :</b> Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidanges	<b>Objectif opérationnel:</b> Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	Nombre de communes disposant d'un site de dépotage adéquat des boues de vidange		2A4			
		Volume de boue de vidange traité par an		??			352 612
<b>ACTION 6 :</b> Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excreta	<b>Objectif opérationnel :</b> Développer la recherche dans le domaine de l'AEUE en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques	Nombre de nouvelles technologies, d'assainissement ou de gestion des eaux usées et excreta, développées et mises à disposition par la recherche au niveau national		2A2			
		Nombre d'approches de changement de comportement initiées		??			
<b>ACTION 11207:</b> Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	<b>Objectif Opérationnel :</b> Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de financement du PN-AEUE		1A1			
		Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excreta base engagement		1A2			
		Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excreta base liquidation		1A2bis			
		Proportion des fonds publics AEUE transférés aux collectivités territoriales		1G2			

		Nombre de personnes bénéficiaires d'un renforcement de capacité dans le domaine de l'AEUE					2345
		Taux de réalisation des cadres de concertation du PN-AEUE					
		Taux de renseignement des indicateurs de suivi-évaluation intégré du PN-AEUE.		4A11			
	<b>Objectif Stratégique:</b> Assurer un assainissement durable des eaux usées et excreta	Prévalence des maladies diarrhéiques.		5G2			

