

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT,  
DE L'ENERGIE, DE L'EAU ET  
DE L'ASSAINISSEMENT**

-----  
**SECRETARIAT GENERAL**

-----  
**DIRECTION GENERALE  
DE L'ASSAINISSEMENT**

**BURKINA FASO**  
-----  
**Unité-Progrès-Justice**

## **PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRÉTAS**



## **RAPPORT-BILAN NATIONAL ANNUEL 2021**

*Mars 2022*

# SOMMAIRE

<b>RESUME EXECUTIF</b>	<b>vii</b>
<b>1 INTRODUCTION</b>	<b>1</b>
<b>2 METHODOLOGIE</b>	<b>1</b>
<b>3 PRESENTATION DU PN-AEUE</b>	<b>3</b>
3.1 Objectifs	3
3.2 Rappel des points clés de la session à mi-parcours de 2021	3
3.3 Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente	4
<b>4 BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2021</b>	<b>5</b>
<b>4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural</b>	<b>6</b>
Produit 1.1.1 : Les villages déclenchés à la phase 1 (2016-2020) sont certifiées FDAL	6
Produit 1.1.2 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans les villages (à partir de 2021)	7
Produit 1.1.3 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement	10
a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages	10
a) Sensibilisation de masse	11
b) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)	12
c) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint	14
<b>4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain</b>	<b>18</b>
<b>4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain</b>	<b>18</b>
Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains	18
Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.	18
a) Formation et coordination	18
<b>4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)</b>	<b>19</b>
Produit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	19
Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	25
Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural	32
<b>4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)</b>	<b>35</b>
<b>4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement</b>	<b>35</b>
Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	35
Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	37
Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	39
<b>4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale</b>	<b>40</b>
<b>4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale</b>	<b>40</b>
Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée	40
Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	42
Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal	43
<b>4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b>44</b>

<b>4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b>44</b>
Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes	44
Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta	44
Produit 6.1.3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement	44
<b>4.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.</b>	<b>45</b>
<b>4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur</b>	<b>45</b>
Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages	49
Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance	50
Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	53
<b>5 BILAN FINANCIER</b>	<b>61</b>
<b>5.1 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural</b>	<b>61</b>
<b>5.2 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain</b>	<b>64</b>
<b>5.3 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement</b>	<b>64</b>
<b>5.4 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement</b>	<b>73</b>
<b>5.5 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale</b>	<b>75</b>
<b>5.6 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b>76</b>
<b>5.7 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur</b>	<b>77</b>
<b>6 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES</b>	<b>79</b>
<b>7 analyse des performances et evolution des indicateurs</b>	<b>81</b>
7.1 Assainissement en milieu rural	81
7.2 Assainissement en milieu urbain	89
7.3 Assainissement national	91
<b>8 FINANCEMENT DU PROGRAMME</b>	<b>94</b>
<b>9 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS</b>	<b>95</b>
9.1 Principaux freins	95
<b>10 RECOMMANDATIONS</b>	<b>97</b>
<b>11 CONCLUSION</b>	<b>98</b>
<b>ANNEXES</b>	<b>I</b>

## LISTE DES TABLEAUX

<b>Tableau 1</b> : Récapitulatif des résultats au 30 juin 2021 _____	3
<b>Tableau 2</b> : Mise en œuvre des recommandations _____	4
<b>Tableau 3</b> : Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action _____	5
<b>Tableau 4</b> : Déclaration et certification de villages déclenchés sur la période 2016-2020 _____	6
<b>Tableau 5</b> : situation de l'ATPC dans les villages en 2021 _____	7
<b>Tableau 6</b> : évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC _____	8
<b>Tableau 7</b> : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC _____	9
<b>Tableau 8</b> : formation et coordination _____	10
<b>Tableau 9</b> : Activités de sensibilisations de masse _____	11
<b>Tableau 10</b> : sensibilisation dans les ménages _____	12
<b>Tableau 11</b> : Sensibilisation de proximité dans les institutions _____	14
<b>Tableau 12</b> : Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions _____	16
<b>Tableau 13</b> : opérations pré-réalisation de latrines familiales _____	19
<b>Tableau 14</b> : Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural _____	20
<b>Tableau 15</b> : Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural _____	22
<b>Tableau 16</b> : Situation des latrines semi-finies _____	22
<b>Tableau 17</b> : Situation de réalisation et de réhabilitation de latrines familiales _____	23
<b>Tableau 18</b> : Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques _____	24
<b>Tableau 19</b> : opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques _____	25
<b>Tableau 20</b> : Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation _____	25
<b>Tableau 21</b> : Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles _____	26
<b>Tableau 22</b> : Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé _____	27
<b>Tableau 23</b> : Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics _____	28
<b>Tableau 24</b> : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI _____	31
<b>Tableau 25</b> : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI _____	31
<b>Tableau 26</b> : Formation et suivi _____	32
<b>Tableau 27</b> : latrines suivies dans le cadre de leur gestion _____	33
<b>Tableau 28</b> : Réalisations de latrines familiales en milieu urbain _____	35
<b>Tableau 29</b> : Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain _____	36
<b>Tableau 30</b> : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation _____	37
<b>Tableau 31</b> : Réalisations de latrines dans les lieux publics _____	38
<b>Tableau 32</b> : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges _____	41
<b>Tableau 33</b> : développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif _____	42
<b>Tableau 34</b> : Extension du réseau collectif _____	42
<b>Tableau 35</b> : Formation des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement _____	43
<b>Tableau 36</b> : Mobilisation financière des ménages _____	45
<b>Tableau 37</b> : sanithons et nuits de l'assainissement _____	46
<b>Tableau 38</b> : ressources financières mobilisées _____	48
<b>Tableau 39</b> : efforts des ménages _____	49
<b>Tableau 40</b> : Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural _____	51
<b>Tableau 41</b> : Voyages d'études et partage d'expérience réalisés _____	54
<b>Tableau 42</b> : autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur _____	55
<b>Tableau 43</b> : Cadres de concertation communaux _____	59
<b>Tableau 44</b> : Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural _____	61
<b>Tableau 45</b> : Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural _____	62
<b>Tableau 46</b> : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1 _____	63
<b>Tableau 47</b> : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA) _____	64
<b>Tableau 48</b> : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA) _____	65
<b>Tableau 49</b> : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques _____	66
<b>Tableau 50</b> : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles _____	67

<b>Tableau 51:</b> Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé _____	68
<b>Tableau 52 :</b> Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics _____	69
<b>Tableau 53:</b> taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique) _____	70
<b>Tableau 54 :</b> Situation de l'exécution financière du produits 3 _____	71
<b>Tableau 55:</b> Taux d'exécution financière de l'action 3 _____	72
<b>Tableau 56 :</b> Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses septiques _____	73
<b>Tableau 57 :</b> Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain _____	74
<b>Tableau 58:</b> Exécutions financières de l'action 5 _____	75
<b>Tableau 59:</b> Exécution financière des actions de la recherche _____	76
<b>Tableau 60 :</b> Exécution financière de l'action _____	77
<b>Tableau 61 :</b> Exécution financière globale du PN-AEUE au niveau régional _____	78
<b>Tableau 62:</b> Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : <b>mode de passation des marchés</b> _____	79
<b>Tableau 63:</b> Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : <b>état d'exécution des marchés</b> _____	80
Tableau 64: Evolution du taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural par région (en %) _____	82
Tableau 65 : Proportion des latrines par acteur _____	84
<b>Tableau 66 :</b> Situation de l'état de Fin de défécation à l'air libre _____	85
<b>Tableau 67 :</b> Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural _____	87
<b>Tableau 68:</b> Situation de l'accessibilité des latrines aux handicapés _____	88
<b>Tableau 69 :</b> taux d'accès 2021 par région en milieu urbain _____	89
<b>Tableau 70:</b> synthèse des ouvrages AEUE _____	92
<b>Tableau 71:</b> situation des indicateurs de performance du PN-AEUE _____	93
<b>Tableau 72 :</b> Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA) _____	94
<b>Tableau 73:</b> Difficultés et propositions de solutions _____	95
<b>Tableau 74:</b> Evolution du taux d'accès par province _____	I

## LISTES DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS

<b>Figure 1</b> : Taux d'accès à l'assainissement familial en 2021 par région	81
<b>Figure 2</b> : évolution du taux d'accès et population additionnelle desservie	82
<b>Figure 3</b> : Situation de disponibilité de dispositif de lavage des mains (DLM)	83
<b>Figure 4</b> : Situation de la pratique de lavage des mains par les ménages	83
<b>Figure 5</b> : situation de l'entretien des latrines dans les ménages	84
<b>Figure 6</b> : Evolution du taux d'accès en milieu urbain	90
<b>Figure 7</b> : Taux globaux de l'assainissement	91
<b>Figure 8</b> : Evolution du taux d'accès national	91

## SIGLES ET ABREVIATIONS

<b>ABS</b>	: Appui Budgétaire Sectoriel
<b>ACF</b>	: Association Chant de Femme
<b>ADAE</b>	: Association pour le Développement des Adductions d'Eau
<b>AEP</b>	: Approvisionnement en Eau Potable
<b>AEPA</b>	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
<b>AEPHA</b>	: Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement
<b>AEUE</b>	: Assainissement des Eaux Usées et Excrétas
<b>AFDH</b>	: Approche Fondée sur les Droits Humains
<b>AMOC</b>	: Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communale
<b>ATPC</b>	: Assainissement Total Piloté par la Communauté
<b>ATPL</b>	: Assainissement Total Porté par les Leaders
<b>ASBC</b>	: Agents de Santé à Base Communautaire
<b>BD</b>	: Base de Données
<b>BPO</b>	: Budget Programme par Objectifs
<b>CADEPAC</b>	: Cellule d'Appui à la Décentralisation et à la Participation Citoyenne
<b>CAP</b>	: Connaissances Attitudes et Pratiques
<b>CCEA</b>	: Cadre de Concertation sur l'Eau et l'Assainissement
<b>CMP</b>	: Cadre de Mesure de Performance
<b>CNP</b>	: Comité National de Pilotage
<b>CRP</b>	: Comité Régional de Pilotage
<b>CSPS</b>	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
<b>CSD</b>	: Cadre Sectoriel de Dialogue
<b>CUCA</b>	: Cadre Unifié de Coordination de l'Assainissement
<b>CUI</b>	: Cadre Unifié d'Intervention
<b>DAL</b>	: Défécation à l'Air Libre
<b>DAO</b>	: Dossier d'Appel d'Offres
<b>DGA</b>	: Direction Générale de l'Assainissement
<b>DGESS</b>	: Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels
<b>DGEP</b>	: Direction Générale de l'Eau Potable
<b>DISE</b>	: Dispositif Intégré de Suivi Evaluation
<b>DPEA</b>	: Direction Provinciale de l'Eau et de l'Assainissement
<b>DREA</b>	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
<b>ENA</b>	: Enquête Nationale sur l'Assainissement
<b>ECOSAN</b>	: Ecological Sanitation (Assainissement Ecologique)
<b>FDAL</b>	: Fin de la Défécation à l'Air Libre
<b>GBV</b>	: Gestion des Boues de Vidange
<b>GEIS</b>	: Groupe Eau et Ingénierie Sociale
<b>GTEA</b>	: Groupe Thématique Eau et Assainissement
<b>IEC</b>	: Information-Education-Communication
<b>IMS</b>	: Intermédiation Sociale
<b>INOA</b>	: Inventaire National des Ouvrages d'Assainissement en milieu rural
<b>INSD</b>	: Institut National de la Statistique et de la Démographie
<b>LSF</b>	: Latrines Semi Finies
<b>MEA</b>	: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement
<b>MOC</b>	: Maitrise d'Ouvrage Communal
<b>OCADES</b>	: Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité

<b>ODD</b>	: Objectifs du Développement Durable
<b>OMD</b>	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
<b>ONEA</b>	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
<b>ONG</b>	: Organisation Non Gouvernementale
<b>PCD-AEPA</b>	: Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
<b>PEA/GIZ</b>	: Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande
<b>PGEA</b>	: Programme Gouvernance Eau et Assainissement
<b>PHA</b>	: Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement
<b>PHA-BID-UEMOA</b>	: Programme d'Hydraulique et Assainissement financement BID-UEMOA
<b>PN-AEPA</b>	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
<b>PN-AEUE</b>	: Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas
<b>PNDES</b>	: Plan National de Développement Economique et Sociale
<b>PNGT</b>	: Programme National de Gestion des Terroirs
<b>PPS</b>	: Programme Pilotage et Soutien
<b>PTF</b>	: Partenaire Technique et Financier
<b>RGPH</b>	: Recensement Général de la Population et de l'Habitat
<b>SAMOC</b>	: Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
<b>SNE</b>	: Stratégie Nationale de l'Eau
<b>STEP</b>	: Station d'Epuration
<b>STBV</b>	: Station de Traitement des Boues de Vidange
<b>TCM</b>	: Toilette à Chasse Manuelle
<b>TIC</b>	: Technologie de l'Information et de la Communication
<b>UNICEF</b>	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
<b>VIP</b>	: Ventilated Improved Pit (Latrines Améliorées à fosses ventilées)
<b>WHH</b>	: Welf Hunger Hilfe



Au 31 décembre 2021, le bilan d'exécution des activités du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AEUE) se résume ainsi qu'il suit :

## **1. Bilan physique**

Dans l'ensemble, le taux d'exécution physique global du programme au 31 décembre 2021 est de **63,6%**. Les détails par action se présentent comme suit :

### **❖ Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural**

Pour l'année 2021, 279 villages ont été déclenchés, 67 villages déclarés FDAL soit un taux de succès de 24%, et 12 villages ont été certifiés dont certains avaient été déclarés les années antérieures. Au total 2 862 villages ont été déclenchés depuis la mise en œuvre de l'ATPC dont 590 déclarés FDAL et 346 certifiés. Ce qui permet d'obtenir un taux de certification de 3,9% et un taux de déclaration FDAL de 6,6%. En ce qui concerne les sensibilisations de masse, 4 324 émissions sur divers thèmes de l'hygiène et de l'assainissement ont été réalisées sur le territoire national. Pour les sensibilisations de proximité dans les ménages, les lieux institutionnels et publics, 774 212 personnes ont été touchées dont 47% de femmes et filles.

Pour cette action, on a obtenu un taux d'exécution de 75,3% et un taux financier engagé de 40,6%.

### **❖ Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain**

Pour cette action, aucune activité n'a été menée soit un taux d'exécution physique de 0% et un taux d'exécution financier sur base engagement de 26,7%.

### **❖ Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural**

Le bilan des réalisations se présente comme suit :

- 22 485 latrines familiales issues de la programmation de 52 408 soit un taux d'exécution de 42,9%. On note cependant, 786 latrines réalisées en hors programmation soit un total de 23 271 latrines réalisés en 2021 ;
- 287 latrines familiales réhabilitées dont 18 issues de la programmation de 409 latrines soit un taux de réalisation de 4,4% ;
- 3 254 puisards soit un taux d'exécution de 33% ;
- 799 latrines institutionnelles et publiques issues de la programmation soit un taux d'exécution de 63%. Aussi, nous notons 410 autres réalisées en hors programmation soit 1 209 au total en 2021. De plus, 75 latrines ont été réhabilitées.

Ces réalisations ont permis d'obtenir à un taux d'exécution physique de 45,9% avec un taux d'engagement financier de 62,1%, pour cette action.

### **❖ Action 4 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain**

Le bilan des réalisations se présente comme suit :

- 19 495 latrines familiales soit un taux d'exécution de 78% ;
- 12 900 puisards soit un taux de d'exécution 78% ;
- 203 latrines institutionnelles et publiques soit un taux de d'exécution 92,3%.

Ces réalisations ont permis d'aboutir à un taux d'exécution physique de 76,9% avec un taux d'engagement financier de 100%.

#### ❖ **Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

L'identification et l'organisation des vidangeurs ont été les principales activités menées par les acteurs. Ainsi 03 vidangeurs professionnels et une association de vidangeurs ont été identifiés dans la ville de Ouahigouya dans la région du Nord. Aussi, dans la région des Cascades, 08 vidangeurs manuels ont été recensés et formés.

On a le traitement de 443 023 m<sup>3</sup> de boue de vidange sur une collecte de 443 023 m<sup>3</sup> soit un taux de 100%.

Au final les taux respectifs d'exécution physique et financier engagé sont respectivement de 50,3% et de 3%.

#### ❖ **Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta**

Dans le cadre du développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta, des études ont été réalisées dans les communes de Boromo et Sibi sur la Gestion des boues de vidange. Aussi, la Direction générale de l'Assainissement DGA a tenu une réflexion nationale sur la mise en œuvre de l'approche ATPC au Burkina Faso avec l'ensemble des acteurs où le rapport de l'état des lieux de la mise en œuvre de l'ATPC a été présenté. De plus, un Salon international des toilettes, de l'assainissement et de l'hygiène de Ouagadougou (SITAHO) a été organisé pour valoriser les innovations dans le domaine de l'assainissement et créer un cadre d'expositions et d'échanges entre acteurs du sous-secteur.

#### ❖ **Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur**

La situation des ressources mobilisées est la suivante :

- 1 406, 890 millions par 5 l'ensemble des régions à titre de fonds propres des collectivités, des ménages, de la coopération décentralisée et des PTF ;
- 705,231 millions ont été transférés aux communes au titre de la promotion de l'assainissement en milieu rural ;
- 260 personnes dont 71 femmes ont été formées sur divers thématiques en lien avec l'assainissement.

Le taux d'exécution de cette action est de 72,2% avec un taux financier est de 93,7%.

## **2. Bilan financier**

Le taux d'exécution financière liquidé du PN-AEUE au 31 décembre 2021 est de 58,6% soit 9 076,463 millions dépensées sur 15 492,420 millions programmés. En rappel le taux d'exécution base engagement est de 71,5%.

### **3. Performance et évolution des indicateurs**

En milieu rural, le taux d'accès à l'assainissement est passé de 19,9% en 2020 à 21% en 2021 pour une cible de 21,4%, soit une population totale desservie de 3 177 478 personnes.

En milieu urbain, le taux d'accès à l'assainissement est passé de 38,6% en 2020 à 40,8% en 2021 pour une cible de 42%, soit une population totale desservie de 2 602 612 personnes.

Sur le plan national, le taux d'accès à l'assainissement en 2021 est de 26,8% pour une cible de 26,3% et la population totale desservie est de 5 780 090 personnes.

---

## 1 INTRODUCTION

---

Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel n° 2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) à l'horizon 2030 qui constitue le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d'assainissement des eaux usées et excréta. L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Il comporte sept (07) actions réparties sur cinq (05) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs: les structures étatiques telles que le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA), le Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), le Ministère de la Santé (MS), le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), le Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville (MUHV), le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les associations et ONG, le secteur privé, etc. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l'Assainissement (DGA). Le programme est évalué par un Comité de Revue et supervisé par un Groupe thématique national (GTN) des Programmes de la Politique Nationale de l'Eau.

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au 31 décembre de l'année 2021. Il fait ressortir des informations relatives à l'avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le Plan Opérationnel 2021-2025 élaboré en cohérence avec le PNDES. Il est établi sur la base des rapports bilans annuels des DREA, de la DGA, du rapport de programmation révisée 2021 et du Budget Programme du MEA.

---

## 2 METHODOLOGIE

---

Le rapport bilan annuel du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l'assainissement durant l'année en cours. Son élaboration s'appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes successives :

- la révision des canevas des rapports bilans régionaux et leur transmission aux directions régionales de l'eau et de l'assainissement pour remplissage ;
- la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR) ;
- la synthèse, le traitement et l'analyse des rapports bilan régionaux du PN-AEUE ;
- la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national annuel ;
- la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue.

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l'organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur Eau et Assainissement, élaborée par la Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles (DGESS) sur la période considérée.

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d'exécution physique des activités, des produits, des actions, des programmes et du sous-secteur. Le taux de réalisation annuel calculé sur la base de la programmation physique révisée permet d'apprécier le niveau d'atteinte de l'objectif annuel.

## Taux de réalisation annuel (%)

- ✓ **Taux de réalisation physique annuel d'une activité**

$$\text{Taux de réalisation (activité)} = \frac{\text{réalisation physique annuelle}}{\text{programmation physique annuelle révisée}} \times 100$$

- ✓ **Taux de réalisation physique annuel de l'action/programme/sous-secteur**

$$\text{Taux de réalisation annuel (action/programme/sous – secteur)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Tx}_{\text{activité}_i}$$

Où :

**n** représente le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur ;

**Tx<sub>activité<sub>i</sub></sub>** représente le taux de réalisation annuel de l'activité *i* de l'action/programme/sous-secteur.

Pour l'exécution financière, la méthode suivante a été suivie :

## Le taux d'exécution financière global

- *Taux d'exécution financière d'une activité*

$$\begin{aligned} \text{Taux d'exécution financière (activité)} \\ = \frac{(\text{réalisation financière annuelle (engagé visé)})}{(\text{programmation financière annuelle révisée})} \times 100 \end{aligned}$$

- **Taux d'exécution financière de l'action/programme/sous-secteur**

$$\begin{aligned} \text{Taux d'exécution financière (action/programme/sous – secteur)} \\ = \frac{\sum_{i=1}^n \text{réalisation financière annuelle (engagé visé)}}{\sum_{i=1}^n \text{programmation financière annuelle révisée}} * 100 \end{aligned}$$

Avec **n** le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur.

Le rapport comporte deux (02) parties, la première partie traite des performances physiques annuelles des différentes actions du PN-AEUE et la seconde, des performances financières annuelles.

---

### 3 PRESENTATION DU PN-AEUE

---

#### 3.1 Objectifs

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta. Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement;
- assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques ;
- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L'objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats.

#### 3.2 Rappel des points clés de la session à mi-parcours de 2021

Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 30 juin 2021

Désignation	Programmation physiques révisées au 30 juin 2021	Réalisations physiques au 30 juin 2021	Programmation financières révisées au 30 juin 2021 (en millions)	Montant engagé au 30 juin 2021 (en millions)
Latrines familiales neuves	77 408	20 702	8 609	2 958,92
Latrines familiales réhabilitées	409	79	13,21	8,03
Latrines publiques et institutionnelles neuves	1387	340	3 600,84	1446,117
Latrines publiques et institutionnelles réhabilitées	128	31	141,12	67,144
Puisards domestiques neufs	25 965	10 892	872	252,735

Source : Rapports bilan à mi-parcours et de programmation révisée du PN-AEUE 2021

En rappel le taux d'accès national à l'assainissement au 31 décembre 2020 était de 25,3%.

### 3.3 Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente

**Tableau 2:** Mise en œuvre des recommandations

N°	Recommandations	Échéance	Responsable	État de mise en oeuvre	Observation/commentaire
1	Mettre en place le comité ad'hoc pour le suivi de la mise en œuvre des approches (ATPC, ATPL...)	Décembre 2021	DGA	Non réalisée	En mars 2021, à l'issu de la réflexion nationale sur la mise en œuvre de l'ATPC, il a été suggéré la mise à disposition d'un repertoire des formateurs au niveau national en lieu et place de la création du comité ad'hoc.
2	Renforcer les capacités des acteurs sur les outils de mise en œuvre du PN-AEUE	Décembre 2021	DGA	réalisée	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation des DREA sur les canevas de rapportage en novembre 2021 ;</li> <li>- Formation sur la mise en œuvre du guide ImS et sur l'ATPC ;</li> </ul>
3	L'organisation d'une session de formation au profit des acteurs de suivi-évaluation sur les canevas de rapportage et le document du PN-AEUE	Décembre 2021	DGA	réalisée	Une atelier a eu lieu à Kaya du 08 au 12 novembre 2021 avec la participation des agents en charge des services assainissement et suivi évaluation des DREA.
4	Organiser des nuits de l'assainissement (régionale ou nationale) pour la mobilisation des ressources (DGA+SG/MEA).	Décembre 2021	DGA+SG	Non réalisée	Aucune région n'a pu réaliser une nuit de l'assainissement compte tenu du contexte sécuritaire difficile.

---

## 4 BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2021

---

**Tableau 3:** Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action

Actions mises en œuvre en région	Taux d'exécution physique	Montant prévu en millions	Montant réalisé (engagé visé)	Taux d'exécution financier (engagé visé)	Montant réalisé (liquidé)	Taux d'exécution financier (liquidé)
Action 1	75,3%	1 489,551	604,900	40,6%	535,261	35,9%
Action 2	0,0%	1,500	0,400	26,7%	1,400	93,3%
Action 3	45,9%	9 409,083	5 843,908	62,1%	4 145,410	44,1%
Action 4	76,9%	4 049,371	4 314,183	100,0%	4 103,530	100,0%
Action 5	50,3%	219,000	6,500	3,0%	6,500	3,0%
Action 6	-	0,000	0,000	-	0,000	-
Action 7	76,2%	323,915	303,551	93,7%	284,362	87,8%
<b>Total programme</b>	<b>63,6%</b>	<b>15 492,420</b>	<b>11 073,442</b>	<b>71,5%</b>	<b>9 076,463</b>	<b>58,6%</b>



## 4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

### 4.1.1. Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

#### Produit 1.1.1 : Les villages déclenchés à la phase 1 (2016-2020) sont certifiées FDAL

La mise en œuvre de l'ATPC dans les différentes régions a permis d'obtenir les résultats contenus dans les tableaux ci-dessous.

**Tableau 4** : Déclaration et certification de villages déclenchés sur la période 2016-2020

Régions	Nombre de villages	villages à l'état de déclenchés	villages à l'état de déclaré FDAL	Déclaration FDAL de villages				Certification de villages			
				Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	984	234	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Cascades	291	152		-	-	-	-	-	1		
Centre	187	44		-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Est	750	435	7	-	2	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	966	162	14	-	5	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	594	18	5	-	3	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	538	174		-		-	-	-	-	-	-
Est	842	193	86	-	43	-	-	-	9		
Hauts-Bassins	484	220		-		-	-	-	-	-	-
Nord	915	195		-	12	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	582	92		-	-	-	-	-	-	-	-
Sahel	699	88	76	-	2	-	-	-	2	-	-
Sud-Ouest	1068	50		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>8 900</b>	<b>2057</b>	<b>194</b>	<b>-</b>	<b>67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Pour la période 2016-2020, de nombreux villages sont restés au stade de déclenchement (2057). Au cours de l'année, 67 de ces villages déclenchés ont été déclarés FDAL et 12 certifiés FDAL.

Les programmations des villages à déclarer et à certifier FDAL en 2021 sur ceux antérieurement déclenchés n'étant pas disponible, il est difficile de faire une analyse sur l'effort des acteurs. Ce qui montre une non maîtrise de la planification des acteurs dans la mise en œuvre du processus FDAL.

## Produit 1.1.2 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans les villages (à partir de 2021)

**Tableau 5** : situation de l'ATPC dans les villages en 2021

Régions	Nbre de villages	Villages déclenchés				Déclaration FDAL de villages				Certification de villages				Nombre de déclenchements institutionnels
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	
Boucle du Mouhoun	984	5	3	0	60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cascades	291	2	5	3	100,0	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Centre	187	15	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Est	750	-	-	112	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	966	11	33	22	100,0	36	5	0	13,9	30	0	0	0-	-
Centre-Ouest	594	93	65	0	69,9	-	-	3	-	3	0	0	0	2
Centre-Sud	538	29	4	0	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Est	842	88	39	0	44,3	35	43	8	100,0	57	9	0	15,8	-
Hauts-Bassins	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord	915	-	-	-	-	141	12	0	8,5	-	-	-	-	-
Plateau Central	582	108	10	0	9,3	5	0	0	-	5	0	0	-	-
Sahel	699	20	4	0	20,0	-	2	2	-	-	2	-	-	-
Sud-Ouest	1 068	15	4	0	26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>8 900</b>	<b>386</b>	<b>279</b>	<b>137</b>	<b>36,8</b>	<b>217</b>	<b>67</b>	<b>15</b>	<b>24,0</b>	<b>95</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12,6</b>	<b>2</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Au cours de l'année 2021, la mise en œuvre de l'ATPC a permis de déclencher 279 villages, de déclarer 67 villages et de certifier 12 villages FDAL. Donc par rapport à la programmation révisée au cours de l'année 2021, la mise en œuvre de l'ATPC a permis de déclencher 36,8% des villages issu de la programmation, de déclarer 24,0% des villages et de certifier 12,6% des villages. Le faible niveau d'atteinte des réalisations pourrait s'expliquer par le contexte sécuritaire difficile et aussi par la clôture de certains projets.

**Tableau 6:** évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC

Régions	Nombre de villages (a)	Cumul de villages déclenchés (b)	Cumul de villages déclarés FDAL (c)	Taux de déclaration FDAL (d=c/a*100)	Cumul de villages certifiés FDAL (e)	Taux de certification FDAL (f=e/a*100)
Boucle du Mouhoun	984	244	7	0,7	1	0,1
Cascades	291	157	1	0,3	1	0,3
Centre	187	44	-	0,0	-	0,0
Centre-Est	750	551	7	0,9	4	0,5
Centre-Nord	966	216	27	2,8	8	0,8
Centre-Ouest	594	240	159	26,8	151	25,4
Centre-Sud	538	178	-	0,0	-	0,0
Est	842	453	257	30,5	137	16,3
Hauts-Bassins	484	220	-	0,0	-	0,0
Nord	915	198	12	1,3	-	0,0
Plateau Central	582	102	-	0,0	-	0,0
Sahel	699	201	115	16,5	39	5,6
Sud-Ouest	1068	58	5	0,5	5	0,5
<b>Total National</b>	<b>8900</b>	<b>2862</b>	<b>590</b>	<b>6,6</b>	<b>346</b>	<b>3,9</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Depuis la mise en œuvre de l'ATPC au Burkina Faso, 32,2% des 8900 villages ont été déclenchés. 6,6% et 3,9% des 8900 villages ont été respectivement déclarés et certifiés FDAL. Ces résultats s'expliquent par la non mise en œuvre de l'approche ATPC conformément à la stratégie et au guide d'orientation pour la mise en œuvre de l'ATPC au Burkina Faso. Certains acteurs utilisent l'étape du déclenchement pour susciter une prise de conscience des populations afin qu'elles réalisent elles-mêmes leurs ouvrages.

Aussi, il faut noter que sur les 2862 villages déclenchés, 20,6% ont été déclarés FDAL et 12,1% certifiés FDAL. Ces résultats sont sensiblement égaux à ceux de l'année 2020 qui étaient de 20,4% pour la déclaration et 12,7% pour la certification.

**Tableau 7** : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC

Régions	Nombre de facilitateurs formés				Nombre d'acteurs formés sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC				Nombre de rencontres de coordination de l'ATPC tenues				Nombre de rapport de suivi de l'ATPC rédigés			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	100	2	2	0	100,0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	31	31	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DGA	100	160	60	100	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	11	80,0
<b>Total National</b>	<b>131</b>	<b>267</b>	<b>136</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>85,7</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Sur 131 personnes à former en 2021, 267 ont été formées dont 136 en hors programmation par la DGA, la DREA Centre-Sud et le Centre-Est. L'analyse du tableau montre que les actions de formation et de coordination de l'ATPC ne sont pas systématiquement planifiées au niveau régional par les différents acteurs. Cela explique la non atteinte du processus de la FDAL.

Au cours de cette année, la DGA a assuré le suivi de la mise en œuvre de l'ATPC matérialisé par la production de 15 rapports de suivi.

### Produit 1.1.3 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement

#### a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages

**Tableau 8** : formation et coordination

Régions	Nombre d'ateliers sur les outils de sensibilisation tenus				Nombre de campagne de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun								
Cascades								
Centre	0	1	1					
Centre-Est								
Centre-Nord		10	10			21	21	
Centre-Ouest		1	1					
Centre-Sud								
Est								
Hauts-Bassins			1			12	12	
Nord								
Plateau Central	2	2	0	100	20	20	0	100
Sahel	0	1	1		1	2	1	100
Sud-Ouest		1	1					
<b>Total National</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

Source : collecte de données auprès des acteurs, 2021

Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs pour l'adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les institutions et ménages, seule la région du Plateau Central avait programmé la tenue de deux (02) ateliers sur les outils de sensibilisation. Au bilan, 14 ateliers sur les outils de sensibilisation ont été tenus en hors programmation par les régions du Centre (01), du Centre Nord (10), du Centre Ouest (1), du Sahel (01) et du Sud-Ouest (01). Aussi, dans le cadre de l'organisation des campagnes de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement les régions du Centre Nord et des Hauts Bassins ont organisé respectivement en hors programmation, 21 et 12 Campagnes de communications. L'inexistence de plan de communication du PN-AEUE pourrait expliquer les faibles réalisations des campagnes de communication au niveau national par les acteurs.

## a) Sensibilisation de masse

**Tableau 9:** Activités de sensibilisations de masse

Régions	Nombre d'émissions				Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100	
Boucle du Mouhoun	0	21	21		Eau, hygiène et Assainissement Entretien des latrines, lavage des mains
Cascades	2	2	1	50	Lavage des mains au savon et l'utilisation et l'entretien régulier des latrines ; mesures barrières contre la COVID 19
Centre	0				
Centre-Est	37	1	1	0	
Centre-Nord	0	3 652	3 652	0	Lavage des mains ; Hygiène de l'eau ; Collecte Transport stockage de l'eau ; Covid 19 ; Construction, utilisation et entretien de latrines
Centre-Ouest	6	6	0	100	L'arrêt de la FDAL ; L'importance d'une latrine familiale ; les bonnes pratiques d'hygiène pour le bien-être familial ; Les bonnes pratiques d'hygiène pour le bien-être familial ; Utilisation et entretien des ouvrages d'assainissement ; ATPC, une technique qui marche...
Centre-Sud	18	24	6	100	Entretien des latrines ; Gestion de l'eau potable ; Le lavage des mains ; La chaîne de l'eau ; Inconvénients de déféquer dans la nature et avantage d'avoir une latrine ; Voies de contamination et barrières des maladies hydriques
Est	775	505		65	
Hauts-Bassins	0	2	2		Nécessité d'une latrine normée ; FDAL
Nord	5	7	2	100	L'hygiène et l'assainissement ; Gestion hygiénique des menstrues ; Sensibilisations pour l'autoréalisation des latrines ; Redevabilité ; Hygiène des latrines
Plateau Central	411	90	0	22	
Sahel	0	14	14	-	Gestion des ouvrages d'assainissement Sensibilisation communautaires sur les bonnes pratiques d'hygiène
Sud-Ouest	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>1 254</b>	<b>4 324</b>	<b>3 699</b>	<b>50</b>	

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Sur une programmation révisée de 1 254 émissions entrant dans le cadre des activités de sensibilisation de masse, 4 324 des émissions ont été réalisées dont 3 699 en hors programmation. Ce nombre élevé des hors programmations dénote la non maîtrise des programmations des sensibilisations à travers les mass-

médias. Les principaux thèmes abordés sont la construction, l'utilisation et entretien de latrines ; l'hygiène et l'assainissement ; la gestion hygiénique des menstrues ; la chaîne de l'eau ; les voies de contamination et barrières des maladies hydriques ; l'ATPC... Ces émissions à travers les mass-médias ont permis de toucher des milliers de personnes sur l'étendue du territoire.

**b) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)**

**Tableau 10:** sensibilisation dans les ménages

Régions	Nombre de ménages touchés				Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100			
Boucle du Mouhoun	30 769	3 847	65	12	30 769	21 204	Lavage des mains, défécation à l'aire libre, entretien des latrines, Bonne utilisation des kits, hygiène des menstrues, hygiène corporelle et alimentaire ; gestion des déchets ; chaîne de l'eau potable
Cascades	800						
Centre	7 890	7 890	-	100	71 772	47 498	Utilisation et entretien des latrines, Hygiène ; Hygiène des mains et de l'eau
Centre-Est	36 602						
Centre-Nord	2 450	11 851	11 851		115 378	30 016	Bonnes pratiques EHA (lavage des mains, collecte transport stockage de l'eau, hygiène de l'eau et de la maison, COVID...); Entretien des latrines, la chaîne de l'eau, cadre de vie et AG; Utilisation, entretien des latrines, hygiène du milieu
Centre-Ouest	990				12 800	7 092	L'assainissement du cadre familial et l'arrêt de la défécation à l'air libre ; Construction, utilisation et entretien des latrines ; L'hygiène alimentaire de l'eau de boisson et du cadre de vie; Mesures barrières et de prévention contre la COVID-19
Centre-Sud	637	345	180	26	7 683	2 918	Bonnes pratiques de gestion des déchets solides et liquides ; Lavage des mains, entretien des latrines, gestion de l'eau potable ; Inconvénient de déféquer à l'air libre ; Avantage d'avoir une latrine, utilisation et entretien de la latrine
Est	7 349	12 630	5 281	100	145 769	101 932	Inconvénients de la DAL, Utilisation et entretien des latrines, lavage des mains et GHM ; Promotion de l'hygiène et l'assainissement ; Hygiène de l'eau ; Promotion de l'hygiène et l'assainissement en urgence ; Covid 19 (mesures barrières, hygiène); Choléra
Hauts-Bassins	-	635	635		2 707	1 536	le péril fécal ; l'utilisation et l'entretien des latrines ; la chaîne de l'eau
Nord	2 356	9 358	9 242	5	93 579	8 066	Gestion de l'eau de boisson ; Utilisation et entretien des latrines ; Avantage des latrines ; Inconvénient de la défécation à l'aire libre

Régions	Nombre de ménages touchés				Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100			
Plateau Central	85	827	742	100	8 270	3 640	
Sahel	2 747	4 877	2 375	91	63 647	31 186	Entretien des latrines, bonnes pratiques d'hygiène ; voix de contamination des maladies diarrhéiques ; Le lavage des mains avec de l'eau et le savon; Utilisation et entretien des latrines; La gestion et le stockage de l'eau; Gestion des déchets; Hygiène (Corporelle, alimentaire, de l'Habitat et vestimentaire)
Sud-Ouest	1 084	565	-	52	13 833	5 521	PHA; ATPC; GHM; Bonnes pratiques d'hygiène
<b>Total National</b>	<b>93 759</b>	<b>52 825</b>	<b>30 371</b>	<b>24</b>	<b>566 207</b>	<b>260 609</b>	

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Pour l'année 2021, des sensibilisations de proximité ont été réalisées sur diverses thématiques à savoir la bonne utilisation des kits, la gestion de l'hygiène menstruelle, corporelle et alimentaire; la gestion des déchets; la chaîne de l'eau potable ; la construction, l'utilisation et l'entretien des latrines ; Hygiène des mains et de l'eau ; les bonnes pratiques EHA (lavage des mains, collecte transport stockage de l'eau, hygiène de l'eau et de la maison, hygiène du milieu ; COVID 19); la promotion de l'hygiène et l'assainissement en urgence etc. Ces activités ont été conduites à travers des visites à domicile et des causeries débats regroupant différentes couches de la communauté en vue de renforcer le changement de comportement en faveur de l'hygiène et de l'assainissement.

Ces actions de communication pour le changement de comportement ont permis de toucher 52 825 ménages. Au total 566 207 personnes ont été touchées dont 260 609 femmes.



**c) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint**

**Tableau 11:** Sensibilisation de proximité dans les institutions

Régions	Nombre d'écoles touchées				Nombre de centres de santé touchés				Nombre de lieux publics			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors- programmation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors- programmation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors- programmation (c)	Taux (d)= (b- c)/a*100
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	-	-	-	17	16	9	41
Cascades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre	32	32	-	100	4	4	-	100	5	7	2	100
Centre-Est	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	55	45	45	-	-	22	22	-	221	221	-	100
Centre-Sud	38	38	38	-	-	-	-	-	-	12	12	-
Est	88	101	-	115	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	10	2	2	-	-	-	-	-	-	16	16	-
Sahel	25	26	-	104	-	-	-	-	-	66	66	-
Sud-Ouest	33	2	2	-	-	-	-	-	-	-	16	-
DGA	12	11	0	91,7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>322</b>	<b>259</b>	<b>87</b>	<b>53,4</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>243</b>	<b>338</b>	<b>121</b>	<b>89</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Les sensibilisations/communications de masse à travers la PHA dans les écoles, centre de santé et les espaces publics ont permis de toucher :

- 259 écoles sur une prévision de 322,
- 26 centres de santé sur une prévision de 4,
- 338 lieux publics (marchés, gares, lieux de cultes...) sur une prévision de 243.

Les taux d'exécution physique dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics sont respectivement de 53,4%, 100,0% et 89,0%.

Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ces campagnes de sensibilisations et ont porté entre autres sur :

- la promotion de l'hygiène et l'assainissement en milieu scolaire, sanitaire et public ;
- la construction, l'utilisation et l'entretien des latrines ;
- le lavage des mains au savon aux moments critiques ;
- la gestion hygiénique des menstrues ;
- les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans les centres de santé et l'entretien des ouvrages ;
- l'utilisation sécurisée de l'eau de boisson à domicile et en milieu scolaire ;
- la conservation des eaux de boissons ;
- la voie de contamination des maladies diarrhéiques ;
- l'assainissement total porté par les écoles (ATPE) ;
- l'hygiène corporelle, alimentaire et du milieu de vie.

**Tableau 12:** Sensibilisation/communication de masse : synthèse des institutions

Régions	Nbre d'écoles touchées	Nbre d'élèves touchés (a)	Nbre d'élèves filles touchées (a1)	Nbre de centres de santé touchés	Nbre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nbre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nbre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nbre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nbre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nbre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nbre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	-	7	1 690	726	1 690	726	Hygiène du cadre de vie ; Les voies et barrières en assainissement ; L'hygiène de l'eau de boisson Sensibilisation sur la construction de latrines
Cascades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Centre	32	553	265	4	38	15	7	52 581	19 500	53 172	19 780	
Centre-Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Centre-Nord	25	727	424	-	-	-	16	2 054	1 201	2 781	1 625	
Centre-Ouest	45	11511	6680	22	3868	2609	287	53 615	29 681	68 994	38 970	
Centre-Sud	38	3700	1887	-	-	-	12	1 761	990	5 461	2 877	
Est	101	31175	15882	-	-	-	-	-	-	31 175	15 882	Gestion hygiénique des menstrues ; Utilisation des latrines ; ATPE
Hauts-Bassins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nord	2	613	320	-	8734	6531	-	4 643	3 178	13 990	10 029	Lavage correcte des mains ; Utilisation et entretien des latrines; Riposte COVID-19; Mesures de prévention du Choléra
Plateau Central	2	315	160	155	-	-	16	475	285	790	445	
Sahel	26	8638	4285	-	-	-	61	19 460	10 101	28 098	14 386	Gestion des ouvrages d'assainissement et conservation des eaux de

Régions	Nbre d'écoles touchées	Nbre d'élèves touchés (a)	Nbre d'élèves filles touchées (a1)	Nbre de centres de santé touchés	Nbre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nbre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nbre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nbre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nbre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nbre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nbre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
												boissons Entretien des latrines, bonnes pratiques d'hygiène, voix de contamination des maladies diarrhéiques
Sud-Ouest	33	1854	919	-	-	-	-	-	-	1 854	919	
<b>Total National</b>	<b>304</b>	<b>59 086</b>	<b>30 822</b>	<b>181</b>	<b>12 640</b>	<b>9 155</b>	<b>406</b>	<b>136 279</b>	<b>65 662</b>	<b>208 005</b>	<b>105 639</b>	

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Les actions de communication pour le changement de comportement ont permis de toucher 59 086 élèves dont 30 822 filles. Les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Nord et des Hauts-Bassins n'ont enregistré aucune action de sensibilisation au profit des écoles de leur territoire.

La mise en œuvre de ces actions de sensibilisation ont permis en 2021, de toucher 208 005 personnes dont 105 639 femmes dans les lieux institutionnels et publics

Des efforts ont été fournis dans les différentes régions par les acteurs pour couvrir les lieux publics et institutionnels à travers les actions de sensibilisation de proximité mais les résultats demeurent insuffisants pour l'atteinte des objectifs escomptés.

**4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain**

**4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain**

**Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains**

**Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.**

**a) Formation et coordination**

Aucune activité menée pour cette action

### 4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)

#### 4.3.1. Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

**Produit 3.1.1** : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

**Tableau 13:** opérations pré-réalisation de latrines familiales

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC		
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)
Boucle du Mouhoun	-	-	-	10120	10120
Cascades	0	0	4 800	4 764	0
Centre	0	1	-	-	-
Centre-Est	-	2	-	-	-
Centre-Nord		2		1	
Centre-Ouest	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	11 000	17 000	6 000
Est		13	2435	2435	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0
Nord	0	0	-	14 309	14 309
Plateau Central	-	1	22 440	18 890	0
Sahel	-	-	38 500	38 708	208
Sud-Ouest	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>79 177</b>	<b>106 229</b>	<b>30 637</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Au cours de l'année 2021, 17 ateliers/séances de ciblage se sont déroulés. En effet, ces activités d'intermédiation sociale et d'Information Education Communication ont permis de toucher au total 106 229 personnes dont 30 637 en hors programmation soit un taux d'exécution physique de 95,5%. Notons que les régions du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest n'ont programmé ni réalisé aucune activité.

**Tableau 14:** Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural

Régions	Latrines						Toilettes		Total latrines		Puisards	Fosses septiques
	Latrines traditionnelles sans dalle en béton (a)	Latrines traditionnelle avec dalle en béton/Latrine SanPlat (b)	Latrines SanPlat améliorées (c)	VIP à une fosse (d)	VIP à double fosse (e)	Latrines Ecosan (f)	Toilette à chasse d'eau manuelle (g)	Toilette à chasse d'eau mécanique (h)	Homologuées (b+c+d+e+f+g+h)	Tout type (a+b+c+d+e+f+g+h)		
Boucle du Mouhoun	85	276	532	963	5	-	-	-	1 776	1 861	451	1
Cascades	-	108	1 059	163	-	-	-	2	1 332	1 332	10	2
Centre	1	928	427	73	-	105	-	-	1 533	1 534	206	-
Centre-Est	3	200	745	32	5	1	1	1	985	988	5	-
Centre-Nord	35	578	651	856	-	-	-	-	2 085	2 120	316	1
Centre-Ouest	831	1 198	2 417	276	1	3	-	-	3 895	4 726	1 286	2
Centre-Sud	1	1 405	1 436	446	1	141	-	-	3 429	3 430	388	-
Est	144	321	2 002	395	39	-	3	1	2 761	2 905	420	-
Hauts-Bassins	17	334	600	338	1	-	-	-	1 273	1 290	16	2
Nord	8	400	1 316	25	5	-	-	-	1 746	1 754	90	-
Plateau Central	1	222	14	220	9	22	1	-	488	489	7	-
Sahel	41	420	530	-	-	-	-	-	950	991	-	-
Sud-Ouest	9	128	655	475	1	1	-	45	1 305	1 314	59	36
<b>Total National</b>	<b>1 176</b>	<b>6 518</b>	<b>12 384</b>	<b>4262</b>	<b>67</b>	<b>273</b>	<b>5</b>	<b>49</b>	<b>23 558</b>	<b>24 734</b>	<b>3 254</b>	<b>44</b>

Source : BD INOA, 2021

En 2021, l'inventaire national des ouvrages d'assainissement a permis de dénombrer 24 734 latrines tous types confondus réalisées en milieu rural. Il est noté une baisse de 16 660 latrines par rapport à 2020. Cette baisse significative pourrait s'expliquer par des difficultés de collecte dans certaines zones où la situation sécuritaire est précaire.

Concernant les latrines homologuées, l'ensemble des réalisations se dénombre à 23 558 latrines familiales. Elles sont constituées majoritairement de latrines Sanplat améliorées (52,6%). Les plus grandes réalisations de latrines Sanplat s'observent dans les régions du Centre-Ouest (2 417), de l'Est (2 002), du

Centre-Sud (1 436), du Nord (1 316) et des Cascades (1 059). Ceci s'explique entre autres par la mise en œuvre de projets de promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans ces régions.

Par ailleurs 1 176 latrines traditionnelles sans dalles en béton ont été réalisées par les ménages grâce à la mise en œuvre de l'ATPC. La grande part de ces réalisations a été faite dans la région du Centre-Ouest (831). Ce résultat pourrait s'expliquer par l'engagement et la volonté des communautés à arrêter la défécation à l'air libre.



**Tableau 15:** Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

Régions	Latrines traditionnelle avec dalle en béton/Latrine SanPlat (a)	Latrines SanPlat améliorées (b)	VIP à une fosse (c)	VIP à double fosse (d)	Ecosan (e)	Toilette à chasse d'eau manuelle (f)	Toilette à chasse d'eau mécanique (g)	Total latrines homologuées (a+b+c+d+e+f+g)
Boucle du Mouhoun	2	8	1	0	0	0	0	11
Cascades	1	1	0	0	0	0	0	2
Centre	26	17	19	0	0	0	0	62
Centre-Est	5	12	0	0	1	0	0	18
Centre-Nord	52	5	0	0	0	0	0	57
Centre-Ouest	3	8	0	0	0	0	0	11
Centre-Sud	0	9	1	0	0	0	0	10
Est	8	15	6	2	0	0	0	31
Hauts-Bassins	2	1	0	0	0	0	0	3
Nord	4	0	0	0	0	0	0	4
Plateau Central	59	0	1	0	0	0	0	60
Sahel	2	13	0	0	0	0	0	15
Sud-Ouest	1	0	2	0	0	0	0	3
<b>Total National</b>	<b>165</b>	<b>89</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287</b>

Source : BD INOA, 2021

Au total 287 latrines familiales ont été réhabilitées en milieu rural dont environ 21,6%, 19,9% et 20,9% respectivement dans les régions du Centre, du Centre-Nord et du Plateau Central. Les réhabilitations ont permis d'améliorer le niveau de service/sécurité de 165 latrines traditionnelles en latrines homologuées.

**Tableau 16 :** Situation des latrines semi-finies

Régions	Boucle du Mouhoun	Cascades	Centre	Centre-Est	Centre-Nord	Centre-ouest	Centre-Sud	Est	Hauts-Bassins	Nord	Plateau Central	Sahel	Sud-Ouest	Total
<b>Nombre</b>	896	3	979	534	281	651	944	1077	2	956	823	607	574	<b>8 327</b>

Source : BD INOA, 2021

Au cours de l'année, 8 327 latrines semi-finies ont été recensées. Comparativement à l'année 2020 (9 012 latrines semi finies), ce nombre a connu une baisse de 685 latrines.

Les nombres de latrines semi-finies sont assez élevés dans la majorité des régions contrairement dans les cascades et dans les Hauts Bassins qui sont respectivement 3 et 2 latrines semi-finies. Les acteurs des régions sont donc invités à redoubler d'effort dans la sensibilisation des ménages pour l'achèvement des latrines semi-finies.

**Tableau 17:** Situation de réalisation et de réhabilitation de latrines familiales

Régions	Latrines familiales					Réhabilitations				
	Program-mation révisée (a)	Réalizations				Program-mation révisée (a)	Réalizations			
		Issue de la program - mation (b)	Hors program - mations (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %		Issue de la program - mations (b)	Hors program - mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
<b>Boucle du Mouhoun</b>	9 055	1 765	0	1 765	19,5	110	11	0	11	10,0
<b>Cascades</b>	1 200	1 200	130	1 330	100,0	0	0	2	2	-
<b>Centre</b>	1 596	1 471	0	1 471	92,2	0	0	62	62	-
<b>Centre-Est</b>	3 190	967	0	967	30,3	0	0	18	18	-
<b>Centre-Nord</b>	4 596	2 028	0	2 028	44,1	0	0	57	57	-
<b>Centre-Ouest</b>	3 228	3 228	656	3 884	100,0	0	0	11	11	-
<b>Centre-Sud</b>	11 690	3 419	0	3 419	29,2	0		10	10	-
<b>Est</b>	5 990	2 730	0	2 730	45,6	0	0	31	31	-
<b>Hauts-Bassins</b>	1 701	1 270	0	1 270	74,7	230	3		3	1,3
<b>Nord</b>	2 540	1 742	0	1 742	68,6	69	4		4	5,8
<b>Plateau Central</b>	3 067	428	0	428	14,0	0	0	60	60	-
<b>Sahel</b>	2 475	935	0	935	37,8	0	0	15	15	-
<b>Sud-Ouest</b>	2 080	1 302	0	1 302	62,6	0	0	3	3	-
<b>Total National</b>	<b>52 408</b>	<b>22 485</b>	<b>786</b>	<b>23 271</b>	<b>42,9</b>	<b>409</b>	<b>18</b>	<b>269</b>	<b>287</b>	<b>4,4</b>

Source : BD INOA, 2021

Sur une programmation révisée de 52 408 latrines en 2021, les réalisations sont de 22 485 latrines familiales soit un taux de 42,9%. Ce taux est inférieur à celui de 2020 qui était de 60,9% avec une réalisation annuelle issue de la programmation de 35 656. Cela pourrait s'expliquer par le contexte sécuritaire difficile du pays.

En outre, les régions des Cascades et du Centre-Ouest enregistrent un taux d'exécution de 100% et sont suivies de celle du Centre avec un taux de 92,2%. Les régions des Hauts Bassins, du Nord et du Sud-Ouest ont un taux variant de 60 à 74%. Les régions de l'Est, du Centre-Nord, du Sahel, du Centre-Est, du Centre-Sud, ont un taux d'exécution physique inférieurs à 50%. Les faibles taux d'exécution physique sont observés dans les régions de la Boucle du Mouhoun et du Plateau Central. Ces taux pourraient être liés à des erreurs de programmation et au retard accusé pour l'exécution des fonds transférés dans certaines communes.

Le taux d'exécution physique des réhabilitations des latrines est de 4,4% avec seulement 18 latrines réalisées sur 409 programmées. Ce faible taux est lié entre autres à des problèmes administratifs au niveau de la commune de Houndé dans la région des Hauts-Bassins (pas d'ordonnateur de budget au sein de la mairie), aux défis sécuritaires pour le Nord et la Boucle du Mouhoun. Au vu du nombre élevé des réhabilitations hors programmation (269), les acteurs doivent s'investir plus lors des programmations révisées.

**Tableau 18:** Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques

Régions	Puisards					Fosses septiques				
	Program-mation révisée (a)	Réalisations				Program-mation révisée (a)	Réalisations			
		Issue de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %		Issue de la program - mation (b)	Hors program - mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
<b>Boucle du Mouhoun</b>	2 596	451	0	451	17,4	-	-	1	1	-
<b>Cascades</b>	0	0	10	10	-	-	-	2	2	-
<b>Centre</b>	546	206	0	206	37,7	-	-	0	0	-
<b>Centre-Est</b>	160	5	0	5	3,1	-	-	0	0	-
<b>Centre-Nord</b>	272	272	44	316	100,0	-	-	1	1	-
<b>Centre-Ouest</b>	1 341	1286	0	1286	95,9	-	-	2	2	-
<b>Centre-Sud</b>	3 215	388	0	388	12,1	-	-	0	0	-
<b>Est</b>	1 034	420	0	420	40,6	-	-	0	0	-
<b>Hauts-Bassins</b>	100	16	0	16	16,0	-	-	2	2	-
<b>Nord</b>	203	90	0	90	44,3	-	-	0	0	-
<b>Plateau Central</b>	0	0	7	7	-	-	-	0	0	-
<b>Sahel</b>	18	0	0	0	0	-	-	0	0	-
<b>Sud-Ouest</b>	0	0	59	59	-	-	-	36	36	-
<b>Total National</b>	<b>9 485</b>	<b>3 134</b>	<b>120</b>	<b>3 254</b>	<b>33,0</b>	-	-	<b>44</b>	<b>44</b>	-

Source : BD INOA 2021

En matière de gestion des eaux usées, 3 254 puisards ont été réalisés soit un taux d'exécution de 33,0%. Aussi, la réalisation de 44 fosses septiques en hors programmation a été enregistrée dans 6 régions. Cela traduit une bonne performance comparativement à l'année 2020 durant laquelle 2 751 puisards et 13 fosses septiques avaient été réalisés. Cependant, ce nombre reste insuffisant par rapport aux besoins pour assurer une meilleure gestion des eaux usées. Cela interpelle les acteurs à redoubler d'efforts dans la réalisation des ouvrages de gestion des eaux usées.

**Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur**

**Tableau 19:** opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC		
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-
Cascades	0	0	0	619	619
Centre	-	1	-	-	-
Centre-Est	0	0	5	5	0
Centre-Nord	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	-	-	-	-	-
Centre-Sud	-	-	-	-	-
Est	0	35	781	781	0
Hauts-Bassins	1	-	-	-	-
Nord	-	-	-	-	-
Plateau Central	-	1	-	-	-
Sahel	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>786</b>	<b>1405</b>	<b>619</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

En 2021, une étude de pré-réalisation de latrines institutionnelles a été menée dans la commune de Kourouma, dans les Hauts Bassins. Des ateliers/séances de ciblage ont été organisés dans 3 régions et ont permis de toucher 1 405 personnes.

**Tableau 20:** Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation

Régions	Nombre total de blocs de latrines	Nombre total de blocs de latrines réservées aux filles	Nombre total de blocs de latrines réservées aux enseignants	Nombre de cabines pour gestion des menstrues	Nombre de cabines réservées aux handicapés
Boucle du Mouhoun	67	7	14	0	7
Cascades	24	3	5	6	4
Centre	54	5	4	2	10
Centre-Est	47	9	9	1	6
Centre-Nord	114	29	15	8	31
Centre-Ouest	73	11	12	0	5
Centre-Sud	39	6	4	11	11
Est	109	32	25	21	42
Hauts-Bassins	32	0	5	0	1
Nord	77	17	18	2	24
Plateau Central	34	5	12	0	5
Sahel	6	0	0	0	0
Sud-Ouest	28	6	7	3	4
<b>Total National</b>	<b>704</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>54</b>	<b>150</b>

Source : BD INOA 2021

**Tableau 21:** Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles

Régions	Latrines neuves					Latrines à réhabiliter				
	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total e= b+d	Taux (b/a*100)		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total e= b+d	Taux (b/a*100)
<b>Boucle du Mouhoun</b>	28	28	36	64	100,0	0	0	3	3	-
<b>Cascades</b>	29	21	0	21	72,4	50	3	0	3	6,0
<b>Centre</b>	25	25	28	53	100,0	0	0	1	1	-
<b>Centre-Est</b>	14	14	33	47	100,0	0	0	0	0	-
<b>Centre-Nord</b>	287	89	0	89	31,0	0	0	25	25	-
<b>Centre-Ouest</b>	17	17	45	62	100,0	16	11	0	11	68,8
<b>Centre-Sud</b>	53	39	0	39	73,6	0	0	0	0	-
<b>Est</b>	160	99	0	99	61,9	28	10	0	10	35,7
<b>Hauts-Bassins</b>	20	20	12	32	100,0	2	0	0	0	0
<b>Nord</b>	57	57	20	77	100,0	2	0	0	0	0
<b>Plateau Central</b>	47	34	0	34	72,3	-	-	-	-	-
<b>Sahel</b>	16	6	0	6	37,5	-	-	-	-	-
<b>Sud-Ouest</b>	34	28	0	28	82,4	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>787</b>	<b>477</b>	<b>174</b>	<b>651</b>	<b>60,6</b>	<b>98</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>24,5</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Sur une programmation révisée de 787 blocs de latrines scolaires, 477 ont été recensées lors de la collecte, soit un taux de réalisation de 60,6% inférieur à celui de 2020 (62,9%). Ce taux de réalisation varie entre 31,0% et 100%. Six (06) régions ont un taux de 100% et deux (2) régions (le Centre-Nord et le Sahel) ont des taux inférieurs à 50%. Cela pourrait s'expliquer par la dégradation sécuritaire accentué dans ces zones qui a occasionné la fermeture des écoles.

Par ailleurs, 174 blocs de latrines ont été réalisés en hors programmation, portant l'ensemble des réalisations dans les écoles à 651 blocs.

Sur les 651 blocs, 130 sont réservés aux filles soit 20,0% des réalisations, et 54 cabines sont aménagées pour la gestion hygiénique des menstrues. Ces infrastructures, adaptées aux besoins spécifiques des filles, visent à créer un environnement adéquat leur permettant de gérer les menstrues en toute intimité et en toute sécurité. Ces initiatives sont à multiplier par les acteurs dans un contexte d'approche fondée sur les droits humains.

Au titre des réhabilitations, 24 blocs de latrines sont réalisés dans les régions des Cascades, du Centre-Ouest et de l'Est sur une prévision de 98 blocs de latrines soit un taux de réalisation de 24,5%. En outre, 29 réhabilitations ont été faites hors programmation dans 3 régions, portant à 53 le nombre de blocs réhabilités.

L'ensemble des réalisations et des réhabilitations ont permis de mettre à disposition des écoles 704 blocs de latrines fonctionnels, ce qui contribuera à accroître le niveau d'équipement des établissements scolaires au Burkina Faso.

**Tableau 22:** Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé

Régions	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
<b>Boucle du Mouhoun</b>	48	39	0	39	81,3	-	-	-	-	-
<b>Cascades</b>	15	15	0	15	100,0	-	-	-	-	-
<b>Centre</b>	8	8	6	14	100,0	0	0	1	1	-
<b>Centre-Est</b>	1	1	9	10	100,0	1	0	0	0	0
<b>Centre-Nord</b>	1	1	29	30	100,0	-	-	-	-	-
<b>Centre-Ouest</b>	14	14	9	23	100,0	-	-	-	-	-
<b>Centre-Sud</b>	0	0	16	16	-	-	-	-	-	-
<b>Est</b>	5	5	12	17	100,0	14	8	8	57,1	
<b>Hauts-Bassins</b>	18	18	17	35	100,0	2	0	0	0,0	
<b>Nord</b>	20	15	0	15	75,0	13	1	1	7,7	
<b>Plateau Central</b>	7	7	23	30	100,0	-	-	-	-	-
<b>Sahel</b>	0	0	7	7	-	-	-	-	-	-
<b>Sud-Ouest</b>	9	9	12	21	100,0	0	0	2	2	-
<b>Total National</b>	<b>146</b>	<b>132</b>	<b>140</b>	<b>272</b>	<b>90,4</b>	<b>30</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>30,0</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Au niveau des centres de santé, le bilan est assez satisfaisant pour les nouvelles réalisations. En effet, 272 blocs de latrines ont été construits sur l'ensemble du territoire. En outre, on enregistre un taux d'exécution de 90,4% supérieur au taux de l'année passée qui est de 78,9%. Hormis les régions de la Boucle du Mouhoun et du Nord, toutes les autres régions ayant prévu des réalisations ont enregistré des taux d'exécution de 100%. Les réalisations hors programmations sont évaluées à 140 blocs de latrines.

Concernant les réhabilitations, 12 blocs ont été réhabilités dont 9 issu de la programmation sur 30 prévus, soit un taux de 30%.

**Tableau 23:** Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics

Régions	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
<b>Boucle du Mouhoun</b>	42	42	0	42	100,0	0	0	1	1	0
<b>Cascades</b>	3	3	10	13	100,0	-	-	-	-	-
<b>Centre</b>	13	13	16	29	100,0	0	0	1	1	0
<b>Centre-Est</b>	20	20	9	29	100,0	-	-	-	-	-
<b>Centre-Nord</b>	163	46	0	46	28,2	-	-	-	-	-
<b>Centre-Ouest</b>	11	11	1	12	100,0	-	-	-	-	-
<b>Centre-Sud</b>	7	7	9	16	100,0	-	-	1	1	0
<b>Est</b>	52	22	0	22	42,3	-	-	5	5	0
<b>Hauts-Bassins</b>	2	2	12	14	100,0	-	-	2	2	0
<b>Nord</b>	9	9	6	15	100,0	-	-	-	-	-
<b>Plateau Central</b>	13	13	2	15	100,0	-	-	-	-	-
<b>Sahel</b>	0	0	10	10	-	-	-	-	-	-
<b>Sud-Ouest</b>	2	2	21	23	100,0	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>337</b>	<b>190</b>	<b>96</b>	<b>286</b>	<b>56,4</b>	-	-	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

Source : rapports bilan régionaux

Dans les lieux publics (lieux de culte, gare routière, marchés, yaars, etc.), 286 blocs de latrines ont été réalisés dont 96 blocs issus de la programmation. Le taux d'exécution évalué à 56,4% est moins satisfaisant que celui de l'an dernier qui était de 77,9%. L'ensemble des régions ayant fait des programmations

ont des taux d'exécution de 100% sauf les régions de l'Est et du Sahel. Le nombre de blocs réalisés en hors programmation (156) est supérieur à celui issu des ouvrages prévus (86), d'où la nécessité d'améliorer la programmation des activités par l'ensemble des acteurs. Par ailleurs, 10 blocs de latrines ont été réhabilités dans les lieux publics en hors programmation dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre-Sud, de l'Est et des Hauts-Bassins, sur une programmation révisée nulle.



## **BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRES)**

Le Burkina Faso connaît actuellement l'une des crises les plus préoccupantes de son histoire à laquelle vient s'ajouter la pandémie de la COVID-19. En effet, Le nombre de PDI est passé de 1 074 993 au 31 décembre 2020 à 1 579 976 au 31 décembre 2021 ; soit une augmentation de 47%. Par ailleurs, 2,2 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire en eau, hygiène et assainissement qui sont des besoins élémentaires vitaux nécessaires pour assurer leur survie. Les femmes et les enfants sont les plus exposées au manque d'assainissement et d'hygiène dans cette situation. Cinq (05) régions que sont le Sahel, le Nord, l'Est, le Centre-Nord et la Boucle du Mouhoun sont les plus touchées. Dans ce contexte sécuritaire et sanitaire délétère, l'Etat et ses partenaires (PTF et ONG) se mobilisent tant bien que mal pour venir en aide aux PDI et aux populations hôtes. C'est ainsi que le cluster WASH urgence (groupe des acteurs humanitaires pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement) a été activé et coordonné par l'UNICEF en collaboration avec le MEA. Au sein de ce cluster on compte plusieurs ONG et associations qui sont les acteurs opérationnels. Il est mis en place des sous-groupes cluster à savoir le sous cluster eau potable et le sous cluster hygiène et assainissement, le tout coordonné par le cluster général WASH. Le lead du sous cluster assainissement et hygiène est assuré par la DGA en collaboration avec la croix rouge burkinabè et Oxfam. Dans les 5 régions, la coordination se fait autour des Directions régionales en collaboration avec les bureaux régionaux de l'Unicef.

Dans le but de capitaliser les informations sur les réalisations faites au profit des PDI dans les régions touchées, une fiche de collecte relative à la situation d'urgence a été associée à celles de la collecte INOA déroulée annuellement par la DGA. Le tableau ci-après fait état de ces réalisations.

**Tableau 24** : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI

Régions	Boucle du Mouhoun	Cascades	Centre	Centre-Est	Centre-Nord	Centre-Ouest	Centre-Sud	Est	Hauts-Bassins	Nord	Plateau Central	Sahel	Sud-Ouest	Total National
<b>Latrines</b>	758	0	0	0	550	0	0	756	0	300	0	174	0	<b>2538</b>
<b>Puisards</b>	700	0	0	0	350	0	0	317	0	0	0	23	0	<b>1390</b>
<b>Fosses septiques</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Le présent tableau fait seulement l'état des réalisations faites au profit des ménages hôtes de régions touchées. En effet, 2538 latrines et 1390 puisards ont été réalisés dans 11 régions au profit des ménages d'accueil des PDI.

**Tableau 25** : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI

Régions	Cabines-latrines	Nombre de cabines-latrines pour handicapé	Nombre total de cabines-douches	Nombre de cabines-douches pour handicapé
<b>Boucle du Mouhoun</b>	18	0	18	0
<b>Cascades</b>	0	0	0	0
<b>Centre</b>	0	0	0	0
<b>Centre-Est</b>	0	0	0	0
<b>Centre-Nord</b>	100	0	75	0
<b>Centre-Ouest</b>	0	0	0	0
<b>Centre-Sud</b>	0	0	0	0
<b>Est</b>	0	0	0	0
<b>Hauts-Bassins</b>	0	0	0	0
<b>Nord</b>	179	0	0	0
<b>Plateau Central</b>	0	0	0	0
<b>Sahel</b>	195	0	0	0
<b>Sud-Ouest</b>	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Cette année, 492 cabines-latrines et 93 cabines-douches ont été réalisées au profit des populations déplacées internes. Ces chiffres sont inférieurs à ceux de 2020 qui sont de 1 569 cabines-latrines et 399 cabines-douches. On constate que seulement 4 régions, touchées par l'insécurité, connaissent des réalisations d'ouvrages.

**Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural**

a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement

b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions

**Tableau 26:** Formation et suivi

Régions	Nombre d'acteurs formés sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur les autres formations entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement	Nombre total d'acteurs formés	Nombre total de femmes formées	Nombre de centres de santé dont l'entretien et la maintenance des latrines sont confiés à un gestionnaire
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	-
Cascades	34	59	0	59	36	0
Centre	-	-	-	-	-	-
Centre-Est	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	-	-	-	-	-	-
Est	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	-	-	-	-	-	-
Nord	0	30	0	30	13	0
Plateau Central	-	-	-	-	-	-
Sahel	0	0	2	50	21	0
Sud-Ouest	-	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>34</b>	<b>89</b>	<b>2</b>	<b>139</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

En 2021, les activités de formation et suivi de la gestion des latrines se sont concentrées uniquement sur 3 régions. En effet, dans la région des Cascades, 34 acteurs (responsable de centres de santé et COGES) ont été formés sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement par le projet SANIYA-SO+. Aussi, dans le cadre du suivi et l'entretien des ouvrages d'assainissement, le projet SANIYA-SO+ et l'association MUNYU ont formé respectivement 34 et 25 acteurs (COGES et agents de nettoyage) sur les thèmes « gestion durable des infrastructures », « équipement WASH, technique de bio nettoyage » et « gestion hygiénique des menstrues et entretien des latrines ».

Dans la région du Nord, 03 formations ont été réalisées au profit des comités de Gestion de latrines dans les communes de Ouahigouya (02) et Barga (01). Ces formations ont été réalisées par Solidarité Internationale sur les techniques de réalisation et de gestion des latrines au profit des déplacées Internes (PDI).

L'ONG NRC a formé 50 acteurs dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement au cours de cette année dans la région du Sahel.

### c) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement

En ce qui concerne la gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics, la DREA Centre-Sud a recruté un Bureau d'Etudes dans le cadre de la mise en œuvre des activités d'IEC pour la réalisation de 17 blocs de latrines institutionnelles dans la région. Au cours de ces activités, les élèves et le personnel enseignant de 05 établissements scolaires ont été sensibilisé sur la gestion des latrines dans les écoles.

La DREA Plateau-Central a fait l'état des lieux de la construction des superstructures des latrines semi finies par les bénéficiaires et réalisé des séances de sensibilisation au profit des bénéficiaires de ces ouvrages.

Dans la région du sahel, l'ONG DRC a formé des brigades d'hygiène composées de 1 320 hommes et 1 340 femmes à Gorgadji et Sebba pour la gestion et l'entretien des latrines sur les sites de PDI. Aussi, plusieurs acteurs ont distribué 3 226 kits au profit des populations vulnérables/PDI en cette année.

### d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques

**Tableau 27** : latrines suivies dans le cadre de leur gestion

Régions	Nombre de latrines confiées à un gestionnaire				Institutions abritant les latrines	Types de latrines	Mode de gestion	Acteurs responsables du suivi	Observations
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100					
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cascades	16	0	0	0	Centre de sante	VIP multi-fosses	Délégué	COGES	
Centre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Est	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	4						Régie		
Nord	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plateau Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sahel	19	19	3	100		Semi-durable d'urgence et VIP			
Sud-Ouest	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>39</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>48,7</b>	-	-	-	-	-

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Courant 2021, dans le cadre de l'entretien et la gestion des latrines, le projet SANIYA SO+ accompagne 16 centres de santé dans la région des Cascades en vue de déléguer la gestion de leurs latrines à un opérateur privé. Dans la région des Hauts-Bassins, la commune de Houndé n'a pu confier ses latrines à un gestionnaire par manque d'ordonnateur de budget, tandis que le prestataire de la commune de Djigouéra a

désisté pour la non rentabilité de l'activité. L'ONG DRC a mis en place des brigades d'hygiène, dans la région du Sahel, pour la gestion de 19 latrines sur site d'accueil de PDI. La commune de Sampelga dans la région du Sahel a confié la gestion de 02 blocs de latrine de la gare routière et 01 bloc de latrine du service départemental de l'environnement à un gestionnaire. Au total, ce sont 22 blocs de latrines qui ont été confiés à des gestionnaires.

#### **e) L'intercommunalité**

Aucune activité n'a été enregistrée en 2021.

#### **f) Suivi de la mise en œuvre du guide ImS AEUE en milieu rural**

Au cours de l'année 2021, la DREA Centre-Sud a recruté un Bureau d'Etudes pour la mise en œuvre de l'IEC dans le cadre de la réalisation de latrines familiales et de latrines institutionnelles. Des animateurs ont été déployés sur le terrain notamment dans les villages des communes bénéficiaires de latrines familiales et institutionnelles des années 2021, 2020 et 2019. Il faut noter que l'IEC se fait selon la mise en œuvre du guide ImS AEUE. Lors de ces activités, les agents de la DREA-CSD assure le suivi de ses activités sur le terrain pour garantir une bonne mise en œuvre et faciliter aussi l'évaluation du Bureau d'Etude.

La DREA-SHL a coordonné et supervisé les activités entrant dans le cadre de ses deux campagnes d'ImS/IEC organisées en cette année.

#### **g) Autres activités non énumérées**

Dans la région du Sahel, l'ONG OXFAM a formé 50 relais communautaires et mis en place 10 comités EHA à Gorom-gorom, Bani et Dori.

#### 4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)

##### 4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

**Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur**

**Tableau 28:** Réalisations de latrines familiales en milieu urbain

Régions	Latrines familiales réalisées				Latrines familiales réhabilitées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	910	746		82%				
Cascades	575	315		55%				
Centre	11 000	11 297		103%				
Centre-Est	1 350	926		69%				
Centre-Nord	710	823		116%				
Centre-Ouest	830	758		91%				
Centre-Sud	855	-		0%				
Est	500	623		125%				
Hauts-Bassins	6 185	2 723		44%				
Nord	775	959		124%				
Plateau Central	885	251		28%				
Sahel	180	-		0%				
Sud-Ouest	245	74		30%				
<b>Total National</b>	<b>25 000</b>	<b>19 495</b>		<b>78%</b>				

Source : ONEA, 2021

Les résultats annuels sont dans l'ensemble moyennement satisfaisants. Seules les régions du Sud-Ouest (38%), du sahel (0%), du Plateau Central (28%), des Hauts Bassins (44%) et Centre Sud (0%) se retrouvent avec un taux de réalisation de latrines particulièrement bas. Les régions des Cascades, du Centre Est, de la Boucle du Mouhoun et du Centre Ouest sont au-dessus de la moyenne avec respectivement 55% ,69%, 82% et 91%. Enfin les régions du Centre, de l'Est, Centre Nord et du Nord culminent avec respectivement des taux de 103%, 124%, 116%et 125%.

Par rapport aux objectifs annuels 2021, les résultats enregistrés correspondent à un taux global de 78% (19 450 réalisations sur 25 000 prévues).

**Tableau 29:** Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain

Régions	Puisards domestiques				Fosses septiques			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	560	684		122%	-	-	-	-
Cascades	350	293		84%	-	-	-	-
Centre	7 700	5 522		72%	-	-	-	-
Centre-Est	940	545		58%	-	-	-	-
Centre-Nord	455	754		166%	-	-	-	-
Centre-Ouest	565	617		109%	-	-	-	-
Centre-Sud	185	-		0%	-	-	-	-
Est	350	288		82%	-	-	-	-
Hauts-Bassins	4 290	3 000		70%	-	-	-	-
Nord	540	905		168%	-	-	-	-
Plateau Central	400	254		64%	-	-	-	-
Sahel	25	-		0%	-	-	-	-
Sud-Ouest	120	38		32%	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>16 480</b>	<b>12 900</b>		<b>78%</b>	-	-	-	-

Source : ONEA, 2021

Les résultats annuels sont dans l'ensemble satisfaisants. Seules les régions du Sud-Ouest (32%), du sahel (0%) et Centre Sud (0%) se retrouvent avec un taux de réalisation de latrines particulièrement bas. Les régions du Centre Est, des Hauts Bassins, du Centre, de l'Est et des Cascades sont au-dessus de la moyenne avec respectivement 58%, 64%, 70%, 72%, 82% et 84%. Enfin les régions du Plateau Central, du Centre Ouest, de la Boucle du Mouhoun, du Centre Nord et du Nord culminent avec respectivement des taux de 109%, 122%, 166% et 168%.

Par rapport aux objectifs annuels 2021, les résultats enregistrés correspondent à un taux global de 78% (12 900 réalisations sur 16 480 prévues). Quelques difficultés et contraintes ont perturbé la bonne conduite des activités et empêché l'atteinte des objectifs. Il s'agit :

- du retard de paiement des factures des préfabriquants entraînant l'arrêt de la préfabrication dans certaines zones, notamment dans les villes PAEA/PforR (cette situation s'est améliorée au cours du second semestre);
- du retard dans la livraison de la subvention en portes et tôles dans certaines villes ;
- de la suspension des activités dans certaines villes (Tougan, Sabou et les villes AFD) ;
- de la défection des maçons dans certaines zones ;
- du coût très élevé de la main d'œuvre des maçons dans certaines zones.

**Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur**

**Tableau 30:** Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation

Régions	Réalisations						Réhabilitations					
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	12	3				25%						
Cascades	8	1				13%						
Centre	22	48				218%						
Centre-Est	8	3				38%						
Centre-Nord	8	-				0%						
Centre-Ouest	13	-				0%						
Centre-Sud	7	-				0%						
Est	1	-				0%						
Hauts-Bassins	14	13				93%						
Nord	9	-				0%						
Plateau Central	8	-				0%						
Sahel	1	-				0%						
Sud-Ouest	6	4				67%						
<b>Total National</b>	<b>117</b>	<b>72</b>				<b>62%</b>						

Source : ONEA, 2021

La non-atteinte des résultats s'explique par le retard dans les procédures de passation des marchés.



**Tableau 31:** Réalisations de latrines dans les lieux publics

Régions	Réalisations				Réhabilitations			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	11	6		55%				
Cascades	6	6		100%				
Centre	18	67		372%				
Centre-Est	9	14		156%				
Centre-Nord	8	7		88%				
Centre-Ouest	10	-		0%				
Centre-Sud	7	-		0%				
Est	1	14		1400%				
Hauts-Bassins	11	10		91%				
Nord	9	2		22%				
Plateau Central	8	2		25%				
Sahel	1	2		200%				
Sud-Ouest	4	1		25%				
<b>Total National</b>	<b>103</b>	<b>131</b>		<b>127%</b>				

Source : ONEA, 2021

Au cours de l'année cent trente un (131) ouvrages d'assainissement communautaires ont été réalisés et réceptionnés sur un total de cent trois (103) ouvrages attendus soit un taux de réalisation de 127%. Le taux de réalisation est plus que satisfaisant.

**Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain**

- a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement
- b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions
- c) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement
- d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques
- e) L'intercommunalité
- f) Autres activités non énumérées

#### **4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

##### **4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

###### **Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée**

Dans la Région des Cascades une rencontre de concertation avec les acteurs de la filière de l'assainissement a été tenue sur le thème « Restitution de l'étude sur les conditions des travailleurs de l'assainissement au Burkina Faso, cas des vidangeurs manuel ». La rencontre a été organisée par la DREA en collaboration avec WaterAid.

**Tableau 32 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges**

Régions	vidangeurs manuels recensés		vidangeurs mécaniques recensés		vidangeurs professionnels recensés		Existence d'association de vidangeurs (1=oui ; 2=non) recensés	association de vidangeurs organisées		Quantité de boues collectées (m <sup>3</sup> )	Quantité de boues traitées (m <sup>3</sup> )	Quantité de boues valorisées
	Nouveaux	Total existant	Nouveaux	Total existant	Nouveaux	Total existant		Nouvelles	Total existant			
<b>Boucle du Mouhoun</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cascades</b>	0	8	0	0	0	0	0	0	0	381116	381116	0
<b>Centre</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Centre-Est</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Centre-Nord</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Centre-Ouest</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Centre-Sud</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Est</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hauts-Bassins</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61907	61907	0
<b>Nord</b>	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0
<b>Plateau Central</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sahel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sud-Ouest</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	443023	443023	<b>0</b>

Source : rapports bilan régionaux, ONEA 2021

Au cours de cette année 2021, 03 vidangeurs professionnels et une association de vidangeurs ont été identifiés dans la ville de Ouahigouya dans la région du Nord. Aussi, dans la région des Cascades, 08 vidangeurs manuels ont été recensés et formés. Aussi, 443 023 m<sup>3</sup> de boue ont été collectés et traités. La région du Centre-Nord n'a enregistré aucune activité réalisée malgré sa prévision d'organiser 16 groupements de vidangeurs.

**Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur**

**Tableau 33** : développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif

Régions	Etudes diagnostiques	Nouvelles STBV réalisées	Nouvelles STEP réalisées	Nombre de nouveaux sites de dépotage des boues de vidange identifiés		Nombre nouveaux de site de dépotage des boues de vidange aménagés	
				Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
Boucle du Mouhoun							
Cascades							
Centre	2						
Centre-Est							
Centre-Nord							
Centre-Ouest							
Centre-Sud							
Est							
Hauts-Bassins	1						
Nord							
Plateau Central							
Sahel							
Sud-Ouest							
<b>Total National</b>	<b>3</b>						

Source : ONEA, 2021

Le bureau d'étude SEURECA VEOLIA mène une étude diagnostics afin de déceler les disfonctionnements et proposer des solutions pour remettre à niveau les stations de traitement de boues de vidange existantes : Zagtouli, Kossodo et Sourgoubila.

**Tableau 34**: Extension du réseau collectif

Villes	Réseau d'assainissement collectif (Km)			Raccordés au Réseau collectif (Nbre)		
	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %
Ouagadougou	-	-	-	100	10	10
Bobo-Dioulasso	-	-	-			
Total	-	-	-	100	10	10

Source : ONEA, 2021

### Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal

- 1) Former des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement

**Tableau 35** : Formation des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement

Régions	Nombre de formations des acteurs sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement		Nombre d'acteurs formés	Nombre de femmes formés
	Prévisions	Réalisations		
<b>Boucle du Mouhoun</b>	0	0	0	0
<b>Cascades</b>	1	1	34	21
<b>Centre</b>	0	0	0	0
<b>Centre-Est</b>	0	0	0	0
<b>Centre-Nord</b>	0	0	0	0
<b>Centre-Ouest</b>	0	0	0	0
<b>Centre-Sud</b>	0	0	0	0
<b>Est</b>	0	0	0	0
<b>Hauts-Bassins</b>	0	0	0	0
<b>Nord</b>	0	0	0	0
<b>Plateau Central</b>	0	0	0	0
<b>Sahel</b>	0	0	0	0
<b>Sud-Ouest</b>	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>34</b>	<b>21</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Au total 34 acteurs dont 21 femmes ont été formés sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement par le projet SANIYA-SO+ dans la Région des Cascades. Ces acteurs sont des responsables de centres de santé et des COGES.

## **4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta**

### **4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta**

#### **Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes**

Parmi les 13 régions, seule la région de la Boucle du Mouhoun a enregistré une activité entrant dans le cadre du développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta à la date du 31 Décembre 2021. Des études ont été réalisées dans les communes de Boromo et Sibi sur la Gestion des boues de vidange par l'ONG GRET dans le cadre de la mise en œuvre du projet OHANGU dans la région.

Aussi, dans le cadre de la commémoration conjointe de la Journée mondiale des toilettes et du lavage des mains, un Salon international des toilettes, de l'assainissement et de l'hygiène de Ouagadougou (SITAHO) a été organisé par l'entreprise Energie – Eau - D'Afrique (ENER-AF) en collaboration avec la DGA et les 2iE pour valoriser les innovations dans le domaine de l'assainissement et créer un cadre d'expositions et d'échanges entre acteurs du sous-secteur.

#### **Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta**

Au titre de l'amélioration des technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta, aucune activité relative à ce produit n'a été menée au cours de l'année 2021.

#### **Produit 6.1.3 : Amélioration des approches, des pratiques et les comportements en matière d'assainissement**

Aucune programmation n'a été faite pour ce produit en 2021. Néanmoins la région du Nord a enregistré une activité pour l'amélioration des approches, les pratiques et les comportements en matière d'assainissement. Il s'agit du concept Village Propre et Productif développé par le consortium WaterAid et Eau Vive. En effet, il s'agit dans un 1<sup>er</sup> temps de rendre le village propre par l'atteinte de la FDAL puis à mener des actions de promotion de la valorisation des boues de vidanges essentiellement dans l'agriculture qui constitue la principale activité des populations de la région. Un village de la commune de Boussou a été retenu pour la mise en œuvre de la phase pilote. Au total le projet prévoit la réalisation de 3 villages VPP (Village Propre et Productif) dans la région du Nord.

Aussi, la Direction générale de l'Assainissement DGA a tenu une réflexion nationale sur la mise en œuvre de l'approche ATPC au Burkina Faso avec l'ensemble des acteurs où le rapport de l'état des lieux de la mise en œuvre de l'ATPC a été présenté. Cet atelier a permis de recueillir les orientations des acteurs dont l'une des principales recommandations a été d'élaborer une note d'orientation pour l'accélération de la Fin de la défécation à l'air libre (FDAL) d'ici la fin des ODD.

Ledit document a été élaboré et validé en atelier technique par le comité de suivi des travaux. Il reste sa validation en atelier national avec l'ensemble des acteurs.

## 4.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

### 4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

#### 1) Organisation d'activités de mobilisation de ressources financières

La journée mondiale des Toilettes organisée dans la région de la Boucle du Mouhoun le 19 Novembre 2021 a connu la participation des responsables des structures centrales, déconcentrées du MEA, des PTF et certains acteurs.

**Tableau 36** : Mobilisation financière des ménages

Région	latrines traditionnelles sans dalle à béton		latrines achevées		latrines réalisées		Puisards réalisés		Puisard achevés		Fosse septique		TOTAL 2021
	Latrines	Montant (30000)	latrines achevées	Montant (55000)	latrines réalisées	Montant (110000)	Puisards	Montant (45000)	Puisard	Montant (40000)	Fosse septique réalisées	Montant (45000)	
Boucle du Mouhoun	85	2 550 000	767	42 185 000	373	41 030 000	39	1 755 000	8	320 000	1	45 000	87 885 000
Cascades	0	-	323	17 765 000	126	13 860 000	10	450 000	-	-	2	90 000	32 165 000
Centre	1	30 000	793	43 615 000	678	74 580 000	4	180 000	202	8 080 000	-	-	126 485 000
Centre-Est	3	90 000	493	27 115 000	334	36 740 000	5	225 000	-	-	-	-	64 170 000
Centre-Nord	35	1 050 000	738	40 590 000	338	37 180 000	11	495 000	148	5 920 000	-	-	85 235 000
Centre-Ouest	831	24 930 000	2 640	145 200 000	1 236	135 960 000	25	1 125 000	1 261	50 440 000	1	45 000	357 700 000
Centre-Sud	1	30 000	3 164	174 020 000	246	27 060 000	3	135 000	385	15 400 000	-	-	216 645 000
Est	144	4 320 000	1 001	55 055 000	534	58 740 000	63	2 835 000	-	-	-	-	120 950 000
Hauts-Bassins	17	510 000	1 057	58 135 000	204	22 440 000	11	495 000	-	-	2	90 000	81 670 000
Nord	8	240 000	1 328	73 040 000	288	31 680 000	90	4 050 000	-	-	-	-	109 010 000
Plateau Central	1	30 000	305	16 775 000	101	11 110 000	5	225 000	2	80 000	-	-	28 220 000
Sahel	41	1 230 000	251	13 805 000	103	11 330 000	-	-	-	-	-	-	26 365 000
Sud-Ouest	9	270 000	807	44 385 000	200	22 000 000	53	2 385 000	-	-	30	1 350 000	70 390 000
<b>BURKINA FASO</b>	<b>1176</b>	<b>35 280 000</b>	<b>13 667</b>	<b>751 685 000</b>	<b>4 761</b>	<b>523 710 000</b>	<b>319</b>	<b>14 355 000</b>	<b>2 006</b>	<b>80 240 000</b>	<b>36</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 406 890 000</b>

Source : INOA 2021 ; rapports bilan régionaux, 2021

Pour le compte de l'année 2021, environ 1 milliard et demi FCFA ont été mobilisés par les ménages pour la réalisation des latrines, des puisards et des fosses septiques. Ce montant a contribué à la réalisation de 18 428 latrines dont 13 667 latrines semi-finies achevées. De même 2 325 puisards et 36 fosses



septiques ont été réalisés. On constate que les régions du Centre-Ouest et du Centre-Sud enregistrent une plus grande mobilisation financière des ménages. Cela pourrait s'expliquer par la mise en œuvre accrue des activités d'intermédiation sociales notamment l'ATPC dans ces régions.

**Tableau 37** : sanithons et nuits de l'assainissement

Régions	Nombre de sanithons tenus		Nombre de nuits de l'assainissement tenues		Nombre de table-rondes		Observations
	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	
Cascades	0	0	0	0	0	0	
Centre	0	0	0	0	0	0	
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	
Est	0	0	0	0	0	0	
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	
Nord	0	0	0	0	0	0	
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	
Sahel	0	0	0	0	0	0	
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	
<b>Total National</b>	0	0	0	0	0	0	

Source : rapports bilan régionaux 2021

Au cours de l'année 2021, on n'a pas enregistré des activités dans le cadre des sanithons et nuits de l'assainissement.

## 2) Organisation de la Journée Mondiale des Toilettes

Le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement en collaboration avec ses partenaires a commémoré cette année 2021, la Journée mondiale du Lavage des Mains (JMLM) conjointement à celle des Toilettes (JMT) sous les thèmes respectifs : « Notre avenir est à portée de main - Avançons ensemble » et « La valeur des toilettes ». A travers une série d'activités sur une durée de six jours, allant du 15 au 21 novembre 2021, avec un focus sur la journée du vendredi 19 Novembre 2021, ces journées consacrées au lavage des mains et aux toilettes ont été célébrées à Dédougou dans la Boucle du Mouhoun sous le Parrainage de Madame la représentante de la Banque Mondiale au Burkina Faso et la présidence du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement. Cette cérémonie a été l'occasion pour le lancement des travaux de réalisation de latrines familiales par le PAEA (Programme d'Approvisionnement en Eau de Assainissement). Ces commémorations visaient à faire un plaidoyer auprès des acteurs et à sensibiliser les populations sur l'importance des toilettes et du lavage des mains au savon et à l'eau propre. Les activités réalisées dans le cadre de la JMT/JMLM sont entre autres :

- **L'organisation d'une campagne de communication sur les médias à travers** la diffusion de spots annonce (télé et radio) de la JMT, JMLM ; du clip audio et vidéo du SLAM ; d'une chronique radio en lien avec l'assainissement et l'hygiène des mains ; la diffusion d'un documentaire sur l'utilisation et la gestion de latrines publiques et institutionnelles ; la diffusion du message des leaders coutumiers et religieux (communautés musulmane, catholique et protestante) sur le lavage des mains. Diffusion télé et radio ; la production et la distribution de gadget de sensibilisation ;
- **L'organisation de Jeux Wash United** dans quatre (04) écoles de la région de la Boucle du Mouhoun ;
- **L'organisation du Salon International des toilettes, de l'hygiène et de l'assainissement de Ouagadougou (SITHAO).**

### 3) Mobilisation de ressources financières

**Tableau 38** : ressources financières mobilisées

Régions	Mécanismes endogènes de financement				Stratégie de mobilisation de ressources extérieures				Autres stratégies (à préciser) (i)	Montant total mobilisé (millions) A+b+c+d+e+f+g+h+i
	Sanithons (a)	Nuits d'assainissement (b)	Fonds propres des communes (c)	Ménages (d)	Diaspora (e)	Coopération décentralisée (jumelage) (f)	PTF (g)	Tables-rondes (h)		
Boucle du Mouhoun	2	0	0	87,885	0	0	1,8	0	0	91,685
Cascades	0	0	0	32,165	0	0	0	0	0	32,165
Centre	0	0	18,936	126,485	0	0	0	0	0	145,421
Centre-Est	0	0	0	64,17	0	0	0	0	0	64,17
Centre-Nord	0	0	0	85,235	0	0	0	0	0	85,235
Centre-Ouest	0	0	0	357,7	0	0	0	0	0	357,7
Centre-Sud	0	0	7,6	216,645	0	0	5,552	0	0	229,797
Est	0	0	0	120,95	0	0	0	0	0	120,95
Hauts-Bassins	0	0	0	81,67	0	0	0	0	0	81,67
Nord	0	0	0	109,01	0	0	0	0	0	109,01
Plateau Central	0	0	0	28,22	0	0	0	0	0	28,22
Sahel	0	0	0	26,365	0	0	0	0	0	26,365
Sud-Ouest	0	0	0	70,39	0	0	0	0	0	70,39
<b>Total National</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>26,536</b>	<b>1 406,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 442,778</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

En 2021, environ 1 442 millions de FCFA ont été mobilisés par les acteurs des régions à travers les financements endogènes et extérieurs. Il s'agit entre autres des Sanithons, des fonds propres des communes, des contributions des ménages et celles des PTF.

**Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages**

**Tableau 39** : efforts des ménages

Régions	Nombre de latrines subventionnées homologuées	Nombre de latrines homologuées entièrement réalisées par les ménages	Nombre de latrines traditionnelles sans dalle à béton	Observations
Boucle du Mouhoun	767	373	85	
Cascades	323	126	0	Latrines réalisées dans les villages déclenchés dans le cadre de l'ATPC
Centre	793	678	1	Fond propre des familles
Centre-Est	493	334	3	
Centre-Nord	738	338	35	
Centre-Ouest	2 640	1 236	831	
Centre-Sud	3 164	246	1	
Est	1 001	534	144	
Hauts-Bassins	1 057	204	17	
Nord	1 328	288	8	
Plateau Central	305	101	1	
Sahel	251	103	41	
Sud-Ouest	807	200	9	
<b>Total National</b>	<b>13 667</b>	<b>4 761</b>	<b>1176</b>	

Source : INO, 2021

Dans le cadre de l'atteinte des objectifs du PN-AEUE, les acteurs intervenant dans le domaine de l'assainissement familial utilisent des approches distinctes telles que la subvention partielle ou totale des ouvrages dans la mise en œuvre des activités. En effet, la subvention partielle consiste à apporter une contribution à travers la prise en charge soit de la superstructure de la latrine et/ou du creusage de la fosse, soit en apportant de la main d'œuvre et/ou des agrégats nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Par conséquent, le complément de la réalisation de l'ouvrage est apporté par le ménage. Aussi, des ménages réalisent entièrement des ouvrages eux-mêmes. L'ensemble des efforts des ménages, a permis d'achever 13 667 latrines, de réaliser entièrement 4 761 latrines et de construire 1176 latrines traditionnelles sans dalle en béton.

Ces résultats montrent que la part contributive des ménages dans l'assainissement familial est considérable.

**Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance**

1) Situation des transferts de fonds

Dans le cadre du transfert des compétences de l'Etat aux collectivités, le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement octroie des financements à ces dernières pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement. C'est dans ce cadre que pour l'année 2021, les régions du Centre, du Centre-Est, de l'Est, du Plateau Central et du Sahel ont bénéficié d'un transfert de fonds à hauteur de 705,231 millions de FCFA pour la réalisation de 4 993 latrines familiales et la promotion de l'hygiène et l'assainissement familial. Le tableau ci-dessous présente l'état d'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural.

**Tableau 40:** Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural

Régions	Nombre communes bénéficiaires	Année de transfert	Nouvelles réalisations de latrines							
			Nombre			Montants				
			Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé)%	Taux (liquidé)%
<b>Boucle du Mouhoun</b>	2	2020	575	387	67,3	69	69	19	100	27,5
<b>Cascades</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Centre</b>	2	2021	390	428	109,7	55	42,399	42,399	77,1	77,1
<b>Centre-Est</b>	4	2021	1 416	708	50,0	200	100	100	50,0	50,0
<b>Centre-Nord</b>	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-
<b>Centre-Ouest</b>	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-
<b>Centre-Sud</b>	1	2018	540	180	33,3	60	0	0	0,0	0,0
<b>Est</b>	5	2021	1 415	566	40,0	200	200	80	100,0	40,0
<b>Hauts-Bassins</b>	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-
<b>Nord</b>	3	2017 / 2019	1 131	463	40,9	118	115,56	46,31	97,9	39,2
<b>Plateau Central</b>	5	2021	1 064	0	0,0	150,23	105,38	0	70,1	0,0
<b>Sahel</b>	4	2021	708	318	44,9	100	25	25	25,0	25,0
<b>Sud-Ouest</b>	3	2020	500	3 550	710,0	60	53,65	53,65	89,4	89,4
<b>Total National</b>	<b>29</b>		<b>7 739</b>	<b>6 600</b>	<b>85,3</b>	<b>1012,230</b>	<b>710,989</b>	<b>366,359</b>	<b>70,2</b>	<b>36,2</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Pour une prévision de 7 739 latrines familiales à réaliser en 2021 sur les fonds transférés aux collectivités, 4 993 sont issues du transfert de 2021 et 2 746 de ceux des années antérieures (2017-2020). A la fin de cette année, au total 6 600 latrines ont été réalisées pour un montant de 710 millions de FCFA soit un taux d'exécution physique et financière respectivement de 85,3% et 70,2%. Sur les fonds transférés de 2021, les communes ont réalisé 2 020 latrines familiales pour un montant engagé de 472,779 millions FCFA soit 40,1% d'exécution physique et 67% d'exécution financière.

La région du Centre a bénéficié d'un transfert d'un montant de 55 millions de FCFA pour la réalisation de 390 latrines familiales en 2021. En fin décembre 2021, le taux de réalisation financier est donc estimé à 77,1% pour une réalisation physique de 100%. Aussi, les travaux engagés sur la base de ces fonds transférés en 2019 aux communes ont été achevés en 2021 portant ainsi le nombre total de latrines réalisé à 428 en 2021.

La région du Centre-Est a aussi bénéficié d'un transfert d'un montant de 200 millions de FCFA pour la réalisation de 1 416 latrines familiales en 2021 dans 4 Communes. A la date du 31 Décembre 2021, deux Communes (Andemtenga et Ouargaye) ont exécuté entièrement leurs fonds. Les taux d'exécution physique et financière sont estimés chacun à 50%.

Dans la région de l'Est 5 communes ont bénéficié des fonds transférés pour la réalisation de 1 415 latrines familiales pour un montant total de 200 millions de FCFA. A la date du 31 décembre 2021, deux communes (Thion et Diabo) sur les cinq ont terminé leurs travaux. Ainsi, 566 latrines sont achevées pour un montant de 80 millions soit respectivement un taux de réalisation et de consommation de 40% chacun.

Au niveau de la région du plateau Central, 5 Communes ont aussi bénéficié d'un transfert de 150,231 millions de FCFA pour la réalisation de 1 064 latrines familiales. A la date du 31 décembre 2021, les travaux sont toujours en cours de réalisation avec 0% d'exécution physique, 70,14 % d'engagement financier et 0 % de liquidation.

Concernant la région du Sahel, 100 millions de FCFA ont été transférés à 04 communes (Bani, Déou, Diguel et Titabé) pour la réalisation de 708 latrines familiales. Au 31 décembre 2021, seule la commune de Titabé a pu réaliser les 177 latrines qui lui ont été assignées. La commune de Diguel a réalisé 141 latrines familiales. On note un taux de réalisation physique de 44,9% avec 318 latrines réalisées et 25% comme un taux d'exécution financière.

2) Evaluation de la mise en œuvre des fonds transférés aux communes

L'ensemble des prévisions au titre des fonds transférés aux communes en 2021 ont été réalisés. Les communes ont ainsi pu réaliser les latrines familiales.

3) Elaboration du rapport de mise en œuvre des fonds transférés aux communes

Le rapport de mise en œuvre des fonds transférés aux communes est en cours d'élaboration.

**Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance**

1) Etudes réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain

Pour l'année 2021, des techniciens Communaux eau et assainissement des communes ont bénéficié d'un voyage d'études et de partage d'expérience organisé par l'ONG GRET dans la Province de la Gnagna avec l'appui financier de l'Agence Française de Développement dans le cadre du projet OHANGU Assainissement. Aussi dans le cadre du même projet, l'ONG GRET a formé 03 Techniciens Communaux eau et assainissement dans la Région de la Boucle du Mouhoun.

En outre, IRC en collaboration avec la DGEP a initié une formation à l'endroit des agents du MEA sur les outils qui leur permettront de mieux appuyer les communes dans la Maitrise d'Ouvrage Communale. Des Directions Régionales ont également initié des formations à l'endroit des acteurs sur les outils de collectes de données.

Dans le processus de responsabilisation des communautés dans la mise en œuvre de l'ATPC, le MEA à travers des DREA a renforcé les capacités des maçons de certaines communes qui seront chargés d'appuyer les populations dans l'autoréalisation des ouvrages. Des membres des CAV /Q des villages de ces communes ont également bénéficié de formations afin de pouvoir pleinement jouer leur rôle pour la FDAL.



**Tableau 41:** Voyages d'études et partage d'expérience réalisés

Régions	Voyage d'étude et partage d'expérience			Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Nombre d'activités réalisées dans le cadre de l'AMOC	Préciser les activités de l'AMOC réalisées
					Nombre d'hommes	Nombre de femmes	Nombre total		
	Prévisions	réalisations	thèmes						
<b>Boucle du Mouhoun</b>	0	0	0	Techniciens Communaux eau assainissement	3	0	3	0	0
<b>Cascades</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Centre</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Centre-Est</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Centre-Nord</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Centre-Ouest</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Centre-Sud</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Est</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hauts-Bassins</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nord</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Plateau Central</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sahel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sud-Ouest</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Source : rapports bilan régionaux, 2021

2) Les autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur

**Tableau 42** : autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs	
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC..)	ONG/association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total		
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC..)	ONG/association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total	
Cascades	Formation de maçons à la construction de latrines y compris sur la vidange et la bonne gestion des boues de vidange, formation des agents de terrain et des hygiénistes et comité de l'assainissement sur la mise en œuvre de l'assainissement, Casting et formation des artistes locaux à l'approche du théâtre invisible – Choix des thématiques et des modes d'intervention – Elaboration d'un canevas d'observation-Intervention dans les centres de santé – Restitution des comportements observés, Renforcer les compétences des leaders de changement (débat, communication non violente) et des interventions des leaders de changement avec les outils ASCC produits, Atelier de formation des groupes cibles 1 et 2 (agents de santé, Agents de soutien sur les techniques de diffusion et de promotion des produits ASCC, Arts Visuels (dessin, peintures, murales, boîtes à image)	2	3	2	1	2	0	15	18	0	68	68	43	111	

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC..)	ONG/association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total	
Centre	Thèmes des formations réalisées, Formation des enseignants sur le Wash in school	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	ND	ND	ND	
Centre-Est	Formation et de collecte des acteurs AEPA sur la collecte des données bilan et programmation														
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centre-Ouest	Formation sur les outils de l'AMOC, Formation des acteurs sur les outils de collecte, Technique de réalisation de latrines familiales, Hygiène, Assainissement et technique d'animation,											109	28	137	
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs	
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC..)	ONG/association	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total		
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sud-Ouest	Méthodes et techniques de supervision des travaux d'assainissement, Formation des formateurs en ATPC, Formation des agents de la DREA-SUO en l'ATPC, Formation des enseignants et CCEB sur le PHAST	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	12		Projet EHADA Croix Rouge
<b>Total National</b>		20	13	2	1	18	0	15	18	0	68	199	71	260		

Source : rapports bilan régionaux, 2021

A l'exception des animateurs et des prestataires, toutes les autres couches du secteur ont bénéficié des formations, même si le nombre reste très limité. On dénombre 83 femmes formées sur un total de 243. Parmi ces formations, on peut retenir les thèmes suivants :

- Les méthodes et techniques de supervision des travaux d'assainissement ;
- L'approche ATPC ;
- L'outil PHAST ;
- Le Wash in School.

**Produit 7.1.6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires sont assurés par le Ministère de l'Eau et de l'Assainissement à travers le comité de revue du programme**

1) Elaborer les rapports bilans et programmations

Au cours de l'année 2021 plusieurs rapports ont été rédigés par les DREA en vue du suivi de leurs activités et de celles des autres acteurs. Il s'agit entre autres de :

- Des rapports bilan annuel 2020 du PN-AEUE ;
- Des rapports de programmation 2021 du PN-AEUE ;
- Des rapports semestriels 2021 du PN-AEUE ;
- Des rapports de programmation révisé ;
- Des rapports trimestriels.

2) Cadres de concertation communaux en matière d'assainissement

**Tableau 43** : Cadres de concertation communaux

Régions	Type de cadre	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants		
			Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	CCEau , Rencontre de coordination des interventions en assainissement dans la région, Atelier restreint de réflexion sur le maintien de la Sissili FDAL	Elus locaux, Acteurs et PTFs	213	19	232
Centre-Sud	communal	Population, CVD, AUE	73	46	119
Est	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	communal		34	3	37
Nord	0	0	0	0	0
Plateau Central	communal	Tous les membres	100	27	127
Sahel	Provinciale	Autorités locale et ONG	67	9	76
Sud-Ouest	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>			487	104	591

Source : rapports bilan régionaux, 2021

Les DREA en collaboration avec leurs partenaires ont organisé des cadres de concertations, soit pour rendre compte des activités en assainissement au niveau des communes ou pour coordonner les interventions des différents acteurs au niveau régional et réfléchir sur le maintien du statut FDAL. Sur 591 participants, on constate une faible participation des femmes au cadres de concertation soit 17,6%.

3) Tenir les sessions des groupes thématiques régionaux du PN-AEUE

Des sessions du groupe thématiques régionaux ont été tenues. Il s'agit de la session de février 2021 pour faire le bilan annuel des activités de l'année 2020 et la programmation des activités de 2021 et celle de juin 2021 pour faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des activités et la révision des activités déjà programmées.

4) Tenir les sessions du comité de revue

Au cours de l'année 2021 deux sessions ont été tenues. Il s'agit de la session pour examiner le bilan de l'année 2020 et faire la programmation de 2021 et celle à mi-parcours pour réviser les programmations et faire le bilan des activités déjà réalisées.

5) Élaborer le rapport annuel de performance et le plan annuel de performance

Deux sessions ont été tenues en vue d'élaborer le rapport annuel de performance et le plan annuel de performance.

6) Mobilisation des ressources

7) Autres activités de l'action

## 5 BILAN FINANCIER

### 5.1 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

**Tableau 44** : Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural

Régions	Programmation révisée (a)	Montant engagé			Montant liquidé				
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	9,975	9,975	0	9,975	100	9,975	0	9,975	100
Cascades	2,816	2,816	2,31	5,12576	99,99	2,816	1,197	4,012	99,99
Centre	4,545	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	1,12	0	2,27	2,27	0	0	2,27	2,27	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	27,07	27,07	17,97	45,04	100	0	0	0	0
Centre-Sud	6,528	6,528	3,8	10,328	100	6,528	3,8	10,328	100
Est	30,41	30,41	45,423	75,8325	100	30,41	45,423	75,833	100
Hauts-Bassins	0	0	1,56	1,56	0	0	1,56	1,56	0
Nord	0	0	5	5	0	0	5	5	0
Plateau Central	24,458	24,458	59,712	84,17	100	24,458	30,349	54,807	100
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0,7	0,7	0	0,7	100	0,7	0	0,7	100
DGA	80,8	80,8	18,016	98,816	100	80,8	18,016	98,816	100
<b>Total National</b>	<b>107,622</b>	<b>101,957</b>	<b>138,045</b>	<b>240,001</b>	<b>94,7</b>	<b>74,887</b>	<b>89,598</b>	<b>164,485</b>	<b>69,6</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

En matière d'éradication de la défécation à l'air libre en milieu rural, 240,001 millions de F CFA ont été engagés dont 138,045 millions en hors programmation. La programmation effectuée par l'ensemble des régions et la DGA s'élève à 107,622 millions de F CFA et est inférieure aux hors programmation. Cela témoigne de la difficulté des DREA à capitaliser les interventions des autres acteurs car ne déclarant pas au moment opportun leur programmation. Le taux d'engagement qui est de 94,7% est supérieur à celui de 2020 estimé à 45,2%. Le montant liquidé s'élève à 164,485 millions de F CFA soit 69,6%.



Les régions du Centre et du Centre-Est n'ont pu réaliser aucune activité relative à l'abandon de la DAL malgré une programmation financière de 5,665 millions de F CFA.

**Tableau 45** : Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

Régions	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	1,8	1,8	0	0	1,8	1,8	0
Cascades	8,543	1,543	3,5	5,043	18,1	1,535	3,5	5,035	18,0
Centre	61,392	61,392	3,44	64,832	100,0	61,392	3,44	64,832	100,0
Centre-Est	45,01	0	31,9	31,9	0	0	31,9	31,9	0
Centre-Nord	365	37	0	37	10,1	37	0	37	10,1
Centre-Ouest	41,21	12,05	0	12,05	29,2	12,05	0	12,05	29,2
Centre-Sud	2,8	2,8	6,55	9,35	100	2,8	6,55	9,35	100
Est	668,65	8,304	0	8,304	1,2	8,304	0	8,304	1,2
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	13,979	8,304	16,28	24,584	59,4	8,304	16,28	24,584	59,4
Plateau Central	12,409	0	13	13	0,0	0	13	13	0,0
Sahel	36,842	16,71	9,915	26,625	45,4	16,71	9,915	26,625	45,4
Sud-Ouest	10,59	5,29	0	5,29	50,0	5,29	0	5,29	50,0
DGA	0	1,6	0,68	2,28	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>1266,425</b>	<b>154,992</b>	<b>87,065</b>	<b>242,057</b>	<b>12,2</b>	<b>153,385</b>	<b>86,385</b>	<b>239,770</b>	<b>12,1</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

En matière d'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, des sensibilisations de masse et de proximité ont été réalisées. A la date du 31 décembre 2021, un montant de 242,057 millions de F CFA ont été engagé sur une programmation 1 266,425 millions F CFA. Les régions des Hauts Bassins et de la Boucle du Mouhoun n'ont pas programmé des activités de sensibilisation. Bien que le montant de la programmation en 2021 soit élevé, le taux d'engagement (12,2%) reste de loin inférieur à celui de 2020 (91,1%). Ce résultat pourrait s'expliquer entre autres par la faiblesse des activités d'ImS/IEC et le contexte sécuritaire difficile.

**Tableau 46** : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1

Régions	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	9,975	9,975	1,8	11,775	100	9,975	1,8	11,775	100
Cascades	11,359	4,359	5,81	10,169	38,4	4,351	4,697	9,047	38,3
Centre	65,937	61,392	3,44	64,832	93,1	61,392	3,44	64,832	93,1
Centre-Est	46,13	0	34,17	34,17	0	0	34,17	34,17	0
Centre-Nord	365	37	0	37	10,1	37	0	37	10,1
Centre-Ouest	68,28	39,12	17,97	57,09	57,3	12,05	0	12,05	17,6
Centre-Sud	9,328	9,328	10,35	19,678	100	9,328	10,35	19,678	100
Est	699,06	38,714	45,423	84,137	5,5	38,714	45,423	84,137	5,5
Hauts-Bassins	0	0	1,56	1,56	0	0	1,56	1,56	0
Nord	13,979	8,304	21,28	29,584	59,4	8,304	21,28	29,584	59,4
Plateau Central	36,867	24,458	72,712	97,17	66,3	24,458	43,349	67,807	66,3
Sahel	36,842	16,71	9,915	26,625	45,4	16,71	9,915	26,625	45,4
Sud-Ouest	11,29	5,99	0	5,99	53,1	5,99	0	5,99	53,1
DGA	80,8	82,4	18,696	101,096	0	80,8	18,016	98,816	0
<b>Total National</b>	<b>1 374,047</b>	<b>256,949</b>	<b>225,110</b>	<b>482,059</b>	<b>18,7</b>	<b>228,271</b>	<b>175,983</b>	<b>404,254</b>	<b>16,6</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

Dans le cadre de l'éradication de la défécation à l'air libre et la promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural, 256,949 millions de F CFA ont été engagés sur une programmation de 1 374,047 millions. De façon globale le taux d'exécution financière de l'action 1 est 18,7%. Ce taux est très faible comparativement au taux de 81% de 2020. On note une progression du montant programmé par rapport à l'année 2020 mais les réalisations restent très insuffisantes.

## 5.2 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

## 5.3 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

**Tableau 47** : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA)

Régions	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions softs								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	9,8	9,8	0	9,8	100,0	9,8	0	9,8	100,0
Cascades	0	0	15,097	15,097	-	0	15,097	15,097	-
Centre	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	25	25	0	25	100,0	25	0	25	100,0
Centre-Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	16	12,7	0	12,7	79,4	12,7	0	12,7	79,4
Est	13,5	13,5	12	25,5	100,0	10,2	0	10,2	75,6
Hauts-Bassins	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	5,675	5,675	2,988	8,663	100,0	5,675	2,988	8,663	100,0
Plateau Central	11,3	4,5	0	4,5	39,8	4,5	0	4,5	39,8
Sahel	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	0	0	5,29	5,29	-	0	5,29	5,29	-
<b>Total National</b>	<b>81,275</b>	<b>71,175</b>	<b>35,375</b>	<b>106,55</b>	<b>87,6</b>	<b>67,875</b>	<b>23,375</b>	<b>91,250</b>	<b>83,5</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021 2021

Sur une programmation financière de **81,275 millions** pour des ateliers de ciblage, des études diagnostiques, des séances d'ImS et des actions soft, le montant engagé est de **71,175 millions** soit un taux d'engagement de **87,6%**. Le montant liquidé est de **67,875 millions** soit un taux de **83,5%**.

**Tableau 48 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)**

Régions	Réalisation de latrines familiales									Réhabilitation de latrines familiales								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Program-mation révisée (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Program-mation révisée (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Boucle du Mouhoun	968,672	438,189	90,95	529,139	45,2	274,189	10,2	284,389	28,3	5,71	0,53	0	0,53	9,3	0,53	0	0,53	9,3
Cascades	363,302	186,003	0	186,003	51,2	186,003	0	186,003	51,2	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	169,515	156,914	49,393	206,307	92,6	156,914	31,83	188,744	92,6	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	350,17	329	46,85	375,85	94,0	201,48	46,75	248,23	57,5	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	206,25	206,25	8,969	215,219	100,0	183,125	0	183,125	88,8	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	298,55	229,14	0	229,14	76,8	229,14	0	229,14	76,8	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	1 051,95	362,73	11,25	373,98	34,5	362,73	11,25	373,98	34,5	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	577,675	502,13	112,2	614,33	86,9	305,38	112,2	417,58	52,9	0	0	39	39	-	0	39	39	-
Hauts-Bassins	223,6	223,44	38,3	261,74	99,9	145,24	26,43	171,67	65,0	7,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Nord	373,88	186,94	40,37	227,31	50,0	101,78	40,37	142,15	27,2	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	332,575	15	0	15	4,5	15	0	15	4,5	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	362,689	224,33	10	234,33	61,9	218,86	10	228,86	60,3	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	204,9	204,9	34,84	239,74	100,0	204,9	34,84	239,74	100,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>5483,724</b>	<b>3264,966</b>	<b>443,1215</b>	<b>3708,087</b>	<b>59,5</b>	<b>2584,741</b>	<b>323,87</b>	<b>2908,611</b>	<b>47,1</b>	<b>13,21</b>	<b>0,53</b>	<b>39</b>	<b>39,53</b>	<b>4,0</b>	<b>0,53</b>	<b>39</b>	<b>39,53</b>	<b>4,0</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021 2021

Sur une programmation financière de 5 483,724 millions de F CFA, le montant engagé est de 3 264,966 millions soit un taux de 59,5%. Ce taux est inférieur à celui de 2020 qui était de 73,5%. Pour les réhabilitations, seules les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins ont fait des programmations pour un montant total de 13,5 millions. Sur cette prévision, on note que 0,53 millions seulement a été engagé dans la région de la Boucle du Mouhoun soit un taux de 4,0%.

**Tableau 49** : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques

Régions	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	244,19	91,695	0	91,695	37,6	13,295	0	13,295	5,4
Cascades	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	9,55	9,55	23,84	33,39	100,0	9,55	14,3	23,85	100,0
Centre-Est	16	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Centre-Nord	17,6	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Centre-Ouest	24	23,37	0	23,37	97,4	23,37	0	23,37	97,4
Centre-Sud	75,285	75,285	0	75,285	100,0	75,285	0	75,285	100,0
Est	133,39	33,31	0	33,31	25,0	13,31	0	13,31	10,0
Hauts-Bassins	15,56	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	6	6	-	0	6	6	-
Sahel	6,25	6,25	0,654	6,904	100,0	0	0	0	0,0
Sud-Ouest	0	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>541,825</b>	<b>239,46</b>	<b>30,494</b>	<b>269,954</b>	<b>44,2</b>	<b>134,81</b>	<b>20,3</b>	<b>155,11</b>	<b>24,9</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021 2021

Pour un montant prévu de 541,825 millions de FCFA pour la réalisation des puisards et fosses septiques, le taux d'exécution est de 44,2% soit un montant engagé de 239,46 millions de FCA. Ce taux est inférieur à celui de l'année 2020 qui était de 80,3%. Le montant liquidé s'élève à 134,81 millions FCFA.

**Tableau 50** : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles

Régions	Réalisation de latrines dans les écoles									Réhabilitation de latrines dans les écoles								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions				
	Program-mation révisée (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Progra-matio-n révisé e (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors progra-matio-n (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	101,87	55,15	65,275	120,425	54,1	55,15	65,275	120,425	54,1	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	224,374	133,995	3,99	137,985	59,7	77,02	3,99	81,006	34,3	73,6	10	0	10	13,6	10	0	10	13,6
Centre	65,300	30,625	0,4488	31,074	46,9	23,372	0,449	23,821	35,8	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	79	44	45	89	55,7	44	39	83	55,7	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	124,454	66	0	66	53,0	66	0	66	53,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	41,805	29,27	36,88	66,15	70,0	29,27	36,88	66,15	70,0	15	15	0	15	100,0	15	0	15	100,0
Centre-Sud	147,85	75,85	2,5	78,35	51,3	75,85	2,5	78,35	51,3	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	636,526	270,931	0	270,931	42,6	267,131	0	267,131	42,0	0,5	0,5	38,5	39	100,0	0,5	38,5	39	100,0
Hauts-Bassins	159,78	79,89	34,16	114,05	50,0	30,75	16,14	46,89	19,2	2,96	1,48	0	1,48	50,0	1,48	0	1,48	50,0
Nord	137,26	82,42	45	127,42	60,0	82,42	13,5	95,92	60,0	0,6	0,6	0	0,6	100,0	0,6	0	0,6	100,0
Plateau Central	118,342	65,64	40,76	106,4	55,5	65,64	40,76	106,4	55,5	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	40	38	9	47	95,0	38	9	47	95,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	138,93	120,44	16,2	136,64	86,7	115,85	16,2	132,05	83,4	0	0	10,41	10,41	-	0	10,41	10,41	-
<b>Total National</b>	<b>2015,491</b>	<b>1092,210</b>	<b>299,2138</b>	<b>1391,424</b>	<b>54,2</b>	<b>970,449</b>	<b>243,694</b>	<b>1214,143</b>	<b>48,1</b>	<b>94,66</b>	<b>27,58</b>	<b>48,91</b>	<b>76,49</b>	<b>29,1</b>	<b>27,58</b>	<b>48,91</b>	<b>76,49</b>	<b>29,1</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

Sur une programmation de 2 015,491 millions de F CFA pour la réalisation de latrines dans les écoles, on note un engagement financier de 1 092,210 millions soit un taux de 54,2%. Le montant liquidé s'élève à 970,449 millions soit un taux de 48,1%. Concernant les réhabilitations, sur une programmation de 94,66 millions de F CFA, le taux d'exécution financière est de 29,1% pour un montant engagé de 27,58 millions.

**Tableau 51:** Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé

Régions	Réalisation de latrines dans les centres de santé									Réhabilitation de latrines dans les centres de santé								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Program-mation révisée (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Program-mation révisée (a)	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la program-mation (b)	Hors program-mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	169,1	51,85	8,25	60,1	30,7	47,85	8,25	56,1	28,3	0	0	10	10	-	0	10	10	-
Cascades	101,692	91,735	5,848	97,584	90,2	60,186	5,848	66,035	59,2	29,914	0	10	10	0,0	0	10	10	0,0
Centre	21,881	21,881	0	21,881	100,0	21,037	0	21,037	96,1	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	8,5	3,5	9	12,5	41,2	3,5	9	12,5	41,2	1,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Centre-Nord	3	3	27	30	100,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	72,98	59,36	0	59,36	81,3	59,36	0	59,36	81,3	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	6,702	6,702	-	0	6,702	6,702	-	4	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Est	19,13	19,13	17,24	36,37	100,0	19,13	17,24	36,37	100,0	6,55	0	1	1	0,0	0	0	0	0,0
Hauts-Bassins	94,12	47,06	38,75	85,81	50,0	7,4	0	7,4	7,9	3	1,48	0	1,48	49,3	1,48	0	1,48	49,3
Nord	87,68	57,68	1,5	59,18	65,8	57,68	1,5	59,18	65,8	1,5	1,5	4,933	6,433	100,0	1,5	4,93	6,43	100,0
Plateau Central	52,82	15,6	18,33	33,93	29,5	15,6	12,35	27,95	29,5	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	0	0	34,842	34,842	-	0	34,842	34,842	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	29,69	4,29	21,39	25,68	14,4	4,29	21,39	25,68	14,4	0	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>660,593</b>	<b>375,086</b>	<b>188,852</b>	<b>563,939</b>	<b>56,8</b>	<b>296,033</b>	<b>117,122</b>	<b>413,156</b>	<b>44,8</b>	<b>46,464</b>	<b>2,98</b>	<b>25,933</b>	<b>28,913</b>	<b>6,4</b>	<b>2,98</b>	<b>24,93</b>	<b>27,91</b>	<b>6,4</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

La programmation financière s'élève à 660,593 millions de F CFA pour les réalisations dans les centres de santé. Au 31 décembre 2021, un montant de 375,086 millions a été engagé soit un taux de 56,8%. Le montant liquidé est de 296,033 millions soit un taux de 44,8%. On enregistre une hors programmation de 188,852 millions de F CFA.

Pour les réhabilitations dans les centres de santé, sur une prévision financière de 46,464 millions, seulement 2,98 millions ont été engagé par les régions des Hauts-Bassins et du Nord soit un taux de 6,4%. Cependant on note des réhabilitations hors programmation à hauteur de 25,933 millions de F CFA.

**Tableau 52 : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics**

Régions	Réalisation de latrines dans les lieux publics									Réhabilitation de latrines dans les lieux publics								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Program-mation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Program-mation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	39,43	19,28	8	27,28	48,9	19,28	8	27,28	48,9	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	3,513	3,513	8,061	11,574	100,0	3,513	8,061	11,574	100,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	31,243	28,498	0	28,498	91,2	28,498	0	28,498	91,2	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	110	110	28	138	100,0	110	11	121	100,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	10,987	10,987	48,013	59	100,0	10,987	48,013	59	100,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	24,34	21,55	0	21,55	88,5	21,55	0	21,55	88,5	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	20,65	20,65	4,5	25,15	100,0	20,65	4,5	25,15	100,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Est	139,45	59,844	0	59,844	42,9	15,55	0	15,55	11,2	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Hauts-Bassins	7,6	3,8	0	3,8	50,0	2	0	2	26,3	0	0	2,43	2,43	-	0	0	0	-
Nord	37,58	20,16	17,7	37,86	53,6	20,16	17,7	37,86	53,6	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	48,762	16,51	13,39	29,9	33,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sahel	0	0	164,45	164,45	-	0	164,45	164,45	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	11,2	5,5	0	5,5	49,1	5,5	0	5,5	49,1	0	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>484,755</b>	<b>320,292</b>	<b>292,114</b>	<b>612,406</b>	<b>66,1</b>	<b>257,688</b>	<b>261,724</b>	<b>519,412</b>	<b>53,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

Sur une programmation révisée de 484,755 millions de F CFA, le montant engagé est de 320,292 millions de FCFA soit un taux de 66,1%. Ce taux a connu une augmentation par rapport à celui de 2020 qui était de 45,4%. Le montant liquidé est de 257,688 millions soit un taux de 53,2%. On enregistre des hors programmations de 292,114 millions de FCFA. Aucune réhabilitation de latrines dans les lieux publics n'a été programmée.



**Tableau 53:** taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)

Régions	Programmation révisée (a)	OUVRAGES							
		Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	1538,772	666,494	182,475	848,969	43,3	420,094	101,725	521,819	27,3
Cascades	796,395	425,245	42,996	468,242	53,4	336,718	42,996	379,714	42,3
Centre	297,489	247,467	73,681	321,149	83,2	239,370	46,579	285,949	80,5
Centre-Est	590,17	511,5	128,85	640,35	86,7	383,98	105,75	489,73	65,1
Centre-Nord	362,291	286,237	83,982	370,219	79,0	260,112	48,013	308,125	71,8
Centre-Ouest	476,675	377,69	36,88	414,57	79,2	377,69	36,88	414,57	79,2
Centre-Sud	1317,731	547,215	24,952	572,167	41,5	547,215	24,952	572,167	41,5
Est	1526,721	899,345	219,94	1119,285	58,9	631,201	206,94	838,141	41,3
Hauts-Bassins	514,12	357,15	113,64	470,79	69,5	188,35	42,57	230,92	36,6
Nord	644,175	354,975	112,491	467,466	55,1	269,815	80,988	350,803	41,9
Plateau Central	563,799	117,25	78,48	195,73	20,8	100,74	59,11	159,85	17,9
Sahel	408,939	268,58	218,946	487,526	65,7	256,86	218,292	475,152	62,8
Sud-Ouest	384,72	335,13	88,13	423,26	87,1	330,54	88,13	418,67	85,9
<b>Total National</b>	<b>9421,997</b>	<b>5394,279</b>	<b>1405,444</b>	<b>6799,722</b>	<b>57,3</b>	<b>4342,685</b>	<b>1102,925</b>	<b>5445,610</b>	<b>46,1</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

Sur un montant total de 9 421,997 millions de F CFA programmé pour l'ensemble des ouvrages c'est-à-dire les nouvelles réalisations de latrines, de puisards et les réhabilitations de latrines, 5 394,279 millions de FCFA a été engagé au titre des investissements donnant ainsi un taux d'exécution financière de 57,3%. Bien que le montant programmé soit en hausse en 2021 comparativement à celui de 2020, le taux d'engagement reste inférieur à celui de l'année précédente qui était de 64,57%. Le montant liquidé est de 4342,685 millions de FCFA soit un taux de 46,1%. On note des hors programmation d'un montant 1 405,444 millions de FCFA.

**Tableau 54** : Situation de l'exécution financière du produits 3

Régions	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS, actions softs et autres								
	Montant engagé en millions de F CFA					Montant liquidé en millions de F CFA			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	0	0	3,15	3,15	-	0	3,15	3,15	-
Centre	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Nord	2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Centre-Ouest	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	12,7	12,7	-	0	12,7	12,7	-
Est	4,5	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	0	0	8,663	8,663	-	0	8,663	8,663	-
Plateau Central	0	0	4,5	4,5	-	0	4,5	4,5	-
Sahel	0	0	15,4	15,4	-	0	15,4	15,4	-
Sud-Ouest	0	0	5,29	5,29	-	0	5,29	5,29	-
<b>Total National</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>49,703</b>	<b>49,703</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>49,703</b>	<b>49,703</b>	<b>0,0</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

Sur une programmation de 6,5 millions de FCFA enregistrée en 2021 dans les régions du Centre-Nord et de l'Est, il n'y a eu aucune réalisation issue de la programmation. Cependant on note une hors programmation de 49,703 millions.

**Tableau 55:** Taux d'exécution financière de l'action 3

Régions	ACTION 3								
	Programmation révisée (a)	Montant engagé (en millions de FCFA)				Montant liquidé (en millions de FCFA)			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	1538,772	666,494	182,475	848,969	43,3	420,094	101,725	521,819	27,3
Cascades	796,395	425,245	46,146	471,392	53,4	336,718	46,146	382,864	42,3
Centre	297,489	247,467	73,681	321,149	83,2	239,370	46,579	285,949	80,5
Centre-Est	590,17	511,5	128,85	640,35	86,7	383,98	105,75	489,73	65,1
Centre-Nord	364,291	286,237	83,982	370,219	78,6	260,112	48,013	308,125	71,4
Centre-Ouest	476,675	377,69	36,88	414,57	79,2	377,69	36,88	414,57	79,2
Centre-Sud	1317,731	547,215	37,652	584,867	41,5	547,215	37,652	584,867	41,5
Est	1531,221	899,345	219,94	1119,285	58,7	631,201	206,94	838,141	41,2
Hauts-Bassins	514,12	357,15	113,64	470,79	69,5	188,35	42,57	230,92	36,6
Nord	644,175	354,975	121,154	476,129	55,1	269,815	89,651	359,466	41,9
Plateau Central	563,799	117,25	82,98	200,23	20,8	100,74	63,61	164,35	17,9
Sahel	408,939	268,58	234,346	502,926	65,7	256,86	233,692	490,552	62,8
Sud-Ouest	384,72	335,13	93,42	428,55	87,1	330,54	93,42	423,96	85,9
<b>Total National</b>	<b>9428,497</b>	<b>5394,279</b>	<b>1455,147</b>	<b>6849,425</b>	<b>57,2</b>	<b>4342,685</b>	<b>1152,628</b>	<b>5495,313</b>	<b>46,1</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

La programmation globale de l'action 3 est de 9 428,497 millions de F CFA en 2021. Sur cette programmation, un montant de 4 342,685 millions a été liquidé soit un taux de 46,1%. Ce taux est en dessous de la moyenne par rapport à celui de 2020 qui était de 54,8%. On note une hors programmation de 1455,147 millions.

#### 5.4 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

**Tableau 56** : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses septiques

Régions	Latrines familiales, puisards et fosses septiques								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	125	125		125	100	139		139	111
Cascades	79	79		79	100	85		85	107
Centre	1 529	1 529		1 529	100	1 639		1 639	107
Centre-Est	188	188		188	100	198		198	106
Centre-Nord	98	98		98	100	113		113	115
Centre-Ouest	115	115		115	100	127		127	111
Centre-Sud	111	111		111	100	111		111	100
Est	70	70		70	100	75		75	108
Hauts-Bassins	859	859		859	100	919		919	107
Nord	108	108		108	100	126		126	117
Plateau Central	119	119		119	100	124		124	104
Sahel	23	23		23	100	23		23	100
Sud-Ouest	33	33		33	100	34		34	102
<b>Total National</b>	<b>3 455</b>	<b>3 455</b>		<b>3 455</b>	<b>100</b>	<b>3 713</b>		<b>3 713</b>	<b>107</b>

Source : ONEA 2021

**Tableau 57** : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain

Régions	Latrines institutionnelles et publiques								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	46	40		40	87,0	18		18	39,1
Cascades	22	16		16	72,7	14		14	63,6
Centre	96	110		110	114,6	230		230	239,6
Centre-Est	30	50		50	166,7	34		34	113,3
Centre-Nord	24	36		36	150,0	14		14	58,3
Centre-Ouest	46	62		62	134,8	0		0	0,0
Centre-Sud	24	28		28	116,7	0		0	0,0
Est	16	46		46	287,5	28		28	175,0
Hauts-Bassins	58	92		92	158,6	46		46	79,3
Nord	34	46		46	135,3	4		4	11,8
Plateau Central	20	18		18	90,0	4		4	20,0
Sahel	4	10		10	250,0	4		4	100,0
Sud-Ouest	20	46		46	230,0	10		10	50,0
<b>Total National</b>	<b>440</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>136,4</b>	<b>406</b>		<b>406</b>	<b>92,3</b>

Source : ONEA 2021

## 5.5 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

**Tableau 58:** Exécutions financières de l'action 5

Régions	Action5								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Program- mation révisée (a)	Issues de la program- mation (b)	Hors program- mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la program- mation (b)	Hors program- mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	3	3	0	0	2,7	2,7	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	32	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DGA	5	5	0	5	100	5	0	5	100
<b>Total National</b>	<b>37</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>13,5</b>	<b>5</b>	<b>2,7</b>	<b>7,7</b>	<b>13,5</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

Cette action vise une meilleure structuration et un développement de la filière de gestion des eaux usées et des boues de vidange. Dans le Centre-Nord, il était prévu l'organisation de 16 groupements de vidangeurs pour un montant de 32 millions de FCFA mais aucune réalisation n'a été effectuée. Seule la région des Cascades sur les treize a mené des activités mais en hors programmation. La DGA a organisé des ateliers d'information et de diffusion du document cadre de la gestion de la filière de l'AEUE avec un montant engagé de 5 millions.

## 5.6 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

**Tableau 59:** Exécution financière des actions de la recherche

Régions	Action 6								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	1,7	1,7	0	0	1,7	1,7	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

Concernant le développement de la recherche dans le domaine de l'AEUE, cette action n'a enregistré aucune programmation. Cependant, la région de la Boucle du Mouhoun a mené des activités à la hauteur de 1,7 millions de F CFA en hors programmation.

## 5.7 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Tableau 60 : Exécution financière de l'action

structures	Action7								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0,000	0,000	19,753	19,753	0		11,602	11,602	0
Centre	2,38	1,988	0	1,988	83,5	1,988	0	1,988	83,5
Centre-Est	0		0,5	0,5	0		0,5	0,5	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	20,34	11,36	0	11,36	55,9	11,36	0	11,36	55,9
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	20,23	14,23	0	14,23	70,3	14,23	0	14,23	70,3
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0
Plateau Central	32	32	<b>93</b>	<b>125</b>	100,0	<b>32</b>	<b>93</b>	<b>125</b>	<b>100</b>
Sahel	3,47	0	2,318	2,318	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	54,915	54,915	0	0	1,265	1,265	0
DGA	10	6	5,952	11,952	60	9,868	2,084	11,952	98,68
<b>Total National</b>	<b>88,42</b>	<b>65,578</b>	<b>176,437</b>	<b>242,015</b>	<b>74,2</b>	<b>69,446</b>	<b>108,451</b>	<b>177,897</b>	<b>78,5</b>

Source : rapport bilan régionaux, 2021

Concernant le renforcement des capacités, un montant de 65,578 millions de F CFA a été engagé sur une prévision de 88,42 millions de F CFA pour les différentes formations. Les hors programmation s'élèvent à 176,437 millions F CFA. La région de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Sud ont mobilisé des fonds à la hauteur de 0,5 millions F CFA et 13,152 millions F CFA respectivement. La région du Centre-Ouest a mobilisé des ressources à la hauteur de 24,9 millions F CFA sur une prévision de 31, 8 millions F CFA. La DGA à elle seule a engagé 123,897 millions F CFA sur une programmation de 160,5 millions F CFA pour tout ce qui rentre dans le cadre de l'action 7.



**Tableau 61** : Exécution financière globale du PN-AEUE au niveau régional

<b>Milieu</b>	<b>Prévision (en millions de FCFA)</b>	<b>Exécution (engagé) (millions F CFA)</b>	<b>Taux engagé (%)</b>	<b>Exécution (liquidé) (millions F CFA)</b>	<b>Taux liquidé (%)</b>
Rural	8 662,92	6 745,32	77,9	5 465,48	63,1
Urbain	3 918	3 963,62	100	3 796	96,9
<b>National</b>	<b>12 580,92</b>	<b>10 708,94</b>	<b>85,1</b>	<b>9 261,10</b>	<b>73,6</b>

Source : rapport bilan régionaux et ONEA, 2021

## 6 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

**Tableau 62:** Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : **mode de passation des marchés**

Régions	Mode de passation des marchés																		Total de marchés inscrits dans le plan de passation			
	Nbre Appels d'offres			Nbre Demande de prix			Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition			Nbre Demande de cotation			Nbre Entente directe			Demande de proposition allégée						
	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Global
Boucle du Mouhoun	0	1	0	0	1	0	0	0	1	10	0	2	2	0	0	0	0	0	12	2	3	17
Cascades	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	3	2	7
Centre	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	2	0	5	3	0	8
Centre-Est	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	1	6	1	1	8
Centre-Nord	0	2	0	0	5	0	0	0	1	10	0	0	2	0	0	0	0	8	12	7	9	28
Centre-Ouest	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	9	3	0	12
Centre-Sud	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	5	6	0	11
Est	0	3	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	3	6	0	9
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	1	10	2	1	13
Nord	0	1	0	1	0	0	0	0	0	12	2	0	1	0	0	0	0	0	14	4	0	18
Plateau Central	0	1	0	0	1	0	0	0	4	16	0	0	3	0	0	0	0	0	19	2	4	25
Sahel	0	2	0	0	1	0	0	0	0	8	1	3	1	0	0	0	0	0	9	4	3	16
Sud-Ouest	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	0	3	2	0	0	0	0	0	9	1	3	13
DGA	0	1	0	3	0	1	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	9	1	1	11
<b>Total National</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>99</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>124</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>190</b>

Source : DGA, DREA

En 2021, 168 marchés ont été inscrits dans le plan de passation dont 38 pour les travaux et 18 pour les prestations intellectuelles.

**Tableau 63:** Suivi des procédures de dévolution des marchés publics : état d'exécution des marchés


Régions	Total de marchés inscrits dans le plan de passation				Engagés				Non engagés				Liquidé				Payé				Taux d'exécution base paiement %				Nombre de marchés en souffrance
	Acquisitions, Fournitures, bien et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	travaux	Etudes	Global	
Boucle du Mouhoun	12	2	3	17	12	2	3	17	0	0	0	0	12	2	3	17	12	2	3	17	100	100	100	100	0
Cascades	2	3	2	7	2	3	2	7	0	0	0	0	2	3	2	7	2	3	2	7	100	100	100	100	0
Centre	5	3	0	8	5	3	0	8	0	0	0	0	5	3	0	8	5	3	0	8	100	100	-	100	0
Centre-Est	6	1	1	8	6	1	1	8	0	0	0	0	6	1	1	8	6	1	1	8	100	100	100	100	1
Centre-Nord	12	7	9	28	12	7	9	28	0	0	0	0	12	7	9	28	12	7	9	28	100	100	100	100	0
Centre-Ouest	9	3	0	12	9	3	0	12	0	0	0	0	9	3	0	12	9	3	0	12	100	100	-	100	0
Centre-Sud	5	3	0	8	5	3	0	8	0	0	0	0	5	6	0	11	5	6	0	11	100	200	-	138	0
Est	3	6	0	9	3	6	0	9	0	0	0	0	3	4	0	7	3	4	0	7	100	67	-	78	2
Hauts-Bassins	10	0	1	11	10	0	1	11	0	0	0	0	9	2	1	12	9	2	1	12	90	-	100	109	0
Nord	14	3	0	17	13	3	0	16	1	0	0	1	13	4	0	17	13	4	0	17	93	133	-	100	0
Plateau Central	19	2	4	25	16	2	4	22	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	9	4	3	16	8	4	3	15	1	0	0	1	8	3	3	14	8	3	3	14	89	75	100	88	1
Sud-Ouest	9	1	3	13	9	1	3	13	0	0	0	0	9	1	3	13	9	1	3	13	100	100	100	100	0
DGA	9	1	1	11	9	1	1	11	0	0	0	0	9	1	1	11	9	1	1	11	100	100	100	100	0
<b>Total National</b>	<b>124</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>190</b>	<b>119</b>	<b>39</b>	<b>27</b>	<b>185</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>102</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>165</b>	<b>102</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>165</b>	<b>82,3</b>	<b>102,6</b>	<b>85,2</b>	<b>86,8</b>	<b>4</b>

Source : DGA, DREA, 2021

En 2021, sur 190 marchés inscrits dans le plan de passation, 185 ont été engagés soit un taux d'engagement global de 97,4%. Tous les marchés de travaux et de prestations intellectuelles ont été engagés. Au total 165 marchés ont été liquidés et payés dont 40 pour les travaux et 23 pour les prestations intellectuelles. Le taux d'exécution global base liquidation est de 86,8%.

## 7 ANALYSE DES PERFORMANCES ET EVOLUTION DES INDICATEURS

### 7.1 Assainissement en milieu rural

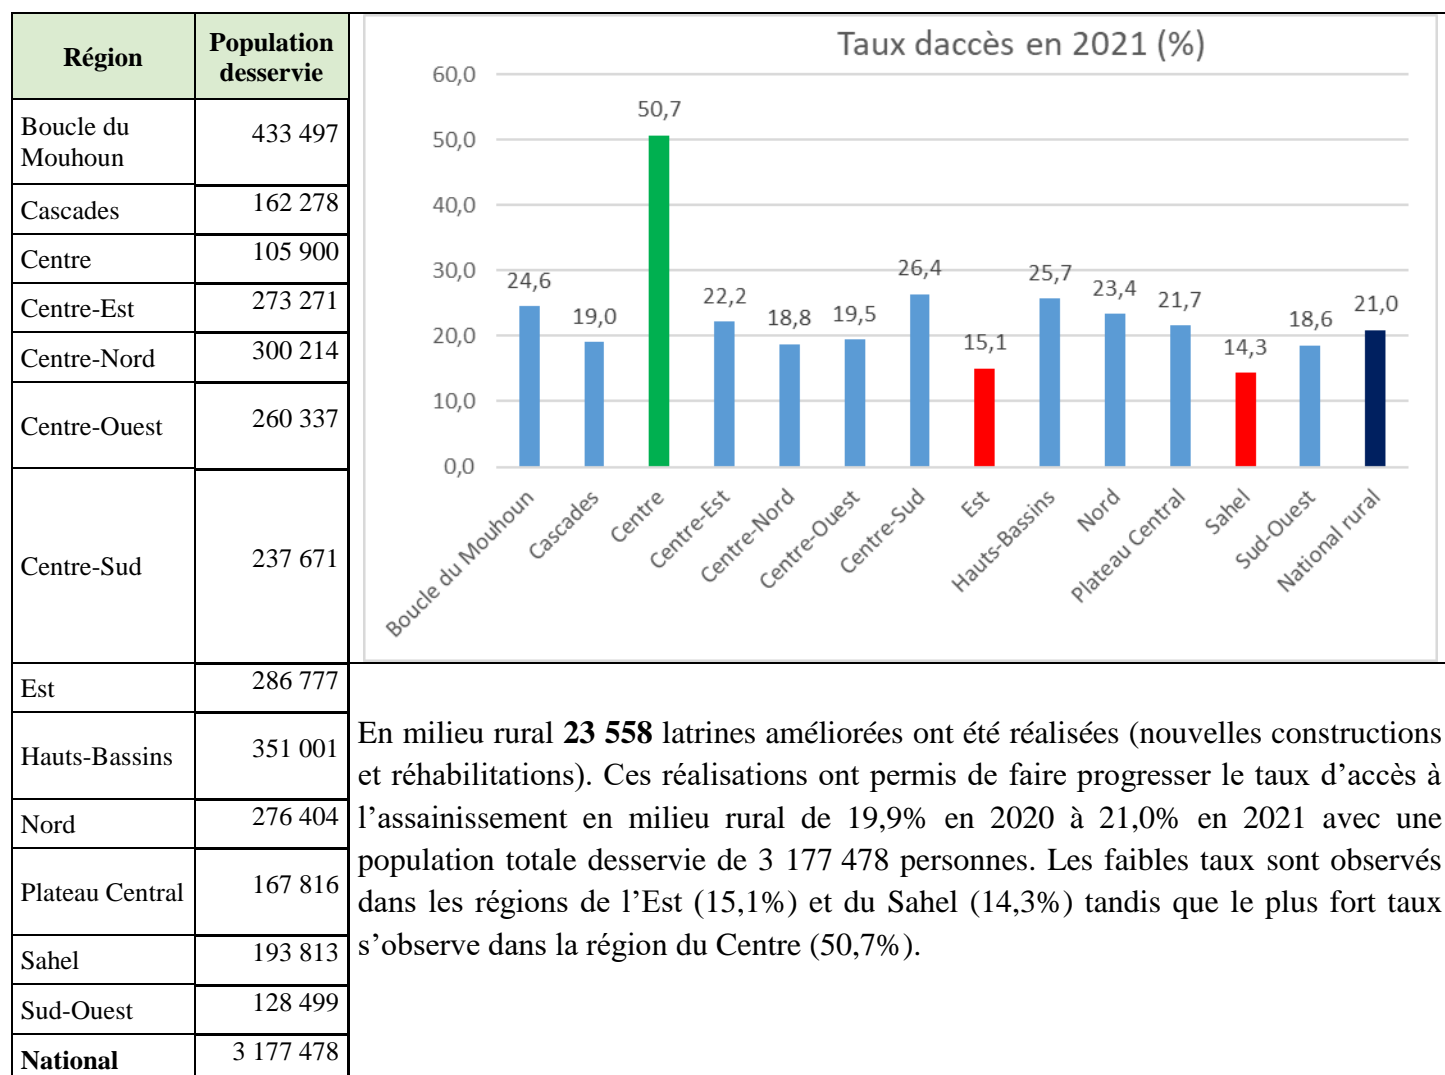

Source : BD\_AEUE, DGA 2021


Figure 1 : Taux d'accès à l'assainissement familial en 2021 par région

Tableau 64: Evolution du taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural par région (en %)

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Boucle du Mouhoun</b>	13,2	16,4	18,2	20,6	24,0	<b>24,6</b>
<b>Cascades</b>	9,6	10,3	11,6	14,3	18,3	<b>19,0</b>
<b>Centre</b>	30,6	34	35,6	37,5	43,7	<b>50,7</b>
<b>Centre-Est</b>	18,2	20,3	20,5	21	21,8	<b>22,2</b>
<b>Centre-Nord</b>	15,2	13,8	14,5	14,8	17,9	<b>18,8</b>
<b>Centre-Ouest</b>	12,5	14	14,7	15,7	16,9	<b>19,5</b>
<b>Centre-Sud</b>	6,8	8,7	10,1	12,4	23,3	<b>26,4</b>
<b>Est</b>	10,6	13,7	13,9	14,2	14,1	<b>15,1</b>
<b>Hauts-Bassins</b>	12,8	15,2	19,4	22,6	25,5	<b>25,7</b>
<b>Nord</b>	13,6	17,4	19,1	20,1	22,1	<b>23,4</b>
<b>Plateau Central</b>	19,7	20,2	20,7	20,9	21,3	<b>21,7</b>
<b>Sahel</b>	11,5	12,4	13,1	13,9	14,0	<b>14,3</b>
<b>Sud-Ouest</b>	13,4	14,3	16,2	16,6	17,0	<b>18,6</b>
<b>National rural</b>	<b>13,4</b>	<b>15,1</b>	<b>16,4</b>	<b>17,6</b>	<b>19,9</b>	<b>21,0</b>


Source : BD INOA 2021

L'évolution du taux d'accès par région montre que trois régions à savoir les régions du Centre, du Centre-Sud et du Centre-Ouest enregistrent les meilleures progressions annuelles avec respectivement 7 points, 3,1 points et 2,6 points. Par contre, six régions que sont les Cascades, le Centre-Est, le Centre-Nord, les Hauts-Bassins, le Plateau-Central et le Sahel ont enregistré des progressions inférieures à 1 point pourcentage. Des efforts restent donc à fournir pour améliorer le taux d'accès à l'assainissement dans plusieurs régions.

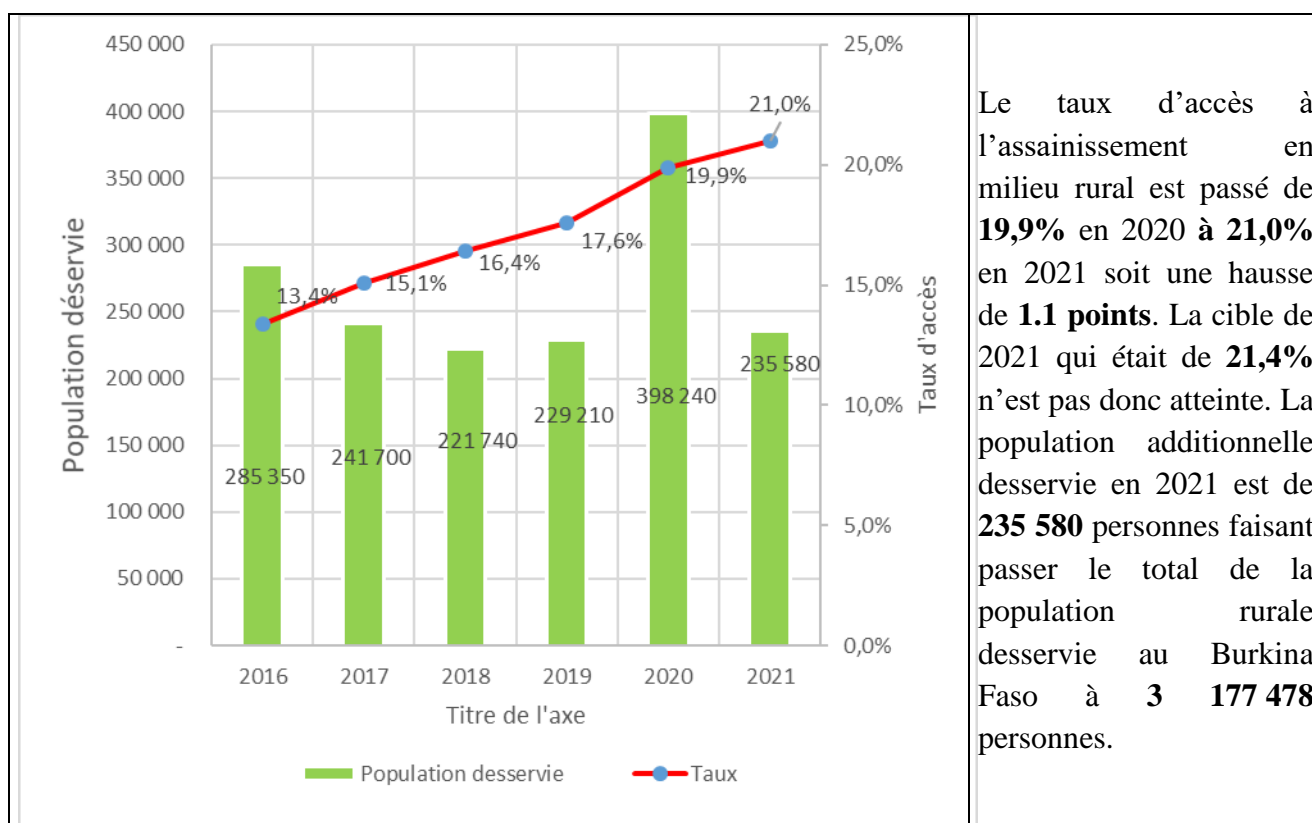

Source : BD INOA, DGA 2021


**Figure 2** : évolution du taux d'accès et population additionnelle desservie

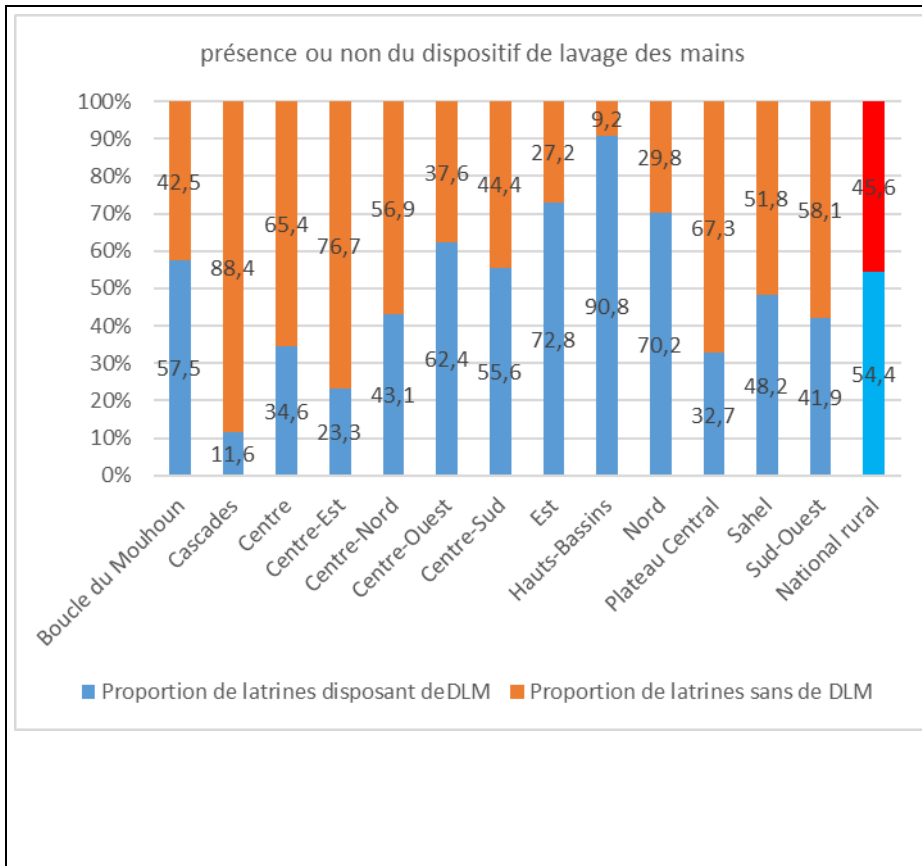

Sur 24 734 latrines ayant fait objet de visite, 54,4% disposent d'un dispositif de lavage des mains à proximité. Les régions, des Hauts-Bassins, de l'Est, du Nord, du Centre-Ouest, ont les plus forts taux (supérieurs à 60%) alors que les plus faibles taux sont enregistrés dans les régions des Cascades, du Centre-Est du Plateau Central et du Centre avec moins de 40%. Des efforts de sensibilisation restent donc à fournir car plus de 60% des latrines visitées au niveau national en milieu rural ne disposent pas de dispositif de lavage des mains.

Source : BD INOA, DGA 2021


**Figure 3 :** Situation de disponibilité de dispositif de lavage des mains (DLM)

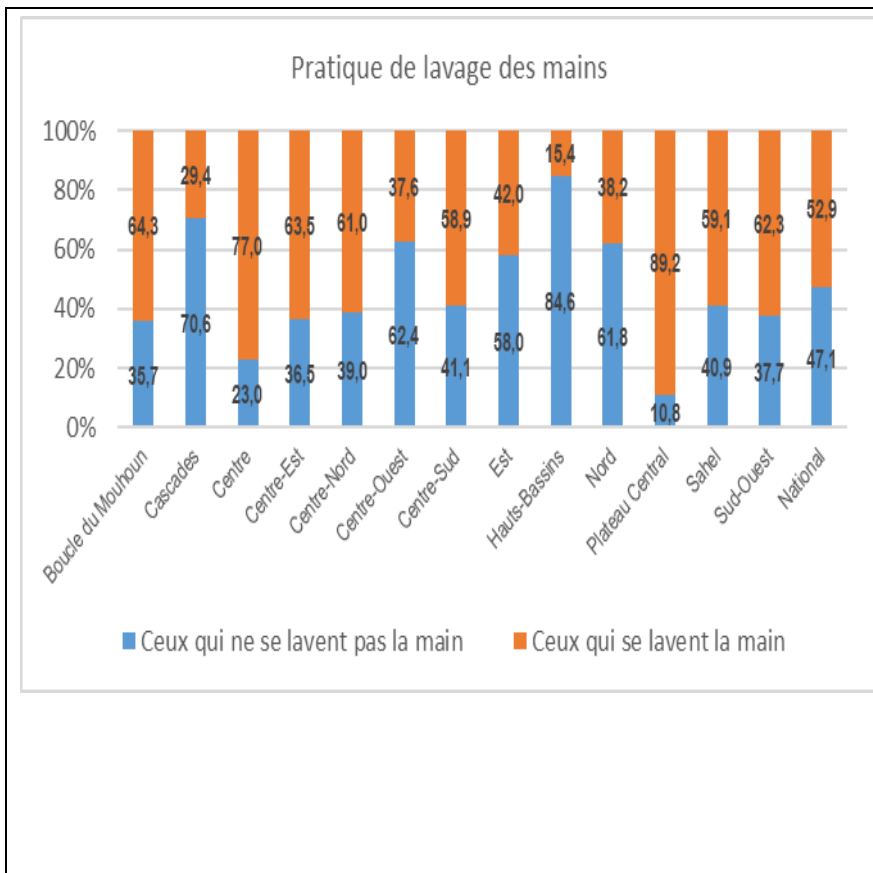

Sur 37 917 ménages interrogés sur les pratiques de lavage de mains aux moments critiques principalement à la sortie des toilettes, 47,1% déclarent se laver les mains au savon ou à la cendre après usage des toilettes. Cinq régions (05) régions sur treize (Cascades, Centre-Ouest, l'Est, les Hauts-Bassins et le Nord) ont un taux supérieur à 50%. Comme en 2020, la région des Hauts-Bassins est en tête avec 84,6% tandis que celle du Plateau Central reste toujours en dernière position avec seulement 10,8%. En 2020, les pratiques de lavages des mains avaient pris une progression ascendante grâce aux actions de sensibilisation sur les mesures barrières de lutte contre la Covid 19. Mais une régression de la pratique du lavage des mains a été constatée du fait de la diminution des sensibilisations à l'endroit de la population. Cela interpelle les acteurs à redoubler d'efforts dans les campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'hygiène.

Source : BD INOA, DGA 2021

**Figure 4 :** Situation de la pratique de lavage des mains par les ménages

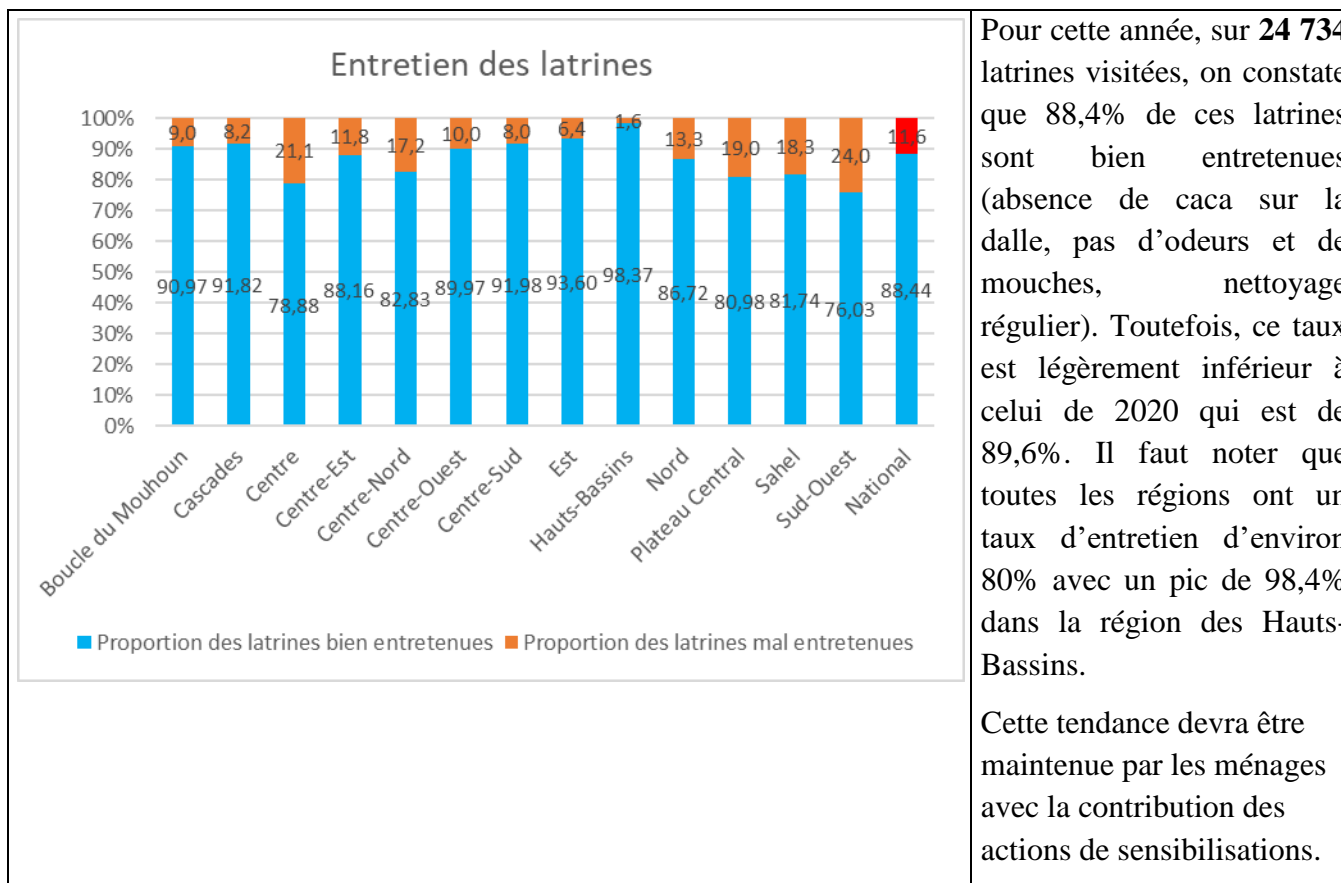

Source : BD INOA, DGA 2021

**Figure 5** : situation de l'entretien des latrines dans les ménages

**Tableau 65** : Proportion des latrines par acteur

Régions	Total (nombre de latrines réalisées)	Etat	Part Etat (%)	Autres acteurs (collectivités +ONG/AD)	Part autres acteurs (%)	Ménages	Part ménages (%)
Boucle du Mouhoun	1 776	938	52,8	456	25,7	382	21,5
Cascades	1 332	944	70,9	261	19,6	127	9,5
Centre	1 533	4	0,3	789	51,5	740	48,3
Centre-Est	985	31	3,1	605	61,4	349	35,4
Centre-Nord	2 085	440	21,1	1251	60,0	394	18,9
Centre-Ouest	3 895	691	17,7	1965	50,4	1239	31,8
Centre-Sud	3 429	1009	29,4	2169	63,3	251	7,3
Est	2 761	592	21,4	1609	58,3	560	20,3
Hauts-Bassins	1 273	424	33,3	643	50,5	206	16,2
Nord	1 746	274	15,7	1178	67,5	294	16,8
Plateau Central	488	195	40,0	187	38,3	106	21,7
Sahel	950	365	38,4	479	50,4	106	11,2
Sud-Ouest	1 305	855	65,5	248	19,0	202	15,5
<b>Total national</b>	<b>23 558</b>	<b>6 762</b>	<b>28,7</b>	<b>11 840</b>	<b>50,3</b>	<b>4 956</b>	<b>21,0</b>

Source : BD INOA 2021

Sur un total de 23 558 latrines familiales réalisées (réhabilitations y compris), l'effort de l'Etat est de 28,7% soit 6 762 latrines. Ce nombre est légèrement supérieur à celui de 2020 qui était de 6 355 latrines. En ce qui concerne les autres acteurs (collectivités et ONG/AD) leur part de réalisations s'élève à 11 840 latrines soit 50,3% du total annuel. Ce nombre est largement inférieur à celui de 2020 qui était de 29 485 latrines soit 60% de moins. Cela pourrait s'expliquer du fait de l'aggravation de la situation sécuritaire en 2021 qui a restreint d'une part l'accès à certains sites de travaux et d'autre part, l'intervention des acteurs dans le développement au profit de l'humanitaire. Les latrines non subventionnées (autoréalisations) sont au nombre de 4956 soit 21%. Ce taux traduisant l'effort de la population est largement supérieur à celui de 2020 qui était de 10%. Dans un contexte d'amenuisement des financements, l'Etat devra doubler d'effort dans la mise en œuvre du programme en vue de déresponsabiliser progressivement les partenaires au développement, contre une montée progressive des financements internes dans l'optique de la pérennité et de la durabilité. Aussi, des efforts doivent toujours être consentis dans la communication pour le changement de comportement des populations afin de susciter davantage les autoréalisations.

**Tableau 66** : Situation de l'état de Fin de défécation à l'air libre

Régions	Nombre de villages de la région (a)	Nombre de villages déclenchés	Nombre de villages déclarés FDAL (b)	Nombre de villages certifiés FDAL (c)	Taux de villages déclarés FDAL (b/a*100)	Taux de villages certifiés FDAL (c/a*100)
Boucle du Mouhoun	984	244	7	1	0,7	0,1
Cascades	291	157	1	1	0,3	0,3
Centre	187	44	0		0,0	0,0
Centre-Est	750	551	7	4	0,9	0,5
Centre-Nord	966	216	27	8	2,8	0,8
Centre-Ouest	594	240	159	151	26,8	25,4
Centre-Sud	538	178	0		0,0	0,0
Est	842	453	257	137	30,5	16,3
Hauts-Bassins	484	220	0		0,0	0,0
Nord	915	198	12		1,3	0,0
Plateau Central	582	102	0		0,0	0,0
Sahel	699	201	115	39	16,5	5,6
Sud-Ouest	1068	58	5	5	0,5	0,5
<b>Total</b>	<b>8900</b>	<b>2862</b>	<b>590</b>	<b>346</b>	<b>6,6</b>	<b>3,9</b>

Source : BD INOA, DGA 2021

D'une manière générale, le taux de déclaration FDAL est faible au regard du nombre bas de villages déclarés FDAL. Les régions du Centre-Ouest, de l'Est et du Sahel ont les plus forts taux de déclaration FDAL.

Toutefois, quatre (04) régions à savoir le Centre, le Centre-Sud, les Hauts-Bassins et le Plateau Central n'ont toujours pas enregistré de villages ayant mis fin à la défécation à l'air libre. Dans ces



régions, plusieurs acteurs ont entamé le processus de l'abandon de la Défécation à l'Air Libre sans pour autant l'achever. Aussi, les acteurs ont plus mis l'accent ces dernières années sur la relance des villages abandonnés avant certification. Il est nécessaire de poursuivre les sensibilisations et le suivi des communautés afin d'atteindre le statut FDAL des villages touchés par l'ATPC. Nous observons la même tendance au niveau de la certification.

**Tableau 67** : Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural

Regions	Ecoles			Centre de santé		
	Nombre d'écoles (a)	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (b)	Taux (%) (b/a)	Nombre de CSPS (c)	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (d)	Taux (%) (d/c)
Boucle du Mouhoun	1 099	898	81,7	172	136	<b>79,1%</b>
Cascades	576	486	84,4	103	99	<b>96,1%</b>
Centre	514	475	92,4	56	54	<b>96,4%</b>
Centre-Est	1 049	898	85,6	187	152	<b>81,3%</b>
Centre-Nord	983	878	89,3	105	96	<b>91,4%</b>
Centre-Ouest	1 186	1 039	87,6	233	231	<b>99,1%</b>
Centre-Sud	626	549	87,7	143	130	<b>90,9%</b>
Est	784	647	82,5	154	138	<b>89,6%</b>
Hauts-Bassins	962	754	78,4	177	164	<b>92,7%</b>
Nord	995	790	79,4	207	172	<b>83,1%</b>
Plateau Central	730	682	93,4	154	140	<b>90,9%</b>
Sahel	200	179	89,5	123	110	<b>89,4%</b>
Sud-Ouest	833	627	75,3	139	124	<b>89,2%</b>
<b>National</b>	<b>10 537</b>	<b>8 902</b>	84,5	1953	1746	<b>89,4%</b>

Source : Rapports bilan régionaux, 2021

Le taux d'équipement des écoles a évolué de 76,1% en 2020 à 84,5% en 2021 pour une cible de 77%, qui est donc atteinte. Les taux varient de 75,3% dans la région du Sud-Ouest à 93,4% au Plateau Central.

Quant aux CSPS, le taux d'équipement a progressé de 0,7 points pourcentage, passant de 88,7% en 2020 à 89,4% en 2021. La cible de 2021 fixée à 89% est donc atteinte. On note que le plus faible taux d'équipement des centres de santé est observé dans la région de la Boucle du Mouhoun (79,1%) et le plus fort taux dans la région du Centre Ouest (99,1%). Cet élan devra être soutenu par les acteurs et accompagné par le développement et la mise en place de mécanismes de gestion adéquats des latrines dans les institutions (écoles et centres de santé) et les lieux publics.

**Tableau 68:** Situation de l'accessibilité des latrines aux handicapés

Régions	Latrines institutionnelles et publiques en 2016-2020			Latrines institutionnelles et publiques en 2021		
	Nombre total de blocs	Nombre total de cabines pour handicapés	Taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapé (%)	Nombre total de blocs	Nombre total de cabines pour handicapés	Taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapé (%)
Boucle du Mouhoun	632	57	9	149	10	6,7
Cascades	290	41	14,1	52	4	7,7
Centre	246	25	10,2	99	32	32,3
Centre-Est	410	43	10,5	86	8	9,3
Centre-Nord	535	177	33,1	190	37	19,5
Centre-Ouest	779	108	13,9	108	5	4,6
Centre-Sud	293	64	21,8	72	11	15,3
Est	516	144	27,9	161	49	30,4
Hauts-Bassins	583	108	18,5	83	1	1,2
Nord	540	45	8,3	108	26	24,1
Plateau Central	469	33	7	79	5	6,3
Sahel	733	222	30,3	23	8	34,8
Sud-Ouest	412	12	2,9	74	4	5,4
<b>Total</b>	<b>6438</b>	<b>1079</b>	<b>16,8</b>	<b>1284</b>	<b>200</b>	<b>15,6</b>

Source DGA, 2021

Ceci est un aperçu de la situation de l'équipement des blocs de latrines institutionnelles et publiques en cabines pour handicapé de 2016 à 2020. Notons que cette situation est non exhaustive si on considère l'assainissement institutionnel et public dans son ensemble. Cette situation nous donne juste une idée sur l'attitude adoptée quant à l'inclusion des personnes handicapées dans la réalisation des ouvrages d'assainissement institutionnel et public. Le taux moyen d'équipement de blocs en cabines pour handicapé sur la période considérée est de 16,8% soit moins du quart (25%) des ouvrages réalisés donc un taux très faible et aussi très loin de la norme exigée qui est de 100%. En 2021, le taux d'équipement de blocs en cabines pour handicapé varie de 1,2 à 34,8% avec un taux moyen national de 15,6%. Ce taux est inférieur au taux moyen des cinq dernières années et est négligeable par rapport à la norme qui est de 100%.


## 7.2 Assainissement en milieu urbain

**Tableau 69** : taux d'accès 2021 par région en milieu urbain

Région	Communes concernés	Réalisations 2021	Cumule réalisations depuis 2021	Populations totales desservies en 2021	Taux (%)
Boucle du Mouhoun	Dédougou, Toma, Tougan, Boromo, Nouna, Solenzo	746	746	85 364	36,9
Cascades	Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou	315	315	49 798	27,5
Centre	Ouagadougou, Saaba, Pabré	11 297	11 297	1 468 166	50,0
Centre-Est	Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga	926	926	83 144	24,9
Centre-Nord	Kaya, Kongoussi, Boulsa	823	823	68 834	30,8
Centre-Ouest	Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Fara, Poura	758	758	127 462	38,1
Centre-Sud	Manga, Kombissiri, Pô	-	-	29 268	33,1
Est	Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama	623	623	60 343	37,6
Hauts-Bassins	Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé	2 723	2 723	425 122	36,0
Nord	Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy	959	959	102 433	37,1
Plateau-Central	Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho	251	251	24 223	20,7
Sahel	Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba	-	-	38 968	20,2
Sud-Ouest	Diébougou, Gaoua	74	74	39 487	31,8
<b>Total national</b>		<b>19 495</b>	<b>19 495</b>	<b>2 602 612</b>	<b>40,8</b>

Source : ONEA, 2021


En 2021, le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain est de 40,4%, supérieure à celui de 2020 qui était de 38,6% mais la cible de 2021 fixé à 42% n'est pas atteinte. Ce taux varie de 21,4% dans les zones urbaines du Plateau Central à 49,7% dans la région du Centre-Ouest. Nous observons que toutes les régions ont un taux en-dessous de 50%.

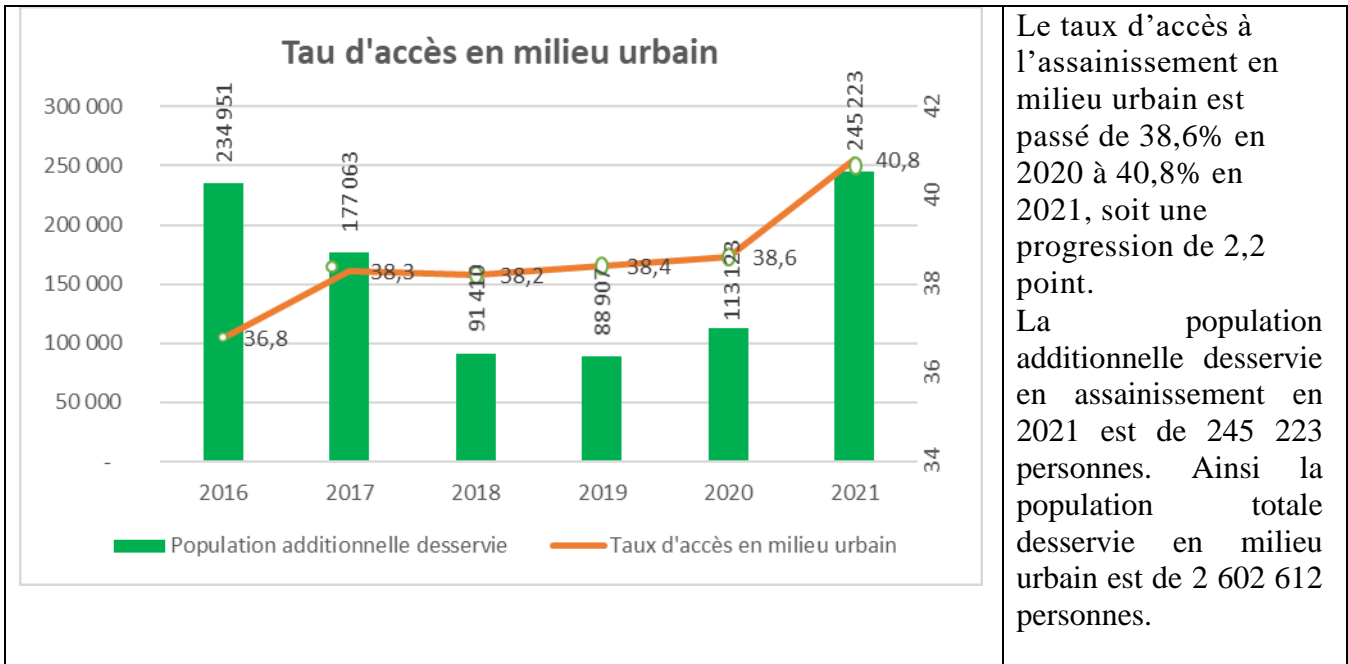

**Figure 6:** Evolution du taux d'accès en milieu urbain


## 7.3 Assainissement national

Figure 7: Taux globaux de l'assainissement

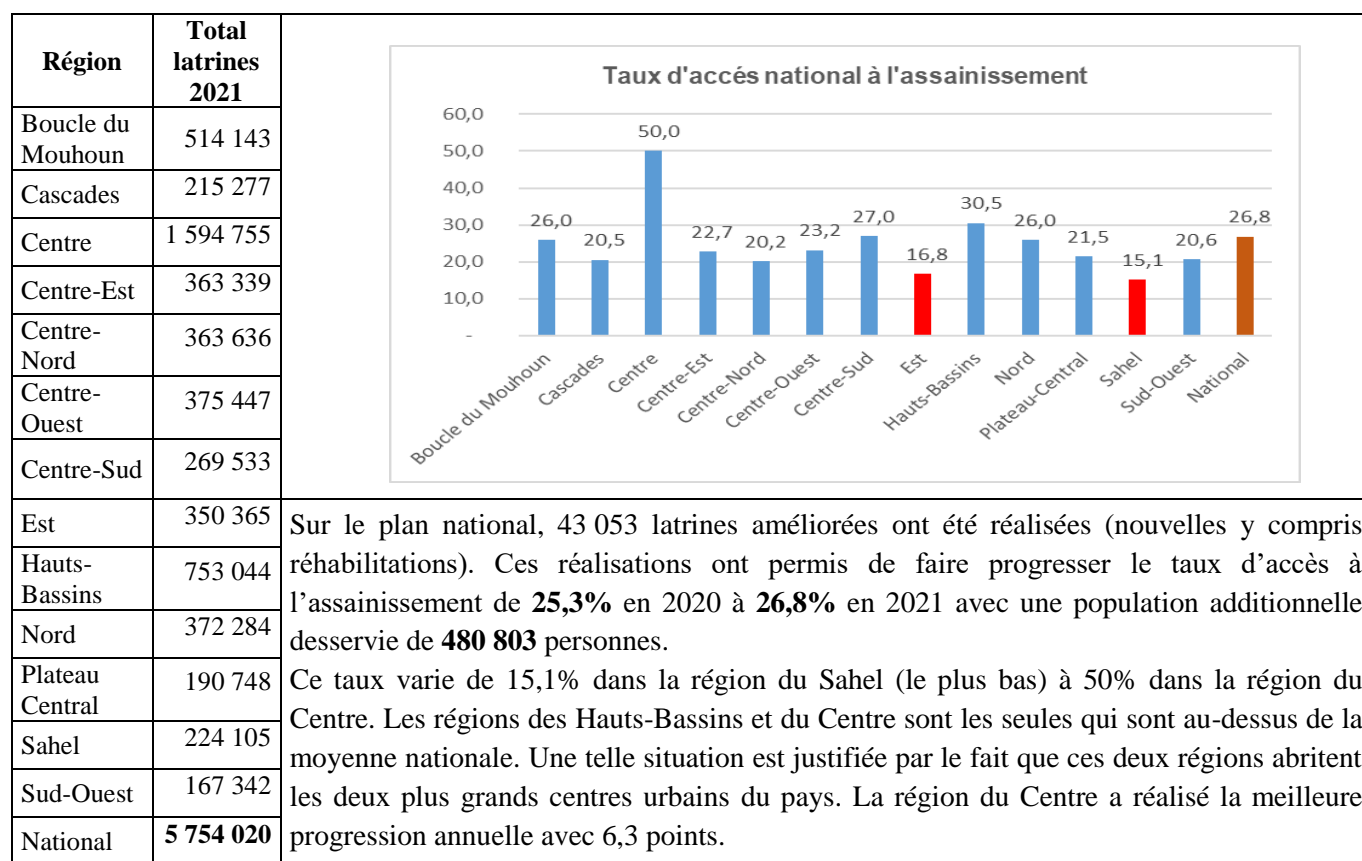

Source : BD INOA 2021, ONEA 2021

Figure 8: Evolution du taux d'accès national

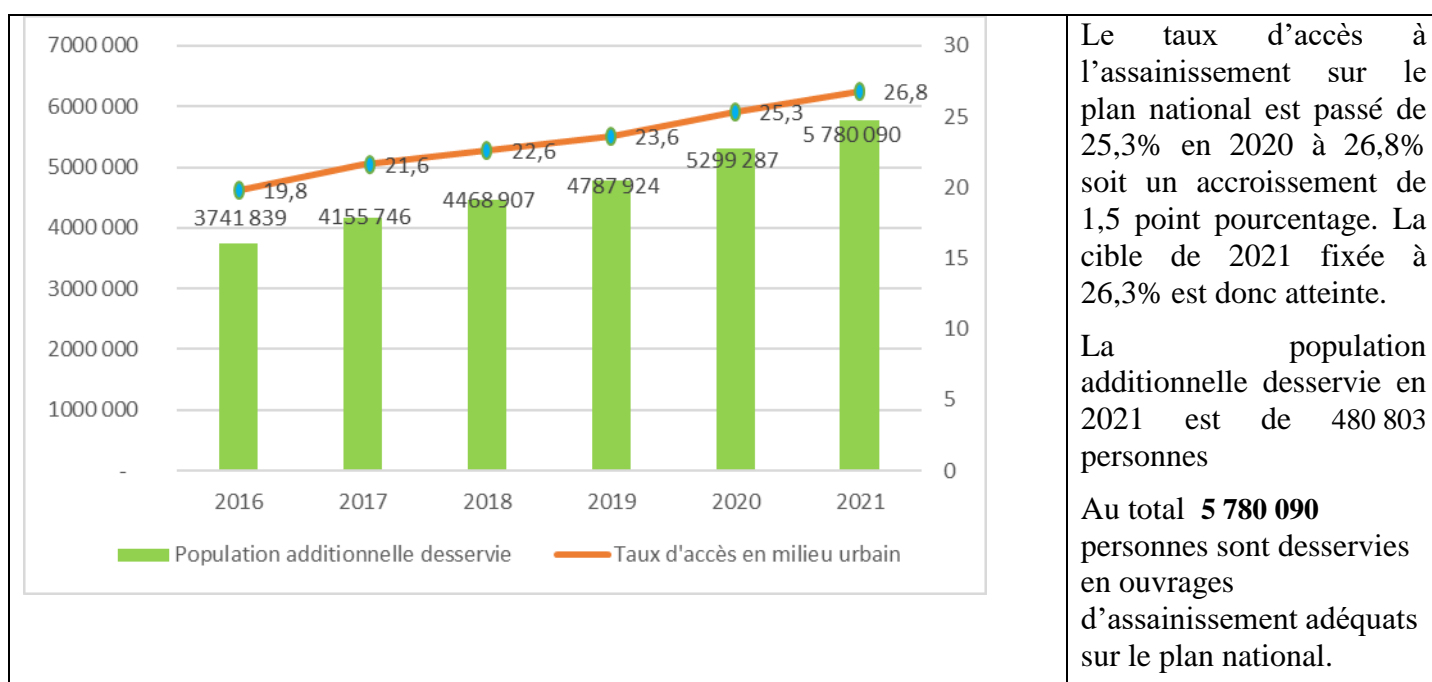

Source : DGA 2021

**Tableau 70: synthèse des ouvrages AEUE**

Milieu	Latrines institutionnelles et publiques			Latrines familiales			Puisards domestiques			STBV			extension du réseau d'assainissement (Km)			Raccordement au réseau d'assainissement (nombre)		
	Planification 2021-2025(a)	Réalisations 2021 (b)	Taux de progression (%) (c=b/a*100)	Planification 2021-2025(a)	Réalisations 2021 (b)	Taux d'atteinte (%) (c=b/a*100)	Planification 2021-2025(a)	Réalisations 2021 (b)	Taux d'atteinte (%) (c=b/a*100)	Planification 2021-2025(a)	Réalisations 2021 (b)	Taux d'atteinte (%) (c=b/a*100)	Planification 2021-2025(a)	Réalisations 2021 (b)	Taux d'atteinte (%) (c=b/a*100)	Planification 2021-2025(a)	Réalisations 2021 (b)	Taux d'atteinte (%) (c=b/a*100)
Rural	5 500	1284	23,3	212 817	23 558	11,1	100 000	3 254	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urbain	1500	206	13,7	105000	19495	18,6	124500	12900	10,4	20	0	0,0	30	0	0,0	750,0	0	0,0
National	7 000	1 490	21,3	317 817	43 053	13,5	224 500	16 154	7,2	20	0	-	30	0	0,0	750,0	0,0	0,0

L'analyse comparée de la planification et la réalisation des ouvrages d'assainissement montre un niveau de progression moyen vers les cibles pour les latrines institutionnelles et publiques avec plus du 1/5<sup>ème</sup>. (plus de 20%) déjà réalisé. Les autres types d'ouvrages ont un niveau de réalisation en deçà de la progression annuelle c'est-à-dire au moins 20% chaque années. Les planifications de l'assainissement collectif enregistrent un taux nul de réalisation pour cette première année de mise en œuvre du plan d'action 2021-2025 du PN-AEUE

Au regard de cette faible performance enregistrée pour cette 1<sup>ère</sup> années, l'ensemble des acteurs doivent doubler d'effort dans les années à venir pour résorber les gaps afin d'atteindre les cibles fixées en 2025.

**Tableau 71:** situation des indicateurs de performance du PN-AEUE

<b>Indicateur</b>	<b>Réalisation 2020</b>	<b>Cible 2021</b>	<b>Réalisation 2021</b>	<b>Commentaire</b>
Taux d'accès national à l'assainissement	25,3	26,3	26,8	-
Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural	19,9	21,4	21,0	La cible de cet indicateur n'est pas atteinte pour diverses raisons dont la principale est la dégradation de la situation sécuritaire.
Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain	38,6	42	40,8	-
Nombre de villages touchés par le déclenchement (annuellement)	173	250	279	279 villages ont été déclenchés en 2021 portant le nombre total de villages déclenchés à 2862.
Proportion de village déclarés FDAL (%)	20,4	25	20,6	Au total 590 villages ont été déclarés FDAL sur 2862 villages déclenchés sur le territoire national
Taux d'équipement des écoles en latrine	76,1	77	84,5	-
Taux d'équipement des centres de santé en latrine	88,7	89	89,4	-
Nombre de sites de dépotages réalisés	0	8	0	-
Nombre de latrines familiales hygiéniques construites en milieu péri-urbain	Données non collectées par l'ONEA	8 000	-	

Source : DGA 2021



## 8 FINANCEMENT DU PROGRAMME

**Tableau 72** : Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA)

Coût Total du PN-AEUE 2016-2030 (en milliards)	Financement acquis 2016-2020 (en milliards)	Taux de mobilisation par rapport au plan d'action 2016-2020	Coût du plan d'action 2021-2025 en milieu rural (en milliards)	Financement acquis du plan d'action 2021-2025 (année 2021)	Taux de mobilisation du plan d'action 2021-2025	Montant total réalisé depuis 2016 à 2021	Taux global de réalisation depuis la mise en œuvre du PN-AEUE
(a)	(b)	$c = b/a * 100$	d	(e)	$f = e/d * 100$	$g = b + e$	$h = g/a * 100$
<b>1 215,945</b>	<b>79,01</b>	<b>6,5%</b>	<b>151,758</b>	<b>11,074</b>	<b>7,3%</b>	<b>90,080</b>	<b>7,4%</b>

Source : DGA 2019

**9.1 Principaux freins**

**Tableau 73:** Difficultés et propositions de solutions

<b>Difficultés rencontrées</b>	<b>Propositions de solutions</b>	<b>Responsables</b>
Insuffisance de ressources humaines qualifiées	Renforcer les compétences et le personnel du service en charge du volet eau potable et assainissement dans certaines communes	Partenaires ; MEA
Insuffisance de ressources financières	Allouer plus de ressources financières aux communes dans le domaine de l'assainissement. Développer des mécanismes endogènes de mobilisation des finances.	Partenaires ; Ministères en charge de l'eau ; de la santé, de l'éducation, Collectivités territoriales
Non mise à disposition de données relatives à la situation physique et financière par certains acteurs	Renforcer la collaboration entre acteurs pour la mise à disposition de leurs bilans et programmations à bonne date	Partenaires ; MEA
Difficultés d'accès liées au contexte sécuritaire dans certaines localités de la région	Orienter les réalisations/ réhabilitations des ouvrages d'assainissement vers les sites plus accessibles et dans les familles d'accueil des déplacés internes	MEA, Partenaires
Faible appropriation de l'assainissement familial par les populations	Mettre l'accent sur les activités d'intermédiation sociale.	MEA, Partenaires
Le volet assainissement n'est pas considéré comme une priorité par les communes.	Faire un déclenchement institutionnel des autorités au niveau communal, provincial et régional	MEA, DREA, Partenaires
Manque de personnels qualifiés en eau, hygiène et assainissement dans certaines mairies.	Apporter l'appui nécessaire aux communes pour assurer leur rôle de maître d'ouvrages.	MEA, DREA, Partenaires
Non-respect des documents stratégiques en matière d'assainissement dans l'intervention de certains acteurs	Organiser des ateliers de coordination et de vulgarisation des différents documents	DGA, DREA
Défaillance de certaines entreprises dans l'exécution des travaux	Plus de rigueur et de vigilance dans le recrutement des entreprises, appliquer les sanctions réservées aux entreprises défaillantes Assurer la mise en œuvre de l'AMOC	Communes, MEA
Multiplicité des acteurs sur un même site avec des approches différentes	Maintenir activement les cadres de concertation	MEA, DREA
Des PCD-AEPA de plusieurs communes échus	Mettre à jour les PCD tout en intégrant le volet AEPA	Communes, PTF
Faible montant de ressources financières transférées aux communes	Développer des stratégies de mobilisation des ressources Augmenter le montant des ressources transférées	Etat, Partenaires

Source : DGA, DREA 2021

La principale difficulté est la situation sécuritaire qui a entravé la bonne exécution des activités du programme.

Aussi on note une faible mobilisation des ressources financières, ainsi que l'inflation des prix des matériaux de construction.

---

## 10 RECOMMANDATIONS

---

Les recommandations sont les suivantes :

**Ordre général :**

- Développer des méthodes innovantes de mobilisation de ressources pour le financement des activités WASH ;
- Renforcer les capacités des acteurs communaux sur leur rôle dans la mise en œuvre du PN-AEUE et le suivi des réalisations ;

**A l'endroit des partenaires techniques et financiers (PTF) :**

- Investir plus dans les activités de sensibilisation à travers l'ImS pour influencer le changement de comportement des populations en milieu rural sur les questions d'hygiène et d'assainissement ;
- Avoir une synergie d'action avec les services techniques dans la mise en œuvre et le suivi des activités pour permettre un meilleur suivi et une bonne capitalisation des données.

**A l'endroit des communes :**

- Veiller à la gestion des ouvrages d'assainissement dans les institutions et lieux publics en les confiant à des gestionnaires privés ou à un responsable dédié de la structure afin d'assurer leur durabilité.

---

## 11 CONCLUSION

---

En milieu rural, pour l'année 2021, le bilan physique des réalisations des ouvrages d'assainissement est assez satisfaisant. On note la réalisation de **23 558** latrines familiales, **1 284** latrines institutionnelles et publiques ainsi que la réalisation de **3 254** puisards. Ces réalisations ont permis de desservir 235 580 personnes supplémentaires portant le taux d'accès à l'assainissement à 21% pour une cible de 21,4%.

Quant à l'éradication de la défécation à l'air libre, **67** villages supplémentaires ont été déclarés FDAL et **12** nouveaux certifiés portant ainsi le nombre de villages certifiés à **346** soit un taux de certification de **3,9%**. Cela a permis également de porter le nombre de villages déclarés FDAL à **590** soit un taux de déclaration FDAL de **6,6%** pour une cible de 25%.

Plusieurs actions de sensibilisations de proximité dans les ménages, les lieux institutionnels et publics, ont permis de toucher **774 212** personnes dont 47% (366 248) de femmes et de filles, dans **52 825** ménages, dans **259** écoles et centres de formation, **26** centres de santé et **338** lieux publics.

En milieu urbain, le nombre de latrines familiales réalisées est de **19 495**, **206** latrines institutionnelles et publiques et **12 900** puisards. Ces réalisations ont permis de desservir 2 602 612 personnes additionnelles. Le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain est passé de 38,6% en 2020 à **40,8%** en 2021 soit une progression de **2,2** point. La cible de **42%** n'est donc pas atteinte.

Sur le plan national, au total **43 053** latrines familiales ont été réalisées, **1 490** latrines institutionnelles et publiques et **16 154** puisards. Ces réalisations ont permis de porter le taux d'accès national à l'assainissement à **26,8%** contre une cible de **26,3%** qui est donc atteinte.

La population desservie en assainissement au Burkina Faso est de **5 780 090 personnes sur une population totale de 21 541 506**.

Il faut noter que la mise en œuvre des activités s'est déroulée dans un contexte national particulièrement difficile marqué par l'insécurité ayant occasionné des restrictions et/ou des régulations budgétaires de l'Etat. A cette difficulté, on peut ajouter l'insuffisance de suivi des activités surtout en fin d'année, qui ne favorise pas la collecte effective de l'information relative à toutes les activités menées sur le terrain, créant ainsi une insuffisance dans la performance ; d'où la non atteinte de certains des indicateurs.

## ANNEXES

**Tableau 74:** Evolution du taux d'accès par province en milieu rural

REGIONS	PROVINCES	Réalisations 2020	Population totale desservie 2020	Population projetée 2020	Taux d'accès 2020	Réalisations 2021	Population totale desservie 2021	Population projetée 2021	Taux d'accès 2021
BOUCLE DU MOUHOUN	BALE	1760	142520	257109	55,4	556	148080	262071	56,5
	BANWA	261	65715	332698	19,8	346	69175	339119	20,4
	KOSSI	1196	62177	333445	18,6	296	65137	339880	19,2
	MOUHOUN	1732	70493	342434	20,6	187	72363	349042	20,7
	NAYALA	201	28259	198316	14,2	258	30839	202144	15,3
	SOUROU	1443	46573	266743	17,5	133	47903	271891	17,6
	Région	6593	415737	1730744	24,0	1776	433497	1764147	24,6
CASCADES	COMOE	2048	93129	585972	15,9	860	101729	613396	16,6
	LERABA	1731	55829	227903	24,5	472	60549	238569	25,4
	Région	3779	148958	813875	18,3	1332	162278	851964	19,0
CENTRE	KADIOGO	1348	90570	207183	43,7	1533	105900	208861	50,7
CENTRE EST	BOULGOU	1046	85767	563372	15,2	412	89887	574414	15,6
	KOULPELOGO	274	89344	328767	27,2	170	91044	335211	27,2
	KOURITENGA	152	88310	317003	27,9	403	92340	323217	28,6
	Région	1472	263421	1209142	21,8	985	273271	1441702	19,0
CENTRE NORD	BAM	847	81248	352727	23,0	822	89468	360981	24,8
	NAMENTENGA	2306	92537	428450	21,6	619	98727	438475	22,5

REGIONS	PROVINCES	Réalisations 2020	Population totale desservie 2020	Population projetée 2020	Taux d'accès 2020	Réalisations 2021	Population totale desservie 2021	Population projetée 2021	Taux d'accès 2021
	SANMATENGA	2246	105579	781915	13,5	644	112019	800212	14,0
	Région	5399	279364	1563092	17,9	2085	300214	1599669	18,8
CENTRE OUEST	BOULKIEMDE	647	85209	519852	16,4	1280	98009	530041	18,5
	SANGUIE	366	65802	336403	19,6	679	72592	342996	21,2
	SISSILI	553	41383	243735	17,0	115	42533	248512	17,1
	ZIRO	336	28993	211653	13,7	1821	47203	215801	21,9
	Région	1902	221387	1311642	16,9	3895	260337	1337350	19,5
CENTRE SUD	BAZEGA	3902	84311	324285	26,0	1406	98371	333949	29,5
	NAHOURI	1522	28055	209013	13,4	924	37295	215242	17,3
	ZOUNDWEOGO	4360	91015	340758	26,7	1099	102005	350913	29,1
	Région	9784	203381	874057	23,3	3429	237671	900104	26,4
EST	GNAGNA	77	147944	640915	23,1	837	156314	662706	23,6
	GOURMA	586	43840	431393	10,2	1344	57280	446061	12,8
	KOMANDJOARI	0	7717	122380	6,3	70	8417	126541	6,7
	KOMPIENGA	53	21076	109638	19,2	129	22366	113365	19,7
	TAPOA	26	38590	535220	7,2	381	42400	553418	7,7
	Région	742	259167	1839545	14,1	2761	286777	1902090	15,1
HAUTS BASSINS	HOUET	1205	141498	677811	20,9	789	149388	695841	21,5
	KENEDOUGOU	2668	115953	377625	30,7	319	119143	387669	30,7
	TUY	717	80821	272951	29,6	165	82471	280212	29,4
	Région	4590	338271	1328387	25,5	1273	351001	1363722	25,7

REGIONS	PROVINCES	Réalisations 2020	Population totale desservie 2020	Population projetée 2020	Taux d'accès 2020	Réalisations 2021	Population totale desservie 2021	Population projetée 2021	Taux d'accès 2021
NORD	LOROUM	124	21276	140696	15,1	54	21816	141990	15,4
	PASSORE	1268	77343	331930	23,3	173	79073	334984	23,6
	YATENGA	1009	123163	536897	22,9	1328	136443	541836	25,2
	ZONDOMA	185	37162	161690	23,0	191	39072	163177	23,9
	Région	2586	258944	1171213	22,1	1746	276404	1181988	23,4
PLATEAU CENTRAL	GANZOURGOU	320	63055	351318	17,9	64	63695	355358	17,9
	KOURWEOGO	71	30579	156113	19,6	264	33219	157909	21,0
	OUBRITENGA	115	69303	258267	26,8	160	70903	261237	27,1
	Région	506	162936	765698	21,3	488	167816	774504	21,7
SAHEL	LOUDALAN	2	23192	276206	8,4	156	24752	283995	8,7
	SENO	168	52511	360303	14,6	410	56611	370464	15,3
	SOUM	357	76492	448301	17,1	304	79532	460943	17,3
	YAGHA	170	32120	230659	13,9	80	32920	237163	13,9
	Région	697	184313	1315468	14,0	950	193813	1352564	14,3
SUD OUEST	BOUGOURIBA	78	29061	104489	27,8	402	33081	106182	31,2
	IOBA	236	27325	219809	12,4	327	30595	223370	13,7
	NOUMBIEL	15	26956	75066	35,9	75	27706	76282	36,3
	PONI	97	32107	280872	11,4	501	37117	285422	13,0
	Région	426	115449	680236	17,0	1305	128499	691255	18,6
<b>BURKINA FASO</b>		<b>39824</b>	<b>2941898</b>	<b>14810282</b>	<b>19,9</b>	<b>23558</b>	<b>3177478</b>	<b>15161060</b>	<b>21,0</b>
