

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,  
DE L'EAU ET DE  
L'ASSAINISSEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE  
DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX  
USEES ET EXCRETA

BURKINA FASO  
-----  
Unité – Progrès - Justice

## PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA



**RAPPORT-BILAN NATIONAL ANNUEL 2022**

*Avril 2023*

## SOMMAIRE

<b>RESUME EXECUTIF</b>	<b>8</b>
<b>1 INTRODUCTION</b>	<b>11</b>
<b>2 METHODOLOGIE</b>	<b>11</b>
<b>3 PRESENTATION DU PN-AEUE</b>	<b>13</b>
<b>3.1 Objectifs</b>	<b>13</b>
<b>3.2 Rappel des points clés de la session à mi-parcours de 2022</b>	<b>13</b>
<b>3.3 Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente</b>	<b>13</b>
1314	
<b>4 BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2022</b>	<b>14</b>
<b>4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural</b>	<b>14</b>
Produit 1.1.1 : Les villages déclenchés à la phase 1 (2016-2020) sont certifiées FDAL	14
Produit 1.1.2 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans les villages (à partir de 2021)	16
Produit 1.1.3 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement	21
a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages	21
b) Sensibilisation de masse	<del>22</del> 23
c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)	<del>23</del> 24
d) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint	<del>25</del> 26
<b>4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain</b>	<b>30</b>
<b>4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain</b>	<b>30</b>
Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains	30
Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.	30
a) Formation et coordination	30
b) Sensibilisation de masse	30
c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)	31
d) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint en milieu urbain	32
<b>4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)</b>	<b>33</b>
Produit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	33
Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	40
Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural	46

<b>4.4</b>	<b>Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)</b>	<b>49</b>
<b>4.4.1.</b>	<b>Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement</b>	<b>49</b>
	Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	49
	Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	52
	Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain	53
<b>4.5</b>	<b>Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale</b>	<b>54</b>
<b>4.5.1</b>	<b>Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale</b>	<b>54</b>
	Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée	54
	Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur	<u>5756</u>
	Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal	<u>5857</u>
<b>4.6</b>	<b>Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b><u>5857</u></b>
<b>4.6.1</b>	<b>Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b><u>5857</u></b>
	Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes	<u>5857</u>
	Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta	<u>5857</u>
	Produit 3 : Les produits de la recherche améliorent les approches, les pratiques et les comportements en matière d'hygiène et d'assainissement	<u>5857</u>
<b>4.7</b>	<b>Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.</b>	<b><u>5857</u></b>
<b>4.7.1</b>	<b>Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur</b>	<b><u>5857</u></b>
	Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées	<u>5958</u>
	Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages	<u>6059</u>
	Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance	<u>6160</u>
	Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance	<u>6261</u>
<b>5</b>	<b>BILAN FINANCIER</b>	<b><u>6867</u></b>
<b>5.1</b>	<b>Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural</b>	<b><u>6867</u></b>

<b>5.2 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement</b>	<b>7170</b>
<b>5.3 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement</b>	<b>7170</b>
<b>5.4 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement</b>	<b>8481</b>
<b>5.5 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale</b>	<b>8784</b>
<b>5.6 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta</b>	<b>8885</b>
<b>5.7 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur</b>	<b>8986</b>
<b>6 SUIVI DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES</b>	<b>9188</b>
<b>7 analyse des performances et evolution des indicateurs</b>	<b>9491</b>
<b>7.1 Assainissement en milieu rural</b>	<b>9491</b>
<b>7.2 Assainissement en milieu urbain</b>	<b>10198</b>
<b>7.3 Assainissement national</b>	<b>10299</b>
<b>8 FINANCEMENT DU PROGRAMME</b>	<b>105101</b>
<b>9 PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS</b>	<b>107103</b>
<b>9.1 Principaux freins</b>	<b>107103</b>
<b>10 CONCLUSION</b>	<b>108104</b>
<b>ANNEXES</b>	<b>109105</b>

#### LISTE DES TABLEAUX

<b>Tableau 1 : Récapitulatif des résultats au 30 juin 2022</b>	<b>13</b>
<b>Tableau 2: Mise en œuvre des recommandations de la dernière session</b>	<b>14</b>
<b>Tableau 3: Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action</b>	<b>14</b>
<b>Tableau 4 : déclaration et certification de villages déclenchés sur la période 2016-2020</b>	<b>1415</b>
<b>Tableau 5 : situation de l'ATPC dans les villages pour l'année 2022</b>	<b>16</b>
<b>Tableau 6: évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC</b>	<b>17</b>
<b>Tableau 7 : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC</b>	<b>19</b>
<b>Tableau 8 : formation et coordination</b>	<b>21</b>
<b>Tableau 9: Activités de sensibilisations de masse</b>	<b>2223</b>
<b>Tableau 10: sensibilisation dans les ménages</b>	<b>2324</b>
Tableau 11: Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation	2526
Tableau 12: Sensibilisation/communication de masse : synthèse dans les institutions et lieux publics	2728
<b>Tableau 13: Activités de sensibilisations de masse</b>	<b>30</b>

<b>Tableau 14:</b> Sensibilisation/communication de masse dans les institutions et lieux publics _____	32
<b>Tableau 15:</b> opérations pré-réalisation de latrines familiales _____	33
<b>Tableau 16:</b> Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural _____	35
<b>Tableau 17:</b> Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural _____	37
<b>Tableau 18 :</b> Situation des latrines semi-finies _____	37
<b>Tableau 19:</b> Situation de réalisation et de réhabilitation latrines familiales _____	38
<b>Tableau 20:</b> Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques _____	39
<b>Tableau 21:</b> opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques ____	40
<b>Tableau 22:</b> Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation _____	41
<b>Tableau 23:</b> Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles _____	42
<b>Tableau 24:</b> Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé _____	44
<b>Tableau 25:</b> Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics ____	45
<b>Tableau 26 :</b> Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI _____	46
<b>Tableau 27 :</b> Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI _	46
<b>Tableau 28:</b> Formation et suivi _____	47
<b>Tableau 29 :</b> latrines suivies dans le cadre de leur gestion _____	48
<b>Tableau 30:</b> Réalisations de latrines familiales en milieu urbain _____	49
<b>Tableau 31:</b> Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain _____	51
<b>Tableau 32:</b> Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation _____	52
<b>Tableau 33:</b> Réalisations de latrines dans les lieux publics et centres de santé _____	53
<b>Tableau 34 :</b> Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges et eaux usées _____	54
<b>Tableau 35 :</b> développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif _____	5756
<b>Tableau 36:</b> Extension du réseau collectif _____	5756
<b>Tableau 37 :</b> efforts des ménages _____	6059
<b>Tableau 38:</b> Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural _____	6160
<b>Tableau 39:</b> Voyages d'études et partage d'expérience réalisés _____	6362
<b>Tableau 40 :</b> autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur _____	6463
<b>Tableau 41 :</b> Cadres de concertation entres les acteurs _____	6665
<b>Tableau 42 :</b> Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit1+2) _____	6867
<b>Tableau 43 :</b> Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural (produit3 ) _____	6968
<b>Tableau 44 :</b> Taux d'exécution financière globale de l'Action 1 _____	7069
<b>Tableau 45 :</b> Taux d'exécution financière de l'Action 2 _____	7170
<b>Tableau 46 :</b> Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA) _____	7170
<b>Tableau 47 :</b> Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA) _____	7372
<b>Tableau 48 :</b> Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques _____	7473
<b>Tableau 49 :</b> Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles _____	7674
<b>Tableau 50:</b> Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé _____	7775
<b>Tableau 51 :</b> Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics _____	7876



<b>Tableau 52:</b> taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)	<u>8178</u>
<b>Tableau 53 :</b> Situation de l'exécution financière du produits 3 (en millions de FCFA)	<u>8279</u>
<b>Tableau 54:</b> Taux d'exécution financière de l'action 3	<u>8380</u>
<b>Tableau 55 :</b> Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses septiques	<u>8481</u>
<b>Tableau 56 :</b> Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain	<u>8582</u>
<b>Tableau 57:</b> Exécutions financières de l'action 5	<u>8784</u>
<b>Tableau 58:</b> Exécution financière des actions de la recherche	<u>8885</u>
<b>Tableau 59 :</b> Exécution financière de l'action	<u>8986</u>
<b>Tableau 60 :</b> Exécution financière globale du PN-AEUE	<u>9087</u>
<b>Tableau 61:</b> Suivi des procédures de passation des marchés publics : <b>Plan de passation des marchés</b>	<u>9188</u>
<b>Tableau 62:</b> Suivi des procédures de d'évolution des marchés publics : <b>état d'exécution des marchés</b>	<u>9289</u>
<b>Tableau 63:</b> Evolution du taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural par région	<u>9592</u>
<b>Tableau 64 :</b> Proportion des latrines par acteur	<u>9895</u>
<b>Tableau 65 :</b> Situation de l'état de Fin de défécation à l'air libre	<u>9896</u>
<b>Tableau 66 :</b> Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural	<u>9996</u>
<b>Tableau 67 :</b> taux d'accès 2022 par région en milieu urbain	<u>10198</u>
<b>Tableau 68:</b> situation des indicateurs de performance du PN-AEUE	<u>105101</u>
<b>Tableau 69 :</b> Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA)	<u>105101</u>
<b>Tableau 70:</b> Difficultés et propositions de solutions	<u>107103</u>
<b>Tableau 71:</b> Evolution du taux d'accès par province	<u>110106</u>

#### LISTES DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS

<b>Figure 1 :</b> Taux d'accès à l'assainissement familial en 2022 par région	<u>9491</u>
<b>Figure 2 :</b> évolution du taux d'accès et population additionnelle desservie	<u>9693</u>
<b>Figure 3 :</b> Situation de disponibilité de dispositif de lavage des mains (DLM)	<u>9693</u>
<b>Figure 4 :</b> Situation de la pratique de lavage des mains par les ménages	<u>9794</u>
<b>Figure 5 :</b> situation de l'entretien des latrines dans les ménages	<u>9794</u>
<b>Figure 6:</b> Evolution du taux d'accès en milieu urbain	<u>10299</u>
<b>Figure 7:</b> Taux globaux de l'assainissement	<u>10299</u>
<b>Figure 8:</b> Evolution du taux d'accès national	<u>104100</u>

## SIGLES ET ABREVIATIONS

<b>ABS</b>	: Appui Budgétaire Sectoriel
<b>ACF</b>	: Association Chant de Femme
<b>ADAE</b>	: Association pour le Développement des Adductions d'Eau
<b>AEP</b>	: Approvisionnement en eau potable
<b>AEPA</b>	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
<b>AEPHA</b>	: Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement
<b>AEUE</b>	: Assainissement des Eaux Usées et Excrétas
<b>AFDH</b>	: Approche Fondée sur les Droits Humains
<b>AMOC</b>	: Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communale
<b>ATPC</b>	: Assainissement Total Piloté par la Communauté
<b>ATPL</b>	: Assainissement Total Porté par les Leaders
<b>ASBC</b>	: Agents de Santé à Base Communautaire
<b>BD</b>	: Base de Données
<b>BPO</b>	: Budget Programme par Objectifs
<b>CADEPAC</b>	: Cellule d'Appui à la Décentralisation et à la Participation Citoyenne
<b>CAP</b>	: Connaissances Attitudes et Pratiques
<b>CCEA</b>	: Cadre de Concertation sur l'Eau et l'Assainissement
<b>CMP</b>	: Cadre de Mesure de Performance
<b>CNP</b>	: Comité National de Pilotage
<b>CRP</b>	: Comité Régional de Pilotage
<b>CSPS</b>	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
<b>CSD</b>	: Cadre Sectoriel de Dialogue
<b>CUCA</b>	: Cadre Unifié de Coordination de l'Assainissement
<b>CUI</b>	: Cadre Unifié d'Intervention
<b>DAL</b>	: Défécation à l'Air Libre
<b>DAO</b>	: Dossier d'Appel d'Offres
<b>DGA</b>	: Direction Générale de l'Assainissement
<b>DGESS</b>	: Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels
<b>DGEP</b>	: Direction Générale de l'Eau Potable
<b>DISE</b>	: Dispositif Intégré de Suivi Evaluation
<b>DPEA</b>	: Direction Provinciale de l'Eau et de l'Assainissement
<b>DREA</b>	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
<b>ENA</b>	: Enquête Nationale sur l'accès des ménages aux ouvrages d'Assainissement familiales
<b>ECOSAN</b>	: Ecological Sanitation (Assainissement Ecologique)
<b>FDAL</b>	: Fin de la Défécation à l'Air Libre
<b>GBV</b>	: Gestion des Boues de Vidange
<b>GEIS</b>	: Groupe Eau et Ingénierie Sociale
<b>GTEA</b>	: Groupe Thématique Eau et Assainissement
<b>IEC</b>	: Information-Education-Communication
<b>IMS</b>	: Intermédiation Sociale
<b>INOA</b>	: Inventaire National des Ouvrages d'Assainissement en milieu rural
<b>INSD</b>	: Institut National de la Statistique et de la Démographie
<b>LSF</b>	: Latrines Semi Finies
<b>MEA</b>	: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement
<b>MOC</b>	: Maitrise d'Ouvrage Communal

<b>OCADES</b>	: Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité
<b>ODD</b>	: Objectifs du Développement Durable
<b>OMD</b>	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
<b>ONEA</b>	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
<b>ONG</b>	: Organisation Non Gouvernementale
<b>PCD-AEPA</b>	: Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
<b>PEA/GIZ</b>	: Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande
<b>PGEA</b>	: Programme Gouvernance Eau et Assainissement
<b>PHA</b>	: Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement
<b>PHA-BID-UEMOA</b>	: Programme d'Hydraulique et Assainissement financement BID-UEMOA
<b>PN-AEPA</b>	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
<b>PN-AEUE</b>	: Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas
<b>PNDES</b>	: Plan National de Développement Economique et Sociale
<b>PNGT</b>	: Programme National de Gestion des Terroirs
<b>PPS</b>	: Programme Pilotage et Soutien
<b>PTF</b>	: Partenaire Technique et Financier
<b>RGPH</b>	: Recensement Général de la Population et de l'Habitat
<b>SAMOC</b>	: Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
<b>SNE</b>	: Stratégie Nationale de l'Eau
<b>STEP</b>	: Station d'Epuration
<b>STBV</b>	: Station de Traitement des Boues de Vidange
<b>TCM</b>	: Toilette à Chasse Manuelle
<b>TIC</b>	: Technologie de l'Information et de la Communication
<b>UNICEF</b>	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
<b>VIP</b>	: Ventilated Improved Pit (Latrines Améliorées à fosses ventilées)
<b>WHH</b>	: Welf Hunger Hilfe



---

## RESUME EXECUTIF

---

Au 31 décembre 2022, le bilan d'exécution des activités du Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AEUE) se résume ainsi qu'il suit :

### 1. Bilan physique

Dans l'ensemble, le taux d'exécution physique global du programme au 31 décembre 2022 est de **67,1%**. Les détails par action se présentent comme suit :

#### ❖ **Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural**

Pour l'année 2022, 368 villages ont été déclenchés, 121 villages déclarés FDAL et 79 villages ont été certifiés dont certains avaient été déclarés les années antérieures.

Au total 3 267 villages ont été déclenchés depuis la mise en œuvre de l'ATPC dont 782 déclarés FDAL et 420 certifiés FDAL. Ce qui permet d'obtenir un taux de certification de 4,7% et un taux de déclaration FDAL de 8,8%. En ce qui concerne les sensibilisations de masse, 734 émissions sur divers thèmes de l'hygiène et de l'assainissement ont été réalisées sur le territoire national. Concernant les sensibilisations de proximité dans les ménages, les lieux institutionnels et publics, 806 455 personnes ont été touchées dont 51% de femmes et filles.

Pour cette action, le taux d'exécution physique est de 67,3% et le taux d'exécution financière de 74,05%.

#### ❖ **Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain**

Les activités programmées au titre de cette action, se résument essentiellement au suivi des secteurs déclenchés dans les villes de Dano et de Léo pour l'obtention du statut FDAL, la formation des acteurs communaux dans les villes de Réo, Diébougou, Sabou et dans la zone d'intervention du PAEA, la production et la diffusion de spots radio dans les communes de Dori et de Gorom-Gorom sur des thèmes tels que le lavage des mains, l'hygiène de l'eau et COVID 19 en vue de susciter le changement de comportement en faveur de l'assainissement. En somme le taux d'exécution physique de cette action est estimé à 43,3% pour un taux d'exécution financière de 63,15% soit 61,5 millions de francs CFA liquidé.

#### ❖ **Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural**

Le bilan des réalisations se présente comme suit :

- 23 904 latrines familiales issues de la programmation de 46 753 soit un taux d'exécution de 52,4%. On note cependant, 2 908 latrines réalisées en hors programmation portant le total à 26 812 latrines réalisés en 2022 ;

- 167 latrines familiales réhabilitées dont 22 issues de la programmation soit un taux de réalisation de 7,7% ;
- 3356 puisards réalisés dont 1 993 issus de la programmation soit un taux d'exécution de 67,2% ;
- 723 latrines institutionnelles et publiques dont 387 issues de la programmation soit un taux d'exécution de 71,14%. De plus, 59 latrines institutionnelles et publiques ont été réhabilitées.

Ces réalisations ont permis d'obtenir un taux d'exécution physique de 63,3% et un taux d'exécution financière de 72,26%.

❖ **Action 4 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain**

Le bilan des réalisations se présente comme suit :

- 9 141 latrines familiales soit un taux d'exécution de 33,2% ;
- 7 273 puisards soit un taux d'exécution de 37,8% ;
- 347 latrines institutionnelles et publiques soit un taux d'exécution de 67,3%.

Ces réalisations ont permis d'aboutir à un taux d'exécution physique de l'action 4 de 46,8% avec un taux d'exécution financier de 35,7%.

❖ **Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

L'identification et l'organisation des vidangeurs ont été les principales activités menées par les acteurs. Ainsi 385 vidangeurs manuels et 03 vidangeurs mécaniques ont été identifiés dans la ville de Ouahigouya dans la région du Nord. Aussi, une étude diagnostique pour la réalisation d'une station de boue de vidange a été menée dans ladite région.

Les stations de traitement des boues de vidange dans les villes de Ouaga et de Bobo-Dioulasso ont permis de traiter 452800 m<sup>3</sup> de boues de vidange sur une prévision de de 452800 m<sup>3</sup> soit un taux de 100%. Il en est de même pour les eaux usées avec 3 033 millions de m<sup>3</sup> collectées et traitées.

Le taux d'exécution physique de l'action 5 est de 64,5% [avec un taux d'exécution financier de 45,4%](#).

❖ **Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta**

Dans le cadre du développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta un rapport d'étude sur la caractérisation des boues traités au niveau des STBV est attendue de validation. Le taux d'exécution de cette action est estimé à 75%.

❖ **Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur**

La situation des ressources mobilisées est la suivante :

- 47,027 millions au titre des fonds propres des collectivités ont été mobilisés dans la région du Centre ;
- 800 millions ont été transférés à 25 communes pour la promotion de l'assainissement en milieu rural. Aussi, un rapport d'évaluation de mise en œuvre du transfert des fonds depuis 2015 a été élaboré.
- Les rapports (annuels, semestriels, trimestriels) de mise en œuvre du programme ont été élaborés et validés à travers les différents cadres de concertation.

Le taux d'exécution de cette action est de 85,7% avec un taux financier est de 80,62%.

## 2. Bilan financier

Le taux d'exécution financière base liquidation du PN-AEUE au 31 décembre 2022 est de 58,68 % soit 7 839,76 millions liquidé sur 17 934,364 millions programmés. En rappel, le taux d'exécution base engagement est de 67,1% soit 13 337,12 millions engagés.

## 3. Performance et évolution des indicateurs

En milieu rural, le taux d'accès à l'assainissement est passé de 21% en 2021 à 21,9% en 2022 pour une cible de 22%, la population totale desservie est de 3 447 268 **personnes**.

En milieu urbain, le taux d'accès à l'assainissement n'a pas varié en 2022, il est resté à 40,8%.

Sur le plan national, le taux d'accès à l'assainissement est passé de 26,8 en 2021 à 27,5 en 2022 soit une progression de 0,7 point de pourcentage. La population totale desservie est de 6 162 402 personnes.

---

## 1 INTRODUCTION

---

Le Burkina Faso a adopté par Arrêté ministériel n° 2017-041/MEA/CAB du 23 mars 2017, le Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excrétas (PN-AEUE) à l'horizon 2030 qui constitue le cadre programmatique de toutes les interventions en matière d'assainissement des eaux usées et excrétas. L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excrétas. Il comporte sept (07) actions réparties sur cinq (05) axes. La mise en œuvre du programme est assurée par plusieurs acteurs: les structures étatiques telles que le Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement (MEEA), le Ministère de la Santé et de l'hygiène publique (MSHP), le Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN), le Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat (MUH), le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les associations et ONG, le secteur privé, etc. Le pilotage et la coordination sont assurés par la Direction Générale de l'Assainissement (DGA). Le programme est évalué par un Comité de Revue et supervisé par un Groupe thématique national (GTN) des Programmes de la Politique Nationale de l'Eau.

Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre du PN-AEUE au 31 décembre de l'année 2022. Il fait ressortir des informations relatives à l'avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le Plan Opérationnel 2021-2025 élaboré en cohérence avec le PNDES II. Il est établi sur la base des rapports bilans annuels des DREA, de l'ONEA, de la DGA, du rapport de programmation révisée 2022 et du Budget Programme du MEEA.

---

## 2 METHODOLOGIE

---

Le rapport bilan annuel du PN-AEUE est le fruit de la synthèse des activités menées par les différents acteurs dans le domaine de l'assainissement durant l'année en cours. Son élaboration s'appuie sur une approche méthodologique qui peut être décomposée en étapes successives :

- la révision des canevas des rapports bilans régionaux et leur transmission aux directions régionales de l'eau et de l'assainissement pour remplissage ;
- la centralisation des rapports bilans régionaux validés par les Groupes Thématiques Régionaux (GTR) ;
- la synthèse, le traitement et l'analyse des rapports bilan régionaux du PN-AEUE ;
- la rédaction de la version provisoire du rapport bilan national annuel ;
- la relecture du rapport provisoire pour son assurance-qualité avant sa transmission aux membres du comité de revue.

Les échéances des différentes étapes sont fonction de la feuille de route pour l'organisation des travaux et la tenue des cadres de concertation et de pilotage du sous-secteur Eau et Assainissement, élaborée par la Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles (DGESS) sur la période considérée.

Spécifiquement pour le calcul des différents taux physiques, la méthode du Taux Global de Réalisation des Objectifs (TGRO) du Ministère en charge de la Fonction Publique a été adoptée. Elle consiste en une moyenne arithmétique des taux d'exécution physique des activités, des produits, des actions, des programmes et du sous-secteur. Le taux de réalisation annuel calculé sur la base de la programmation physique révisée permet d'apprécier le niveau d'atteinte de l'objectif annuel.

### Taux de réalisation annuel (%)

- ✓ Taux de réalisation physique annuel d'une activité

$$\text{Taux de réalisation (activité)} = \frac{\text{réalisation physique annuelle}}{\text{programmation physique annuelle révisée}} \times 100$$

- ✓ Taux de réalisation physique annuel de l'action/programme/sous-secteur

$$\text{Taux de réalisation annuel (action/programme/sous – secteur)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Tx}_{\text{activité}_i}$$

Où :

$n$  représente le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur ;

$\text{Tx}_{\text{activité}_i}$  représente le taux de réalisation annuel de l'activité  $i$  de l'action/programme/sous-secteur.

Pour l'exécution financière, la méthode suivante a été suivie :

### Le taux d'exécution financière global

- Taux d'exécution financière d'une activité

$$\begin{aligned} \text{Taux d'exécution financière (activité)} \\ = \frac{(\text{réalisation financière annuelle (engagé visé)})}{(\text{programmation financière annuelle révisée})} \times 100 \end{aligned}$$

- Taux d'exécution financière de l'action/programme/sous-secteur

$$\begin{aligned} \text{Taux d'exécution financière (action/programme/sous – secteur)} \\ = \frac{\sum_{i=1}^n \text{réalisation financière annuelle (engagé visé)}}{\sum_{i=1}^n \text{programmation financière annuelle révisée}} * 100 \end{aligned}$$

Avec  $n$  le nombre d'activités programmées au cours de l'année au titre de l'action/programme/sous-secteur.

Le rapport comporte deux (02) parties, la première partie traite des performances physiques annuelles des différentes actions du PN-AEUE et la seconde, des performances financières annuelles.

### 3 PRESENTATION DU PN-AEUE

#### 3.1 Objectifs

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta.

Ses objectifs spécifiques sont les suivants :

- éradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement;
- assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques ;
- renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

L'objectif stratégique sera atteint à travers les actions, objectifs opérationnels et résultats.

#### 3.2 Rappel des points clés de la session à mi-parcours de 2022

**Tableau 1** : Récapitulatif des résultats au 30 juin 2022

Désignation	Programmation physiques révisées au 30 juin 2022	Réalisations physiques au 30 juin 2022	Programmation financières révisées au 30 juin 2022 (en millions)	Montant engagé au 30 juin 2022 (en millions)
Latrines familiales neuves	46 570	23130	7 438	3 082,687
Latrines familiales réhabilitées	285	280	55	4,600
Latrines écoles neuves	332	109	1 122,801	180,389
Latrines écoles réhabilitées	66	10	89,840	10,000
Latrines CSPS neuves	120	36	415,238	67,359
Latrines CSPS réhabilitées	46	12	17,569	12,470
Latrines publiques neuves	120	99	429,130	140,660
Latrines publiques réhabilitées	3	83	2,500	0,500
Puisards domestiques neufs	2 966	6986	190,620	101,600

**Source** : Rapports bilan à mi-parcours et de programmation révisée du PN-AEUE 2022

En rappel le taux d'accès national à l'assainissement au 31 décembre 2021 était de 26,8%.

#### 3.3 Etat de mise en œuvre des recommandations de la session précédente



**Tableau 2:** Mise en œuvre des recommandations de la dernière session

N°	Recommandations	Échéance	Responsable	État de mise en oeuvre	Observation/commentaire
1	Instituer la tenue des ateliers de validation des documents avec les DREA avant la revue	2023	DGA	Réalisé	Un atelier d'assurance qualité a été effectué avec les régions en mars 2023

#### 4 BILAN ANNUEL DES REALISATIONS PHYSIQUES DE 2022

**Tableau 3:** Récapitulatif des taux d'exécution physiques et financiers par action

Actions mises en œuvre	Taux d'exécution physique	Montant prévu en millions	Montant réalisé (engagé visé)	Taux d'exécution financière (engagé visé)	Montant réalisé (liquidé)	Taux d'exécution financière (liquidé)
Action 1	67,30%	794,55	664,139	67,23%	588,36	74,05%
Action 2	43,3	97,388	61,5	63,15	61,5	63,15
Action 3	63,30%	9 547,446	7811,71	81,82%	6898,677	72,26%
Action 4	46,80%	5 128,168	3644	71,06%	1830	35,7%
Action 5	64,50%	2 165,000	983,25	45,42	983,25	45,42%
Action 6	75%	0,000	0	-	-	-
Action 7	85,70%	201,835	172,525	85,48%	162,727	80,62%
<b>Total programme</b>	<b>67,10%</b>	<b>17 934,364</b>	<b>13 337,12</b>	<b>67,10%</b>	<b>7839,76</b>	<b>58,68%</b>

#### 4.1 Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

##### 4.1.1. Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

##### Produit 1.1.1 : Les villages déclenchés à la phase 1 (2016-2020) sont certifiées FDAL

La mise en œuvre de l'ATPC dans les différentes régions a permis d'obtenir les résultats contenus dans les tableaux ci-dessous.

**Tableau 4 :** déclaration et certification de villages déclenchés sur la période 2016-2020

Régions	Nombre de villages	Cumul de villages déclenchés	Déclaration FDAL de villages	Certification de villages
---------	--------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Régions	Nombre de villages	Cumul de villages déclenchés	Déclaration FDAL de villages				Certification de villages			
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	985	244	0	0	0	-	0	0	0	-
Cascades	291	158	0	0	0	-	5	0	0	<b>0,0</b>
Centre	188	44	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	753	353	15	10	0	<b>66,7</b>	0	0	0	-
Centre-Nord	965	216	21	0	0	<b>0,0</b>	7	0	0	<b>0,0</b>
Centre-Ouest	595	240	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Sud	541	186	25	29	4	<b>100,0</b>	25	22	0	<b>88,0</b>
Est	846	453	0	0	0	-	0	0	0	-
Hauts-Bassins	483	220	0	0	0	-	0	0	0	-
Nord	914	198	118	0	0	<b>0,0</b>	50	0	0	<b>0,0</b>
Plateau Central	581	102	1	1	0	<b>100,0</b>	0	0	0	-
Sahel	701	294	2	89	87	<b>100,0</b>	2	37	35	<b>100,0</b>
Sud-Ouest	1066	57	0	0	0	-	0	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>8909</b>	<b>2765</b>	<b>182</b>	<b>129</b>	<b>91</b>	<b>20,9</b>	<b>89</b>	<b>59</b>	<b>35</b>	<b>27,0</b>

Source : Rapports bilans régionaux

Durant la deuxième phase du PN AEUE 2016-2020, plusieurs villages étaient restés au stade de déclenchement. La poursuite des activités post-déclenchement et la relance de certains villages a permis de déclarer FDAL 129 villages dont 91 villages en hors programmation sur une prévision de 182 villages soit un taux de déclaration FDAL de 20,9%. Pour ce qui est de la certification FDAL, 59 villages ont été certifiés sur une prévision de 89 soit un taux de certification de 27%. Cette performance demeure faible car le nombre de village déclaré FDAL ne représente que 4.7% des villages déclenchés. La faible performance pourrait s'expliquer par l'inaccessibilité de certaines zones du fait du contexte sécuritaire difficile et aussi par la clôture de certains projets qui n'a pas permis d'achever le processus ATPC.

**Produit 1.1.2 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans les villages (à partir de 2021)**

**Tableau 5 : situation de l'ATPC dans les villages pour l'année 2022**

Régions	Nombre de villages	Villages déclenchés				Déclaration FDAL de villages				Certification de villages				Nombre de déclenchements institutionnels
		Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	
Boucle du Mouhoun	985	29	42	13	<b>100,0</b>	25	20	0	<b>80,0</b>	12	0	0	<b>0,0</b>	-
Cascades	291	15	15	0	<b>100,0</b>	17	1	0	<b>5,9</b>	17	0	0	<b>0,0</b>	-
Centre	188	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Centre-Est	753	2	0	0	<b>0,0</b>	0	10	10	-	0	-	-	-	-
Centre-Nord	965	62	8	0	<b>12,9</b>	54	20	0	<b>37,0</b>	10	4	0	<b>40,0</b>	
Centre-Ouest	595	104	79	0	<b>76,0</b>	42	32	0	<b>76,2</b>	43	35	0	<b>81,4</b>	7
Centre-Sud	541	5	10	5	<b>100,0</b>	9	7	0	<b>77,8</b>	9	22	13	<b>100,0</b>	-
Est	846	91	1	0	<b>1,1</b>	86	3	0	<b>3,5</b>	94	18	0	<b>19,1</b>	
Hauts-Bassins	483	10	6	0	<b>60,0</b>	0	-	-	-	0	-	-	-	-
Nord	914	10	10	0	<b>100,0</b>	0	18	18	-	0	-	-	-	-
Plateau Central	581	20	48	28	<b>100,0</b>	13	10	0	<b>76,9</b>	0	-	-	-	-
Sahel	701	0	0	0		0	0	0	-	0	0	0	-	
Sud-Ouest	1066	20	20	0	<b>100,0</b>	0	-	-	-	0	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>8909</b>	<b>368</b>	<b>239</b>	<b>46</b>	<b>52,4</b>	<b>246</b>	<b>121</b>	<b>28</b>	<b>37,8</b>	<b>185</b>	<b>79</b>	<b>13</b>	<b>35,7</b>	<b>7</b>

Source : Rapports bilan régionaux

En termes de résultats d'évaluations après les déclenchements, 121 villages sur une programmation de 246 villages ont atteint l'état de déclaration FDAL soit un taux de réalisation de 37,8%. Les régions de la Boucle du Mouhoun, Centre Ouest, Centre-Sud et du Plateau Central enregistrent des taux élevés de déclaration FDAL. Pour ce qui est de la certification FDAL, 79 villages ont été certifiés FDAL sur une programmation de 185 villages soit un taux de réalisation de 35,7%. Seules les régions du Centre-Ouest, Centre-Sud et de l'Est enregistrent plus de villages certifiés. Au regard du nombre important de village qui reste à certifier, il est nécessaire de renforcer les actions de suivi et de communication pour le changement de comportement en vue maintenir les acquis de la déclaration FDAL et l'aboutissement à la certification FDAL.

En matière d'engagement des acteurs institutionnels dans la mise en œuvre de l'ATPC, seule la région du Centre Ouest a tenu des déclenchements institutionnels. Ces déclenchements institutionnels ont pour but de susciter la prise de conscience des acteurs en matière d'hygiène et d'assainissement, de renforcer la coordination afin que les acteurs puissent jouer leurs rôles dans la mise en œuvre de l'ATPC et cela, dans le but d'assurer une pérennisation des acquis.

**Tableau 6:** évaluation de la mise en œuvre de l'ATPC

Régions	Nombre de villages (a)	Cumul de villages déclenchés (b)	Cumul de villages déclarés FDAL (c)	Taux de déclaration FDAL (d=c/a)*100	Cumul de villages certifiés FDAL (e)	Taux de certification FDAL (f=e/a)*100
Boucle du Mouhoun	985	284	20	2,0	0	0,0
Cascades	291	175	1	0,3	0	0,0
Centre	188	44	0	0,0	0	0,0
Centre-Est	753	551	17	2,3	4	0,5
Centre-Nord	965	230	46	4,8	8	0,8
Centre-Ouest	595	362	225	37,8	186	31,3
Centre-Sud	541	195	29	5,4	22	4,1
Est	846	461	274	32,4	155	18,3
Hauts-Bassins	483	224	0	0,0	0	0,0
Nord	914	215	30	3,3	0	0,0
Plateau Central	581	155	10	1,7	0	0,0
Sahel	701	294	89	12,7	39	5,6
Sud-Ouest	1066	77	41	3,8	6	0,6
<b>Total National</b>	<b>8909</b>	<b>3267</b>	<b>782</b>	<b>8,8</b>	<b>420</b>	<b>4,7</b>

Source : Rapports bilans régionaux 2022

Au 31 décembre 2022, la situation de la mise en œuvre de l'ATPC au niveau national fait état de 36,7% des villages déclenchés sur les 8 909 villages que compte le pays. Sur l'ensemble des régions, le taux de déclaration FDAL est passé de 6,7% en 2021 à 8,8% en 2022. Pour ce qui est de l'évolution du taux de certification des villages, il est passé de 3,9% en 2021 à 4,7% en 2022. Les régions du Centre Ouest et de

l'Est, enregistrent les plus forts taux de déclaration FDAL. Seules les régions du Centre et des Haut Bassins n'enregistrent toujours pas de villages déclarés FDAL. Dans l'ensemble, des efforts ont été fournis par les acteurs pour ce qui est du passage à l'échelle de l'ATPC mais le rythme actuel d'évolution des indicateurs ne permettra pas d'atteindre les objectifs à l'horizon 2030. Cette faible performance pourrait s'expliquer entre autres par le contexte sécuritaire difficile qui entrave le suivi de certains villages éligibles à l'état FDAL. Dans l'optique d'accélération de la FDAL à l'horizon 2030, les actions pour la FDAL doivent être renforcées et mieux coordonnées.

**Tableau 7 : formation, ciblage et coordination sur l'ATPC**

Régions	Nombre de facilitateurs formés				Nombre d'acteurs formés sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC				Nombre de rencontres de coordination de l'ATPC tenues				Nombre de rapport de suivi de l'ATPC rédigés			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3	0	0	<b>0,0</b>
Cascades	43	43	0	<b>100,0</b>	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	0	76	76	-	25	0	0	<b>0,0</b>	0	0	0	-	1	0	0	<b>0,0</b>
Centre-Nord	6	0	0	<b>0,0</b>	0	0	0	-	2	0	0	<b>0,0</b>	6	0	0	<b>0,0</b>
Centre-Ouest	48	48	0	<b>100,0</b>	24	57	33	<b>100,0</b>	14	19	5	<b>100,0</b>	6	9	3	<b>100,0</b>
Centre-Sud	0	0	0	-	0	0	0	-	6	6		<b>100,0</b>	14	8	0	<b>57,1</b>
Est	45	40	0	<b>88,9</b>	0	0	0	-	18	18		<b>100,0</b>	5	0	0	<b>0,0</b>
Hauts-Bassins	128	128	0	<b>100,0</b>	1	0	0	<b>0,0</b>	2	0	0	<b>0,0</b>	4	0	0	<b>0,0</b>
Nord	38	38	0	<b>100,0</b>	0	38	38	-	12	0	0	<b>0,0</b>	6	38	32	<b>100,0</b>
Plateau Central	10	43	33	<b>100,0</b>	25	25		<b>100,0</b>	0	15	15	-	2	6	4	<b>100,0</b>
Sahel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-



Régions	Nombre de facilitateurs formés				Nombre d'acteurs formés sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables dans le cadre de la mise en œuvre de l'ATPC				Nombre de rencontres de coordination de l'ATPC tenues				Nombre de rapport de suivi de l'ATPC rédigés			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Sud-Ouest	13	13	0	<b>100,0</b>	0	0	0	-	2	2	0	<b>100,0</b>	17	4	0	<b>23,5</b>
DGA	90	82	0	<b>91,1</b>	0	0	0	-	0	2	0	-	4	6	2	<b>100,0</b>
<b>Total National</b>	<b>421</b>	<b>511</b>	<b>109</b>	<b>95,5</b>	<b>75</b>	<b>120</b>	<b>71</b>	<b>65,3</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>20</b>	<b>75,0</b>	<b>68</b>	<b>71</b>	<b>41</b>	<b>44,1</b>

Source : Rapports bilans régionaux

Les activités de renforcement de capacités, de coordination et de suivi sont primordiales pour accroître l'efficacité des interventions en matière d'ATPC.

Durant l'année 2022, 511 facilitateurs dont 109 en hors programmation ont été formés sur une prévision de 421 au profit des acteurs des régions des Cascades, du Centre Est, du Centre Ouest, de l'Est, des Haut-bassins, du Nord, du Plateau Central et du Sud-Ouest. Cependant, le nombre de facilitateurs formés demeure insuffisant pour l'atteinte des objectifs d'accélération de la FDAL à l'horizon 2030. Au regard de ce déficit, les acteurs doivent intégrer les activités de formations et de recyclages dans les planifications annuelles et mobiliser les ressources nécessaires pour leurs réalisations.

En matière de coordination des interventions ATPC, des rencontres sont de plus en plus initiées au niveau régional et national pour renforcer la synergie d'action entre les acteurs intervenant dans le domaine et mieux orienter, encadrer, planifier et capitaliser les résultats. Pour le compte de l'année 2022, 62 rencontres de coordination ont été réalisées sur une prévision de 56. Les régions du Centre Ouest, de l'Est et du Plateau Central ont tenue plus de rencontres comparativement aux autres régions.

En ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre de l'ATPC, on enregistre 71 rapports de suivi sur 68 prévus. Ces rapports permettent d'établir le bilan, de tirer les leçons et de proposer des solutions aux différents acteurs pour améliorer les interventions sur le terrain.

Les régions du Centre Ouest, du Nord et du Plateau Central ont pu former 120 sur une prévision de 75 acteurs sur l'AFDH et les stratégies de ciblage des ménages vulnérables.

**Produit 1.1.3 : La population en milieu rural adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement**

**a) Formation et coordination de la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement dans institutions et ménages**

**Tableau 8** : formation et coordination

Régions	Nombre d'ateliers sur les outils de sensibilisation tenus				Nombre de campagne de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et de l'assainissement organisées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	-	-	-	63	-	-	0
Cascades	3	4	1	100	13	13	-	100
Centre	0	58	58	-	0	0	-	-
Centre-Est	11	3	-	27,3	8	-	-	0
Centre-Nord	2	-	-	-	51	-	-	-
Centre-Ouest	4	9	5	100	1	150	149	100
Centre-Sud	0	-	-	-	0	8	8	-
Est	1	-	-	-	128	128	-	100
Hauts-Bassins	0	4	4	-	29	27	-	93,1
Nord	10	10	-	100	14	14	-	100
Plateau Central	0	9	9	-	72	102	30	100
Sahel	10	14	4	100	1	1	-	100
Sud-Ouest	0	-	-	-	0	-	-	-
DGA	0	-	-	-	1	1	-	100
<b>Total National</b>	<b>41</b>	<b>111</b>	<b>81</b>	<b>73,2</b>	<b>381</b>	<b>444</b>	<b>187</b>	<b>67,5</b>

Source : collecte de données auprès des acteurs 2022

L'un des grands défis en matière d'accès à l'assainissement est de travailler avec les communautés pour apporter un changement durable de comportements. Ainsi, des actions sont entreprises par les acteurs pour renforcer l'adoption des comportements favorables à l'assainissement dans les institutions et les ménages. On note la réalisation de 111 ateliers sur les outils de sensibilisation dans huit régions. Aussi, 444 campagnes de communication pour le changement social et de comportement sur l'hygiène et l'assainissement sur une prévision de 381 campagnes ont eu lieu dans huit régions. Certes, des efforts ont été fournis par les acteurs mais les campagnes doivent être renforcées dans toutes les régions en vue de lever les barrières comportementales qui entravent l'adoption des bonnes pratiques et ainsi pérenniser les acquis des différentes interventions. De façon générale, on constate une non maîtrise de la programmation qui pourrait se justifier par la faible collaboration de certains acteurs.

**b) Sensibilisation de masse**

**Tableau 9:** Activités de sensibilisations de masse

Régions	Nombre d'émissions				Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	
Boucle du Mouhoun	34	34	0	<b>100,0</b>	Entretien des latrines, lavage des mains, STOP à la défécation à l'aire libre ; Bonne utilisation des kits d'hygiène ; hygiène corporelle et alimentaire ; gestion des déchets ; chaine de l'eau potable
Cascades	13	0	0	<b>0,0</b>	-
Centre	0	0	0	-	-
Centre-Est	10	6	0	<b>60,0</b>	Rôle et attributions des acteurs de l'EA : Défis et perspectives de la région ; Droits à l'EA
Centre-Nord	33	22	0	<b>66,7</b>	Les types de latrines, les avantages des latrines, l'entretien, le lavage des mains. Conséquences de la DAL, suivi de la chaine de l'eau, GHM
Centre-Ouest	18	18	0	<b>100,0</b>	Conséquence de la DAL ; utilisation et entretien des ouvrages d'assainissement ; ATPC, une technique qui marche... ; Marketing de l'assainissement ; Entretien, hygiène et utilisation des latrines dans les écoles et formations sanitaires
Centre-Sud	4	35	31	<b>100,0</b>	Les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement
Est	128	374	246	<b>100,0</b>	Sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement ; GHM, adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement
Hauts-Bassins	52	26		<b>50,0</b>	Hygiène de l'eau de boisson ; Utilisation et entretien des latrines, hygiène des mains
Nord	2	3	1	<b>100,0</b>	Le maintien de la qualité de l'eau tout le long de la chaîne d'approvisionnement de l'eau ; Lavage des mains au savon ; Gestions des excréta, GHM
Plateau Central	5	19	14	<b>100,0</b>	Les conséquences de la défécation à l'air libre ; Solution pour la FDAL
Sahel	195	195	0	<b>100,0</b>	Hygiène des mains, gestes barrières, conséquences DAL, chaine de l'eau
Sud-Ouest	2	2		<b>100,0</b>	ATPC, GHM en milieu scolaire
<b>Total National</b>	<b>496</b>	<b>734</b>	<b>292</b>	<b>89,1</b>	

Source : Rapports bilans régionaux

Le bilan des activités de sensibilisation de masse pour l'année 2022 est de 734 émissions réalisées dont 292 en hors programmation sur une prévision annuelle de 496 émissions soit un taux de réalisation de 89,1%.

Ces émissions ont traité de divers thèmes en lien avec l'hygiène et l'assainissement. Ce sont entre autres les conséquences de la DAL, l'utilisation et entretien des ouvrages d'assainissement, l'approche ATPC, le marketing de l'assainissement, la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire, la chaîne de l'eau, la gestion des déchets etc. Ces émissions réalisées dans les lieux publics et à travers les médias ont permis de toucher des milliers de personnes de toutes les couches de la population de sorte à susciter une prise de conscience et changement de comportement en faveur de l'assainissement.

**c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)**

**Tableau 10:** sensibilisation dans les ménages

Régions	Nombre de ménages touchés				Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100			
Boucle du Mouhoun	7 087	8 891	1 804	100,0	75 137	27 295	
Cascades	0	0	0	-	-	-	-
Centre	0	0	0	-	-	-	-
Centre-Est	347	347	0	100,0	3 168	1 573	Sensibilisation des parents d'élevés, les autorités locales et population du sur la GHM ; Réalisation des superstructures de latrines
Centre-Nord	324	0	0	0,0	-	-	-
Centre-Ouest	2 217	19 850	17 633	100,0	114 381	56 579	Entretien, hygiène et utilisation des latrines dans les écoles et les formations sanitaires
Centre-Sud	48	18 980	18 932	100,0	152 310	79 433	
Est	28 316	19 296		68,1	231 573	117 297	Lavage des mains, inconvénients de la DAL, utilisation et entretien des latrines, hygiène et GHM
Hauts-Bassins	4 763	4 915	167	<b>99,7</b>	49 418	26 086	le péril fécal ;l'importance de disposer de latrine, l'utilisation et l'entretien des latrines ;la chaîne de l'eau de boisson

Régions	Nombre de ménages touchés				Nombre de personnes touchées dans les ménages	Nombre de femmes touchées dans les ménages	Thèmes abordés
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100			
Nord	22 190	18 691	3 499	<b>68,5</b>	133 407	80 473	Avantages et inconvénients de disposer d'une latrine ;Voies de contamination et barrières, Utilisation et entretien des latrines, Hygiène de l'eau de boisson ; Riposte COVID 19, lavage des mains, riposte Cholera
Plateau Central	0	0	0	-	-	-	-
Sahel	3 442	6 834	3 392	<b>100,0</b>	47 061	26 182	Hygiène des mains, gestes barrières, conséquences DAL, chaîne de l'eau, Entretien des latrines, Hygiène corporelle, hygiène des aliments, transport et stockage de l'eau
Sud-Ouest	300	300	0	<b>100,0</b>	-	-	
<b>Total National</b>	<b>69 034</b>	<b>98 104</b>	<b>45 427</b>	<b>76,3</b>	<b>806 455</b>	<b>414 918</b>	

Source : *Rapports bilans régionaux*

Pour renforcer le changement durable de comportement en faveur de l'hygiène et de l'assainissement, des activités de sensibilisation de proximité à travers des visites à domicile, des causeries-débats regroupant différentes couches de la communauté ont été menées dans plusieurs régions. Pour l'année 2022, les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Est, du Centre Ouest, du Centre Sud, de l'Est, des Hauts-Bassins, du Nord et du Sahel et du Sud-Ouest ont mené des activités de sensibilisations.

Les sensibilisations de proximité ont porté sur diverses thématiques à savoir la sensibilisation des parents d'élèves, des autorités locales et des populations sur la GHM, sur la réalisation des superstructures de latrines, l'hygiène de l'eau, le lavage des mains, l'utilisation et l'entretien des latrines, les avantages et inconvénients de disposer d'une latrine, les voies de contamination et barrières, la riposte COVID, la gestion des excréta, l'hygiène corporelle et environnementale, etc.

Les sensibilisations ont permis de toucher **98 104** ménages. Au total environ, 806 455 personnes dont 414 918 femmes ont été touchées. Des efforts ont été fournis dans les différentes régions par les acteurs mais les résultats demeurent insuffisants pour l'atteinte des objectifs escomptés. Aussi, on note une faible capitalisation du nombre de ménages et personnes touchées par les actions de sensibilisation au niveau des régions.

**d) Sensibilisation/communication de masse : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint**

Tableau 11: Sensibilisation de proximité dans les institutions : évaluation

Régions	Nombre d'écoles touchées				Nombre de centres de santé touchés				Nombre de lieux publics			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	35	35		100,0	21	21	-	-	162	162		100,0
Cascades	0	-	-	-	0	-	-	-	14	14	0	100,0
Centre	0	6	6	-		-	-	-	0	-	-	-
Centre-Est	115	-	-	-	-				0			
Centre-Nord	92	-	-	-	6	-	-	-	0	-	-	-
Centre-Ouest	12	1	-	-	0	1	1	-	2	4	2	100,0
Centre-Sud	24	0	-	-	0	-	-	-	1	1		100,0
Est	74	0	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Hauts-Bassins	4	2	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
Nord	0	0	-	-	0			-	0	291	291	-
Plateau Central	10	10	0	100,0	39	39		100,0	23	23	0	100,0
Sahel	0	0	-	-	4	4	0	100,0	29	29		100,0
Sud-Ouest	31	31	0	100,0	0	-	-	-	0	-	-	-
DGA	5	8	3	100,0		-	-	-	0	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>402</b>	<b>93</b>	<b>9</b>	<b>20,9</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>1</b>	<b>91,4</b>	<b>231</b>	<b>524</b>	<b>293</b>	<b>100,0</b>

Source : collecte de données auprès des acteurs 2022

Pour l'année 2022, les activités de promotion de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles, les centres de santé et les espaces publics ont permis de toucher :

- 93 écoles sur une prévision de 402 soit un taux de réalisation de 20,9% ;



- 65 centres de santé sur une prévision de 70 soit un taux de réalisation de 91,4% ;
- 524 lieux publics (marchés, gares, lieux de cultes...) dont 293 en hors-programmation sur une prévision de 231 soit un taux de réalisation de 100%.

Les régions de la Bouche du Mouhoun, du Centre, du Plateau Central et du Sud-Ouest enregistrent plus d'activités de sensibilisations dans les écoles. En ce qui concerne les sensibilisations dans les lieux publics, elles ont été réalisées dans les régions de la Bouche du Mouhoun, des Cascades, du Nord et du Sahel. Dans lieux publics. Seules les régions du Plateau Central et du Sahel enregistrent des interventions dans les Centres de santé.

Tableau 12: Sensibilisation/communication de masse : synthèse dans les institutions et lieux publics

Régions	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchées (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
Boucle du Mouhoun	35	12 600	4 500	21	650	350	162	16 200	2 300	29 450	7 150	Hygiène du cadre de vie ; Les voies et barrières en assainissement, L'hygiène de l'eau de boisson ; Sensibilisation sur la construction de latrines
Cascades	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	-
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Nord	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	1	35	20	35	20	Les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

Hauts-Bassins	2	1 000	400	0	0	0	0	0	0	1 000	400	Entretien des latrines et hygiène de l'eau de boisson
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Plateau Central	10	1 701	842	39	55		23	272	59	2 028	901	
Sahel	0	0	0	4	40	23	29	0	0	40	23	-
Sud-Ouest	31	6 922	3 400	0	0	0	0	0	0	6 922	3 400	Lavage des mains, entretien des latrines, hygiène corporelle, GHM
DGA	8	2 200	800	0	0	0	0	0	0	2 200	800	Jeux WASH United sur le lavage des mains au savon, l'utilisation des latrines, la chaîne de transmission des germes
<b>Total National</b>	<b>87</b>	<b>24 423</b>	<b>9 942</b>	<b>70</b>	<b>745</b>	<b>373</b>	<b>231</b>	<b>16 507</b>	<b>2 379</b>	<b>41 675</b>	<b>12 694</b>	

Source : rapports bilans régionaux 2022

Les actions de sensibilisation/communication de masse menées durant l'année 2022 ont permis de toucher au total 41 675 personnes comprenant 24 423 élèves dont 9 942 filles, 745 personnes dans les centres de santé et 16 507 personnes dont 2 379 femmes dans les lieux publics. Les régions du Centre, du Centre Est, du Centre-Nord, de l'Est et du Nord n'ont enregistré aucune action de sensibilisation dans les institutions et lieux publics.

Diverses thématiques ont été abordées au cours de ces campagnes de sensibilisations dont : Hygiène du cadre de vie, les voies et barrières en assainissement, l'ATPE, l'hygiène de l'eau de boisson, la sensibilisation sur la construction de latrines, les jeux WASH United sur le lavage des mains au savon, l'utilisation des latrines, la chaîne de transmission des germes, la GHM etc.

De façon générale le taux d'exécution physique de l'action 1 est de 67,3%

## 4.2 Objectif Opérationnel 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

### 4.2.1. Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

#### Produit : 2.1.1 : La Défécation à l'Air Libre est abandonnée dans les secteurs urbains

Pour ce produit, les activités menées se résument essentiellement au suivi des secteurs déclenchés dans les villes de Dano et de Léo pour l'obtention du statut FDAL

#### Produit 2.1.2 : La population en milieu urbain adopte de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement.

##### a) Formation et coordination

Dans la région du Sahel deux (02) ateliers sur les outils de sensibilisation et une (01) campagne de communication pour le changement social et de comportement ont été organisés.

En 2022, dans le cadre du renforcement de la maîtrise d'ouvrage communale, 31 acteurs communaux ont été formés dans les villes de Réo, Diébougou, Sabou et six villes d'intervention du PAEA. En ce qui concerne la conduite des activités de sensibilisations des populations en matière d'hygiène et d'assainissement, 37 animateurs ont été formés dans les six villes PAEA et à Sabou.

##### b) Sensibilisation de masse

Tableau 13: Activités de sensibilisations de masse

Régions	Nombre d'émissions	Thèmes abordés
Boucle du Mouhoun	0	
Cascades	0	-
Centre	0	
Centre-Est	0	
Centre-Nord	0	
Centre-Ouest	0	
Centre-Sud	0	
Est	0	
Hauts-Bassins	0	
Nord	0	
Plateau Central	0	
Sahel	242	Hygiène des mains, chaîne de l'eau, Spot radio sur l'hygiène et l'assainissement
Sud-Ouest	0	
ONEA	0	
DGA	0	

<b>Total National</b>	<b>242</b>	
-----------------------	------------	--

Source : *rapports bilans régionaux*

Dans la région du Sahel, l'ONG OXFAM a produit et diffusés 240 spots radio dans les communes de Dori et de Gorom-Gorom sur des thèmes tels que le lavage des mains, l'hygiène de l'eau et COVID 19 en vue de susciter le changement de comportement en faveur de l'assainissement.

**c) Sensibilisation de proximité dans les ménages (visite à domicile, causeries débat...)**

En 2022, les activités de sensibilisation menées dans la région du Sahel ont permis de toucher 60 251 personnes dont 30 659 femmes dans 27 602 ménages. Les sensibilisations ont porté sur l'hygiène des mains, les gestes barrières, la chaîne de l'eau, le COVID dans la ville de Dori.



d) Sensibilisation de proximité : PHA dans les écoles et centre de santé, dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint en milieu urbain

Tableau 14: Sensibilisation/communication de masse dans les institutions et lieux publics

Régions	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (a)	Nombre d'élèves filles touchées (a1)	Nombre de centres de santé touchés	Nombre de personnes touchées dans les centres de santé (b)	Nombre de femmes touchées dans les centres de santé (b1)	Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc) (c)	Nombre de personnes touchées dans les lieux publics (c)	Nombre de femmes touchées dans les lieux publics (c1)	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)	Thèmes abordés
Boucle du Mouhoun	0	-	-	0	-	-	0					
Cascades	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Centre	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Centre-Est	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Centre-Nord	7	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Centre-Sud	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Est	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Nord	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Plateau Central	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
Sahel	0	-	-	0	-	-	136	ND	ND	-	-	-
Sud-Ouest	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
ONEA	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
DGA	0	-	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>136</b>					

Source : rapports bilans régionaux, Rapports d'activités ONEA

Dans la région du Sahel, 136 lieux publics abritant des sites d'accueil des PDI ont bénéficié des activités de sensibilisations sur l'hygiène des mains, les gestes barrières Covid et la chaîne de l'eau.

[De façon générale le taux d'exécution physique de l'action 2 est de 43,3%.](#)

**4.3 Objectif Opérationnel 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)**

**4.3.1. Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement**

Produit 3.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur

**Tableau 15:** opérations pré-réalisation de latrines familiales

Régions	Acteurs	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
				Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	DREA, PAEA	0	0	10 136	5 000	0	<b>49,3</b>
Cascades	DREA, PAEA, Commune de Tiéfora	0	0	32 400	13 000	0	<b>40,1</b>
Centre	DREA	0	0	600	600	0	<b>100,0</b>
Centre-Est	DREA, communes	0	0	10 150	10 150	0	<b>100,0</b>
Centre-Nord		0	0	1 494	700	0	<b>46,9</b>
Centre-Ouest	DREA, Plan International	1	0	0	5 100	5 100	-
Centre-Sud	DREA, Commune	0	1	23 100	18 000	0	<b>77,9</b>
Est	DREA, Commune	0	6	68 070	74 070	6 000	<b>100,0</b>
Hauts-Bassins	DREA, PAEA	11	0	46 000	46 000	0	<b>100,0</b>
Nord	DREA, Commune	2	0	7 500	7 500	0	<b>100,0</b>
Plateau Central	DREA	0	0	8 000	7 090	0	<b>88,6</b>
Sahel	DREA	0	0	4 350	0	0	<b>0,0</b>
Sud-Ouest	DREA, PAEA	0	0	58 500	3 500	0	<b>6,0</b>
<b>Total National</b>		<b>14</b>	<b>7</b>	<b>270 300</b>	<b>190 710</b>	<b>11 100</b>	<b>66,4</b>

Source : rapports bilans régionaux 2022

Au cours de l'année 2022, 14 Etudes diagnostiques sur les connaissances, attitudes et pratiques des populations sur l'hygiène et l'assainissement ont été menées. Aussi 07 ateliers/séances de ciblage se sont déroulés dans les régions du Centre-Sud et de l'Est par les DREA et les communes. Aussi, des activités d'intermédiation sociale et d'Information Education Communication se sont déroulées dans les 13 régions dans le cadre de l'exécution des travaux de latrines. Ces activités d'IMS ont permis de toucher au total ~~190 710 personnes~~ 710 personnes dont 11 100 en hors programmation soit un taux d'exécution physique de 66,4%. Notons que la région du Sahel n'a réalisé aucune opération de pré-réalisation de latrines familiales.

**Tableau 16:** Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu rural

Regions	Latrines						Toilettes		Total latrines		Puisards	Fosses septiques
	Traditionnelles sans dalle en béton (a)	Traditionnelle avec dalle en béton/Latrine SanPlat (b)	SanPlat améliorées (c)	VIP à une fosse (d)	VIP à double fosse (e)	Ecosan (f)	à chasse d'eau manuelle (g)	à chasse d'eau mécanique (h)	Homologuées (b+c+d+e+f+g+h)	Tout type (a+b+c+d+e+f+g+h)		
Boucle du Mouhoun	761	1 055	469	2 947	0	0	0	0	4 471	5 232	152	0
Cascades	2	58	463	1 767	65	0	0	3	2 356	2 358	7	0
Centre	0	601	314	31	2	60	3	6	1 017	1 017	87	0
Centre-Est	3	675	2 101	12	0	0	0	0	2 788	2 791	-	3
Centre-Nord	84	210	302	616	0	0	0	0	1 128	1 212	176	0
Centre-Ouest	750	858	1 319	72	0	145	0	0	2 394	3 144	820	0
Centre-Sud	0	1 184	648	17	3	32	0	0	1 884	1 884	367	0
Est	76	54	791	1 218	2	1	0	0	2 066	2 142	411	0
Hauts-Bassins	26	80	307	2 458	202	0	0	0	3 047	3 073	14	0
Nord	1	287	150	0	8	13	0	0	458	459	12	0
Plateau Central	1	67	626	63	1	150	1	1	909	910	72	0
Sahel	2	584	297	66	0	0	0	0	947	949	0	0
Sud-Ouest	3	164	899	2 234	3	0	1	46	3 347	3 350	327	53
<b>Total National</b>	<b>1 709</b>	<b>5 877</b>	<b>8 686</b>	<b>11 501</b>	<b>286</b>	<b>401</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>26 812</b>	<b>28 521</b>	<b>2 445</b>	<b>56</b>

Source : Rapports bilans régionaux 2022

En 2022, l'inventaire national des ouvrages d'assainissement a permis de dénombrer 28 521 latrines tous types confondus réalisées en milieu rural, avec 26 812 ouvrages homologués, soit 94,0%. Les latrines sanplat représentent 54,3% des latrines homologuées et les latrines VIP 44%. Cela témoigne du fait que les acteurs réalisent de plus en plus d'ouvrages homologués.

Les plus grandes réalisations de latrines Sanplat s'observent dans les régions de la Boucle de Mouhoun (5232), du Centre-Ouest (3144), des Hauts-Bassins (3073) et du Sud-Ouest (3350).

Par ailleurs 1 709 latrines traditionnelles sans dalles en béton ont été réalisées par les ménages grâce à la mise en œuvre de l'ATPC. La grande part de ces réalisations a été faite dans la région du Centre-Ouest (750) et de la Boucle du Mouhoun (761). Ce résultat pourrait s'expliquer par l'engagement et la volonté des communautés à arrêter la défécation à l'air libre.

**Tableau 17:** Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

Regions	Latrines traditionnelles avec dalle en béton/Latrine SanPlat (a)	Latrines SanPlat améliorées (b)	VIP à une fosse (c)	VIP à double fosse (d)	Ecosan (e)	à chasse d'eau manuelle (f)	à chasse d'eau mécanique (g)	Total latrines homologuées (a+b+c+d+e+f+g)
Boucle du Mouhoun	5	5	3	0	0	0	0	13
Cascades	2	3	0	0	0	0	0	5
Centre	6	18	14	0	0	0	0	38
Centre-Est	0	16	0	0	0	0	0	16
Centre-Nord	6	4	0	0	0	0	0	10
Centre-Ouest	40	21	0	0	0	0	0	61
Centre-Sud	0	2	0	0	0	0	0	2
Est	3	0	1	0	0	0	0	4
Hauts-Bassins	1	0	0	0	0	0	0	1
Nord	6	1	0	0	0	0	0	7
Plateau Central	1	2	1	0	0	0	0	4
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	4	1	1	0	0	0	0	6
<b>Total National</b>	<b>74</b>	<b>73</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>

Source : Rapports bilans annuel régionaux 2022

Au total 167 latrines familiales ont été réhabilitées en milieu rural essentiellement dans la région du Centre-Ouest et du Centre. Les réhabilitations ont permis d'améliorer le niveau de service/sécurité de ces latrines traditionnelles en latrines homologuées.

**Tableau 18 :** Situation des latrines semi-finies

Régions	Boucle du Mouhoun	Cascades	Centre	Centre-Est	Centre-Nord	Centre-ouest	Centre-Sud	Est	Hauts-Bassins	Nord	Plateau Central	Sahel	Sud-Ouest	Total
Nombre	112	846	171	489	202	465	397	871	13	2	1092	0	356	5016

Source : BD INOA 2022

Au cours de l'année, 5016 latrines semi-finies ont été recensées sur le plan national. Comparativement à l'année 2021 où on avait recensé 8327 latrines semi finies, on constate une baisse des latrines semi- finies cependant des efforts doivent toujours être consentis par les ménages pour l'achèvement de ces latrines

**Tableau 19:** Situation de réalisation et de réhabilitation latrines familiales

Régions	Latrines familiales					Réhabilitations				
	Program- mation révisée (a)	Réalizations				Progra- m- mation révisé e (a)	Réalizations			
		Issue de la program- mation (b)	Hors progra- m- mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %		Issue de la progra- m- mation (b)	Hors program- mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	5445	4 109	362	4 471	<b>75,5</b>	0	0	13	13	<b>0</b>
Cascade s	5 530	2 356	0	2 356	<b>42,6</b>	0	0	5	5	<b>0</b>
Centre	784	784	233	1 017	<b>100</b>	0	0	38	38	<b>0</b>
Centre- Est	4257	2 162	626	2 788	<b>50,8</b>	5	5	11	16	<b>100</b>
Centre- Nord	2 668	1 128	0	1 128	<b>42,3</b>	264	10	0	10	<b>4</b>
Centre- Ouest	3317	2 291	103	2 394	<b>69,1</b>	0	0	61	61	<b>0</b>
Centre- Sud	1593	1 593	291	1 884	<b>100</b>	0	0	2	2	<b>0</b>
Est	5 075	2 066	0	2 066	<b>40,7</b>	0	0	4	4	<b>0</b>
Hauts- Bassins	5702	2 614	433	3 047	<b>45,4</b>	0	0	1	1	<b>0</b>
Nord	3423	458	0	458	<b>13,4</b>	16	7	0	7	<b>44</b>
Plateau Central	2296	909	0	909	<b>39,6</b>	0	0	4	4	<b>0</b>
Sahel	806	750	197	947	<b>100</b>	0	0	0	0	<b>0</b>
Sud- Ouest	5857	2684	663	3 347	<b>57,1</b>	0	0	6	6	<b>0</b>
<b>Total National</b>	<b>46 753</b>	<b>23 904</b>	<b>2 908</b>	<b>26 812</b>	<b>52,4</b>	<b>285</b>	<b>22</b>	<b>145</b>	<b>167</b>	<b>7,7</b>

Source : BD INOA 2022, rapport de programmation

Sur une programmation révisée de 46 753 latrines familiales en 2022, les réalisations issues de la programmation se chiffrent à **23 904** latrines soit 52,4% de taux de réalisation. Ce taux est supérieur à celui de 2021 qui était de 42,9%.

Aussi, **2 908** latrines ont été réalisées en hors programmation ce qui relève le nombre total des réalisations des latrines familiales à 26 812. L'amélioration du niveau de réalisation pourrait s'expliquer par la saisie des données effectuée par les agents des DREA ce qui a permis de corriger les incohérences des données collectées par les points focaux. Cette dynamique devrait être maintenue pour les années à venir. Les régions du Centre, du Centre-Sud et du Sahel enregistrent un taux d'exécution de 100% et sont suivies par celle de la Boucle du Mouhoun avec un taux de 75,5%. Les régions du Nord et du Plateau-Central ont les taux d'exécution physique les plus faibles avec 13,4% pour le Nord et **39,6%** pour la région du Plateau-

Central. Ces faibles taux s'expliquent en partie par la situation sécuritaire qui a rendu difficile l'accès aux sites de réalisation et le déplacement des populations.

Quant aux réhabilitations, le taux d'exécution physique est de 7,7% pour 3 régions qui avaient effectué 167 réhabilitations. Cependant 145 latrines ont été réhabilitées en hors programmation. Au total 26 979 latrines homologuées (nouvelles et réhabilités) ont été réalisées en 2022.

**Tableau 20:** Situation de réalisation de puisards et de fosses septiques

Régions	Puisards					Fosses septiques				
	Program- mation révisée (a)	Réalizations				Program- mation révisée (a)	Réalizations			
		Issue de la program- - mation (b)	Hors progra m - mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %		Issue de la program- - mation (b)	Hors program- - mation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhou n	195	195	0	195	100,0	5	0	0	0	0,0
Cascade s	0	0	7	7	-	0	0	0	0	-
Centre	7	7	80	87	100,0	0	0	0	0	-
Centre- Est	360	360	0	360	100,0	0	0	0	0	-
Centre- Nord	220	176	0	176	80,0	0	0	0	0	-
Centre- Ouest	0	0	820	820	-	0	0	0	0	-
Centre- Sud	863	518	345	863	60,0	0	0	0	0	-
Est	620	411	0	411	66,3	0	0	0	0	-
Hauts- Bassins	0	0	14	14	-	0	0	0	0	-
Nord	387	12	12	24	3,1	0	0	0	0	-
Plateau Central	60	60	12	72	100,0	0	0	0	0	-
Sahel	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Sud- Ouest	254	254	73	327	100,0	0	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>2 966</b>	<b>1 993</b>	<b>1 363</b>	<b>3 356</b>	<b>67,2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Source : Rapports bilans régionaux 2022,

En matière de gestion des eaux usées, **1 993** puisards issue de la programmation ont été réalisés sur 2 966 programmés, soit un taux d'exécution de **67,2%**. Aussi, la réalisation de 1363 puisards en hors programmation a été enregistrée. Cela donne un total de **3 356** puisards réalisés au cours de l'année 2022.



Les efforts fournis dans la réalisation des puisards restent insuffisants par rapport aux besoins pour assurer une meilleure gestion des eaux usées. Cela interpelle les acteurs à investir davantage dans la réalisation des ouvrages de gestion des eaux usées.

**Produit 3.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur**

**Tableau 21:** opérations pré-réalisation de latrines institutionnelles et publiques

Régions	Etudes diagnostiques (études CAP)	Ateliers/séances de ciblage	Nombre de personnes touchées à travers les séances d'ImS/IEC			
			Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	0	0	0	-	0	-
Cascades	0	0	12 002	446	0	4
Centre	0	0	300	300	0	100
Centre-Est	0	0	1	1	0	100
Centre-Nord	0	0	500	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	-	0	-
Centre-Sud	0	0	900	900	0	100
Est	0	29	0	-	0	-
Hauts-Bassins	0	0	0	-	1200	
Nord	0	0	0	-	0	-
Plateau Central	0	0	0	-	0	-
Sahel	0	0	0	-	0	-
Sud-Ouest	0	0	0	-	0	-
<b>Total National</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>13703</b>	<b>1847</b>	<b>1200</b>	<b>13</b>

Source : Rapports bilans régionaux 2022

En 2022, aucune étude diagnostique, mais 29 d'atelier/séance de ciblage ont été menée dans le cadre de la réalisation des latrines institutionnelles et publiques. Néanmoins 1847 personnes sur 13703 personnes prévues ont été touchées à travers des séances d'ImS/IEC. On note aussi que 1200 autres personnes ont été touchées par cette activité en hors programmation. Ce niveau de mise en œuvre de cette activité ne garantit pas une bonne utilisation des latrines institutionnelles et publiques, les acteurs doivent fournir plus d'efforts pour la mise en œuvre des activités d'ImS/IEC pour assurer une bonne durabilité des ouvrages.

**Tableau 22:** Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines dans les écoles et centres de formation

Régions	Nombre total de blocs de latrines	Nombre total de blocs de latrines réservées aux filles	Nombre total de blocs de latrines réservées aux enseignants	Nombre de cabines pour gestion des menstrues	Nombre de cabines réservées aux handicapés
Boucle du Mouhoun	43	3	0	3	8
Cascades	15	3	0	7	7
Centre	81	27	0	7	25
Centre-Est	25	2	0	0	5
Centre-Nord	36	10	0	1	9
Centre-Ouest	56	12	9	3	11
Centre-Sud	36	9	1	6	11
Est	10	3	0	0	2
Hauts-Bassins	30	1	7	0	6
Nord	19	8		0	4
Plateau Central	36	9	7	2	7
Sahel	12	1	0	5	5
Sud-Ouest	34	7	0	5	11
<b>Total National</b>	<b>433</b>	<b>95</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>111</b>

Source : *Rapports bilans annuel régionaux 2022*

Au cours de l'année, 433 blocs de latrines ont été réalisés au profit des écoles et des centres de formation. Les blocs réservés aux filles sont au nombre de 95, soit environ 22% avec 51 cabines aménagées pour la gestion hygiénique des menstrues. Il faut noter que la répartition des latrines par sexe avec des plaques d'indication au niveau des écoles n'est pas souvent systématique et donc difficile à recenser par les points focaux. Sinon, les latrines sont réparties de façon équitable entre filles et garçons dans les écoles. Ces infrastructures, adaptées aux besoins spécifiques des filles, visent à créer un environnement adéquat leur permettant de gérer les menstrues en toute intimité et en toute sécurité. Aussi, 50 cabines de latrines ont été réservées aux personnes à mobilité réduite et 51 blocs de latrines pour le personnel enseignant. Ces réalisations témoignent de la prise en compte de l'approche fondée sur les droits humains dans la planification des acteurs.

**Tableau 23:** Situation des réalisations et réhabilitations des latrines dans les écoles

Régions	Latrines neuves					Latrines à réhabiliter				
	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (d)	Total c= b+d	Taux (b/a*100)		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total d= b+c	Taux (b/a*100)
Boucle du Mouhoun	18	18	25	43	100,0	0	0	0	0	-
Cascades	20	15	0	15	75,0	40	1	0	1	2,5
Centre	40	40	41	81	100,0	2	0	2	2	-
Centre-Est	12	12	13	25	100,0	5	0	3	3	-
Centre-Nord	9	9	27	36	100,0	0	0	2	2	-
Centre-Ouest	62	56	0	56	90,3	10	0	7	7	-
Centre-Sud	16	16	20	36	100,0	2	0	1	1	-
Est	25	10	0	10	40,0	4	0	0	0	-
Hauts-Bassins	26	26	4	30	100,0	3	0	1	1	-
Nord	22	16	3	19	72,7	0	0	12	12	-
Plateau Central	28	28	8	36	100,0	0	0	4	4	-
Sahel	2	0	12	12	0,0	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	24	24	10	34	100,0	0	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>304</b>	<b>270</b>	<b>163</b>	<b>433</b>	<b>88,8</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>1,5</b>

Source : : rapports bilans régionaux 2022

Sur une programmation de 304 blocs de latrines scolaires, 270 ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 88,8%. Ce nombre d'ouvrages réalisé a considérablement baissé par rapport à l'année 2021 où plus de 400 blocs de latrines ont été réalisés. Cela pourrait s'expliquer par le nombre de plus en plus élevé d'écoles fermées à cause de la situation sécuritaire.

Par ailleurs, 163 blocs de latrines ont été réalisés en hors programmation, portant l'ensemble des réalisations dans les écoles à 433 blocs.

Au titre des réhabilitations, 32 blocs de latrines sont réhabilités en hors programmation.

L'ensemble des réalisations et des réhabilitations ont permis de mettre à disposition des écoles 466 blocs de latrines fonctionnels, ce qui contribuera à accroître le niveau d'équipement des établissements scolaires au Burkina Faso.

**Tableau 24:** Situation physique des réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé

Régions	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	10	10	9	19	100	0	-	-	-	-
Cascades	23	4	2	6	17,4	12	12	0	12	100
Centre	0	0	9	9	-	2	2	0	2	100
Centre-Est	13	4	0	4	30,8	3	0	0	0	0
Centre-Nord	2	2	3	5	100	-	-	4	4	-
Centre-Ouest	9	9	9	18	100	-	-	-	-	-
Centre-Sud	6	6	3	9	100	1	1	0	1	100
Est	22	1	0	1	4,5	26	0	0	0	0
Hauts-Bassins	8	4	3	7	50,0	2	0	0	0	0
Nord	12	4	4	8	33,3	-	-	-	-	-
Plateau Central	2	0	1	1	0,0	-	-	-	-	-
Sahel	9	0	0	0	0,0	-	-	-	-	-
Sud-Ouest	4	4	2	6	100,	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>120</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>93</b>	<b>40,0</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>33%</b>

Source : :BD INOA 2022, rapports bilans régionaux

Au niveau des centres de santé, le bilan des nouvelles réalisations est de 93 blocs de latrines dont 48 issus de la programmation soit 40% de taux de réalisation et 45 blocs en hors programmations. Cinq régions ont réalisé à 100% leur programmation tandis que les régions du Sahel et du Plateau Central n'enregistrent pas de réalisation. Aussi, l'Est et le Sahel ont de faibles taux d'exécution avec respectivement 4,5%, et 17,4%. Ces contreperformances pourraient s'expliquer par la situation sécuritaire qui rend inaccessible les sites et occasionne la fermeture des centres de santé.

Concernant les réhabilitations, 19 blocs ont été réhabilités dont 15 issus de la programmation sur 46 prévus, soit un taux de 33%.

**Tableau 25:** Situation des réalisations et réhabilitations physiques des latrines dans les lieux publics

Régions	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a) en %
Boucle du Mouhoun	9	9	30	39	100,0	0	0	3	3	-
Cascades	4	0	9	9	0,0	0			0	-
Centre	0	0	14	14	-	0	0	2	2	-
Centre-Est	11	11	4	15	100,0	1	1	0	1	100,0
Centre-Nord	27	7	1	8	25,9	0	0	0	0	-
Centre-Ouest	5	5	34	39	100,0	0	0	1	1	-
Centre-Sud	9	9	6	15	100,0	2	0	0	0	0,0
Est	29	8	2	10	27,6	0	0	0	0	-
Hauts-Bassins	2	1	11	12	50,0	0	0	0	0	-
Nord	8	6	1	7	75,0	0	0	0	0	-
Plateau Central	1	1	16	17	100,0	0	0	0	0	-
Sahel	9	8	0	8	88,9	0	0	0	0	-
Sud-Ouest	6	4	0	4	66,7	0	0	0	0	-
<b>Total National</b>	<b>120</b>	<b>69</b>	<b>128</b>	<b>197</b>	<b>57,5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>33,3</b>

Source : :BD INOA 2022, rapports bilans régionaux

Dans les lieux publics (lieux de culte, gares routières, marchés, yaars, etc.), 197 blocs de latrines ont été réalisés dont 69 blocs issus de la programmation. Le taux d'exécution évalué à 57,5% est relativement satisfaisant par rapport à celui de l'an dernier qui était de 56,4%. Le nombre de blocs réalisés en hors programmation est de 128 blocs supérieurs à celui issu de la programmation. Cela dénote de la non maîtrise des programmations par les acteurs et interpelle sur la nécessité d'améliorer la programmation des activités. De même, 7 blocs de latrines ont été réhabilités dans les lieux publics dont 6 blocs en hors.

## **BILAN DES ACTIVITES DANS LE CADRE DE WASH URGENCE (GESTION DES URGENCES HUMANITAIRE)**

**Tableau 26** : Situation des réalisations des ouvrages d'AEUE dans les ménages à cause des PDI

Régions	Boucle du Mouhoun	Cascades	Centre	Centre-Est	Centre-Nord	Centre-Ouest	Centre-Sud	Est	Hauts-Bassins	Nord	Plateau Central	Sahel	Sud-Ouest	Total National
<b>Latrines</b>	0	0	60	0	428	0	0	125	50	157	0	560	0	1380
<b>Puisards</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
<b>Fosses septiques</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Source : BD INOA 2022

**Tableau 27** : Situation des réalisations des latrines dans les sites d'accueil des PDI

Régions	Cabines-latrines	Nombre de cabines-latrines pour handicapé	Nombre total de cabines-douches	Nombre de cabines-douches pour handicapé
Boucle du Mouhoun	12	2	1	1
Cascades	0		0	
Centre	0		0	
Centre-Est	33	0	0	0
Centre-Nord	902	4	335	4
Centre-Ouest	0		0	
Centre-Sud	0		0	
Est	0		0	
Hauts-Bassins	0		0	
Nord	780	6	745	0
Plateau Central	0		0	
Sahel	259	0	235	0
Sud-Ouest	0		0	
<b>Total National</b>	<b>1986</b>	<b>12</b>	<b>1316</b>	<b>5</b>

Source : BD INOA 2022

### **Produit 3.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural**

a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement

Au cours de l'année 2022, une étude d'élaboration d'un guide de gestion durable des toilettes collectives au Burkina Faso est cours de réalisation dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'approvisionnement en eau et assainissement.

b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions

**Tableau 28:** Formation et suivi

Régions	Nombre d'acteurs formés sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement	Nombre d'acteurs formés sur les autres formations entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement	Nombre total d'acteurs formés	Nombre total de femmes formées	Nombre de centres de santé dont l'entretien et la maintenance des latrines sont confiés à un gestionnaire
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	122	122	68	0
Centre	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	3	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0
Nord	0	44	0	44	-	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	71	0	71	41	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>3</b>	<b>115</b>	<b>122</b>	<b>237</b>	<b>109</b>	<b>0</b>

Source : : rapports bilans régionaux 2022

En 2022, les activités de formation et suivi de la gestion des latrines se sont concentrées uniquement sur 4 régions. En effet, dans la région du Nord, 44 vidangeurs ont été formés sur le suivi, l'entretien et la maintenance des ouvrages d'assainissement, dans le cadre du Projet de Promotion de l'Hygiène et de l'Assainissement mis en œuvre par le consortium WaterAid et Eau Vive. Dans la région du Sahel l'ONG PATHFINDER a formé 71 acteurs sur la gestion des ouvrages d'assainissement dans les districts sanitaires de Dori, de Bani, des bénévoles et les membres des COGES. Dans les Cascades, l'Association Munyu a formé 122 acteurs sur la gestion Hygiénique des menstrues, le public cible était constitué des élèves, des parents d'élèves et des leaders communautaires. Dans la région du Centre-Sud la commune de Béré a formé 03 acteurs sur le suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions.

c) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement



Aucune autre activité entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages n'a été enregistrée

d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques

**Tableau 29** : latrines suivies dans le cadre de leur gestion

Régions	Nombre de latrines confiées à un gestionnaire				Institutions abritant les latrines	Types de latrines	Mode de gestion	Acteurs responsables du suivi	Observations
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100					
Boucle du Mouhoun	0	-	0		-	-	-	-	-
Cascades	16	16	0	100 %	CSPS	VIP a fosses multiples	Délégation	COGES	
Centre	0	6	6		Ecole	VIP double fosse-	Structure elle même	Structure elle même	
Centre-Est	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	0	-	0	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	0	-	0		-	-	-	-	-
Est	0	-	0		-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	0	-	0		-	-	-	-	-
Nord	0	-	0		-	-	-	-	-
Plateau Central	0	-	0		-	-	-	-	-
Sahel	0	-	0		-	-	-	-	-
Sud-Ouest	0	-	0		-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>100 %</b>	-	-	-	-	-

Source : rapports bilans régionaux 2022

En 2022, dans le cadre de l'entretien et la gestion des latrines, le projet SANIYA SO+ accompagne 16 centres de santé dans la région des Cascades en vue de déléguer la gestion de leurs latrines à un opérateur privé.

Dans la région du Centre 06 écoles bénéficiaires de latrines communautaires ont été formées pour assurer elle-même la gestion de leurs ouvrages, cette activité a été menée en hors programmation.

e) L'intercommunalité

Aucune activité n'a été enregistrée en 2022 dans le cadre de l'intercommunalité.

❖ **Taux d'exécution physique de l'action 34**

Le bilan de réalisation des différents produits de l'action 3 donne un taux d'exécution physique cette action est de 63,35,2%.

**4.4 Objectif Opérationnel 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu urbain conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH)**

**4.4.1. Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement**

**Produit 4.1.1 : Le développement du service de l'assainissement familial est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur**

**Tableau 30:** Réalisations de latrines familiales en milieu urbain

Régions	Latrines familiales réalisées				Latrines familiales réhabilitées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
Boucle du Mouhoun	1 000	575	0	57,5	00	00	00	00
Cascades	625	-	0	0	00	00	00	00
Centre	11 750	4 195	0	35,7	00	00	00	00
Centre-Est	1 470	523	0	35,6	00	00	00	00
Centre-Nord	950	595	0	62,6	00	00	00	00
Centre-Ouest	1 060	98	0	9,2	00	00	00	00
Centre-Sud	950	-	0	0,0	00	00	00	00
Est	500	-	0	0,0	00	00	00	00
Hauts-Bassins	6 685	2 445	0	36,6	00	00	00	00
Nord	835	502	0	60,1	00	00	00	00
Plateau Central	1 170	162	0	13,8	00	00	00	00
Sahel	150	-	0	0,0	00	00	00	00
Sud-Ouest	355	46	0	13,0	00	00	00	00
<b>Total</b>	<b>27 500</b>	<b>9 141</b>	<b>0</b>	<b>33,2</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Régions	Latrines familiales réalisées				Latrines familiales réhabilitées			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100
<b>National</b>								

Source : : rapports bilans régionaux 2022

Les résultats annuels sont dans l'ensemble très faibles. Les régions du sahel, de l'Est, du Centre Sud et des Cascades n'ont pas enregistré de réalisation de latrines familiales. Le Plateau Central (13,8%), les Hauts Bassins (36,6%), le Sud-Ouest (13%), le Centre Ouest (9,2%), le Centre Est (35,6%) et le Centre (35,7%) se retrouvent avec un taux de réalisation de latrines particulièrement bas. Les régions du Nord, du Centre Nord et du Boucle du Mouhoun sont au-dessus de la moyenne avec respectivement 60,1% ,62,6% et 57,5%. Au 31/12 2022, sur une prévision de 27 500, seulement 9 141 latrines ont été réalisées, soit un taux de réalisation de 33,2%. Ce faible taux est lié à une rupture de la fourniture des portes et tôles dans la plupart des villes, à un arrêt des préfabrications par certains artisans et à la situation sécuritaire du pays. Mais la principale cause de l'insuffisance de résultat est la suspension des réalisations dans les zones du PAEA.

**Tableau 31: Réalisations de puisards domestiques et de fosses septiques en milieu urbain**

Régions	Puisards domestiques				Fosses septiques			
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	645	645	12	100,0				
Cascades	475	0	0	0,0				
Centre	8 000	3 074	0	38,4				
Centre-Est	1 050	431	0	41,0				
Centre-Nord	700	558	0	79,7				
Centre-Ouest	860	97	0	11,3				
Centre-Sud	220	0	0	0,0				
Est	350	0	0	0,0				
Hauts-Bassins	5 440	1 787	0	32,8				
Nord	600	512	0	85,3				
Plateau Central	615	138	0	22,4				
Sahel	25	0	0	0,0				
Sud-Ouest	270	31	0	11,5				
<b>Total National</b>	<b>19 250</b>	<b>7 273</b>	<b>12</b>	<b>37,8</b>				

Source : : rapports bilans régionaux, ONEA 2022

Les résultats annuels sont dans l'ensemble faibles. Les régions du sahel, de l'Est, du Centre Sud et des Cascades ont 0% de réalisation. Le Plateau Central (22,4%), les Hauts Bassins (32,8%), le Sud-Ouest (11,5%), le Centre Ouest (11,3%), le Centre Est (41%) et le Centre (38,4%) se retrouvent avec un taux de réalisation de puisards domestiques en dessous de la moyenne. Les régions du Nord, du Centre Nord et du Boucle du Mouhoun sont au-dessus de la moyenne avec respectivement 85,3% ,79,7% et 100%.

Au 31/12 2022, le taux de réalisation des puisards est faible soit 37,8%. Ce faible taux s'explique par un arrêt des préfabriques par certains artisans et par la situation sécuritaire du pays.

**Produit 4.1.2 : Le développement de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur**

**Tableau 32: Réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles et centres de formation**

Régions	Réalisations						Réhabilitations					
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservées aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	16	0	-	-		<b>0,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Cascades	10	0	-	-		<b>0,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Centre	27	50	-	-	23	<b>100,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Centre-Est	11	6	-	-		<b>54,5</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Centre-Nord	14	7	-	-		<b>50,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Centre-Ouest	13	11	-	-		<b>84,6</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Centre-Sud	9	0	-	-		<b>0,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Est	4	5	-	-	1	<b>100,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Hauts-Bassins	16	61	-	-	45	<b>100,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Nord	14	14	-	-		<b>100,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Plateau Central	16	0	-	-		<b>0,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Sahel	1	20	-	-	19	<b>100,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Sud-Ouest	6	0	-	-		<b>0,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
<b>Total National</b>	<b>157</b>	<b>174</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88</b>	<b>54,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Source : : rapports bilan régionaux

Au 31/12/2022 les résultats sont plutôt satisfaisant avec 54,8% de réalisation. Néanmoins nous avons des régions à 0% de réalisation (Sud-Ouest, Plateau Central, Centre Sud, Cascades et Boucle du Mouhoun). Aucune réhabilitation n'a été enregistrée cette année.

**Tableau 33: Réalisations de latrines dans les lieux publics et centres de santé**

Régions	Réalizations						Réhabilitations					
	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservés aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100	Prévision (a)	Réalisation (b)	Blocs réservés aux filles	Cabines réservés aux handicapés	Hors-programmation (c)	Taux (d)= (b-c)/a*100*100
Boucle du Mouhoun	16	0	-	-	0	<b>0,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Cascades	8	0	-	-	0	<b>0,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Centre	23	50	-	-	27	<b>100,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Centre-Est	11	15	-	-	4	<b>100,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Centre-Nord	14	6	-	-	0	<b>42,9</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Centre-Ouest	12	20	-	-	8	<b>100,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Centre-Sud	9	5	-	-	0	<b>55,6</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Est	2	4	-	-	2	<b>100,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Hauts-Bassins	16	45	-	-	29	<b>100,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Nord	12	8	-	-	0	<b>66,7</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Plateau Central	15	4	-	-	0	<b>26,7</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Sahel	1	16	-	-	15	<b>100,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
Sud-Ouest	4	0	-	-	0	<b>0,0</b>	0	0	-	-	0	<b>0</b>
<b>Total National</b>	<b>143</b>	<b>173</b>	-	-	<b>85</b>	<b>61,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>

Source : : rapports bilans régionaux 2022

Au cours de l'année 173 ouvrages d'assainissement communautaires ont été réalisés et réceptionnés sur un total de- 143 ouvrages attendus soit un taux de réalisation de 61,5%. Le taux de réalisation est satisfaisant bien qu'ayant été affecté par la suspension du PAEA.

**Produit 4.1.3 : La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu urbain**

- a) Actualisation de documents de gestion de l'assainissement  
Aucune activité n'a été réalisée pour ce point
- b) Formation et suivi de la gestion de l'assainissement dans les institutions

Concernant ce point aucune activité n'a été réalisée

**c) Les autres activités entrant dans le cadre de la gestion des ouvrages d'assainissement**

Aucune activité n'a été réalisée pour ce point.

**d) Suivre l'entretien et la gestion des latrines publiques**

Aucune activité n'a été réalisée pour ce point

[Le bilan de réalisation des différents produits de l'action 4 donne un taux d'exécution physique cette action est de 63,3%.](#)

**4.5 Objectif Opérationnel 5 : Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

**4.5.1 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale**

**Produit 5.1.1 : La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et développée**

**1) Rencontres de concertation avec les acteurs de la filière de l'assainissement**

Au cours de l'année 2022, les directions régionales du Centre-Ouest, de l'Est, du Plateau Central, du Sud-Ouest et la Direction Générale de l'Assainissement ont tenu des rencontres de coordination sur la gestion de la filière de l'assainissement. Ces rencontres ont permis de faire le bilan des interventions des acteurs au niveau régional et national, de capitaliser les acquis et de proposer des solutions aux difficultés rencontrées dans la gestion des boues de vidange.

**2) Collecte, traitement et valorisation des boues de vidanges**

**Tableau 34 : Situation du traitement et valorisation des boues de vidanges et eaux usées**

Régions	vidangeurs manuels recensés		vidangeurs mécaniques recensés		vidangeurs professionnels recensés		Existence d'association de vidangeurs (1=oui ; 2=non) recensés	association de vidangeurs organisées		Quantité de boues collectées ((en millier de m <sup>3</sup> ))	Quantité de boues traitées ((en millier de m <sup>3</sup> ))	Eaux usées collectées et traitées (en millier de m <sup>3</sup> )	Quantité de boues valorisées
	Nouveaux	Total existant	Nouveaux	Total existant	Nouveaux	Total existant		Nouvelles	Total existant				
Boucle du Mouhou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Régions	vidangeurs manuels recensés		vidangeurs mécaniques recensés		vidangeurs professionnels recensés		Existence d'association de vidangeurs (1=oui ; 2=non) recensés	association de vidangeurs organisés		Quantité de boues collectées ((en millier de m <sup>3</sup> ))	Quantité de boues traitées ((en millier de m <sup>3</sup> ))	Eaux usées collectées et traitées (en millier de m <sup>3</sup> )	Quantité de boues valorisées
n													
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	241	241	0	0	0	241	1	0	1	361	361	2285	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,8	45,8	748	0
Nord	144	144	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>241</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>3 033</b>	<b>0</b>

Source : : rapports bilans régionaux 2022

Pour l'année 2022 un total de 241 et 144 vidangeurs manuels ont été identifiés respectivement dans les régions du Centre et du Nord. Seule la région du Nord a recensé 03 vidangeurs mécaniques. Durant l'année 2022 au total 407 00m<sup>3</sup> de boue de vidanges ont été traitées dans les quatre STBV de l'ONEA (Ouagadougou : Zagtoui, Kossodo et Sourgoubila ; Bobo : Dogona). Avec de tels volumes de boues à traiter, les STBV sont en surcharge.

Aussi, les deux stations de traitement des eaux usées de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ont permis de traiter 3,033 millions de m<sup>3</sup> d'eaux usées.



Au regard de la problématique de la gestion des boues de vidange, il importe de renforcer les stations de Ouaga et Bobo et dans les autres villes moyennes et chefs de communes, les collectivités territoriales devraient prévoir des espaces pour la réalisation des infrastructures de gestion de boues de vidange.

**Produit 5.1.2 : Le développement du service de l'assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur**

**Tableau 35** : développement du service d'assainissement collectif et semi-collectif

Régions	Etudes diagnostiques	Nouvelles STBV réalisées	Nouvelles STEP réalisées	Nombre de nouveaux sites de dépotage des boues de vidange identifiés		Nombres nouveaux de sites de dépotage des boues de vidange aménagés	
				Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
Boucle du Mouhoun	-	-	-	-	-	-	-
Cascades	-	-	-	-	-	-	-
Centre	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Est	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Nord	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Ouest	-	-	-	-	-	-	-
Centre-Sud	-	-	-	1	-	-	-
Est	-	-	-	-	-	-	-
Hauts-Bassins	-	-	-	-	-	-	-
Nord	1	-	-	1	-	1	-
Plateau Central	-	-	-	-	-	-	-
Sahel	-	-	-	1	-	-	-
Sud-Ouest	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total National</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Source : : rapports bilans régionaux

Dans le cadre de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale, seule la région du Nord a mené une étude diagnostique pour la réalisation d'une station de boue de vidange à travers l'ONG AVM /EVI.

**Tableau 36**: Extension du réseau collectif

Villes	Réseau d'assainissement collectif (Km)			Raccordés au Réseau collectif (Nbre)		
	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %	Prévisions (a)	Réalisations (b)	Taux (100*b/a) en %
Ouagadougou	0	0	-	100	24	<b>24</b>
Bobo-Dioulasso	0	0	-	0	0	-
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>24</b>	<b>24</b>

Source : : rapports bilans régionaux

Le taux annuel de raccordement de 24% est faible. Ce faible taux est dû au retard accusé sur les travaux de réalisation de 100 regards de branchements.

### **Produit 5.1.3 : Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal**

- 1) Former des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement

Pour l'année 2022, aucune formation n'a été tenue au profit des acteurs communaux sur les modèles de contrat en matière de gestion de service d'assainissement.

### **❖ Taux d'exécution physique de l'action 5**

Le taux d'exécution des activités de cette action est évalué 64,5%

## **4.6 Objectif Opérationnel 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta**

### **4.6.1 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta**

Aucune activité n'a été menée par les régions dans le cadre du « développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta » au cours de l'année 2022.

### **Produit 6.1.1 : La recherche orientée et appliquée à l'assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes**

### **Produit 6.1.2 : Les produits de la recherche améliorent les technologies d'assainissement et de gestion des eaux usées et excréta**

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat entre l'ONEA et l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso pour la recherche appliquée pour la caractérisation et la valorisation des boues de vidange dans les stations de traitement des boues de vidange situées à Dogona et Zagtouli, Kossodo, Bassinko au profit de l'ONEA, une étude de caractérisation des boues a été menée et est en attente de validation. Le taux de réalisation de ce produit est estimé à 75%.

### **Produit 3 : Les produits de la recherche améliorent les approches, les pratiques et les comportements en matière d'hygiène et d'assainissement**

Aucun produit (résultat) de la recherche n'a été capitalisé durant l'année 2022.

## **4.7 Objectif Opérationnel 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.**

### **4.7.1 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur**

### **Produit 7.1.1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées**

#### 1) Organisation d'activités de mobilisation de ressources financières

Au cours de l'année 2022, aucune activité de sanithon ou nuit de l'assainissement n'a été réalisée. La région du Centre-Sud qui avait prévu un sanithon dans la commune de Guiba n'a pas pu le réaliser à cause de la situation socio politique et sécuritaire.

#### 2) Organisation de la Journée Mondiale des Toilettes

Le Ministère en charge de l'Eau et de l'Assainissement en collaboration avec ses partenaires a commémoré en différé les 15 et 16 décembre 2022, la Journée mondiale des Toilettes (JMT) sous le thème :« eaux souterraines et assainissement ». Célébrée le 19 novembre de chaque année, cette cérémonie commémorative a eu lieu le 16 décembre 2022 à l'université Thomas SANKARA dans la commune de Saaba. Placée sous le patronage du Ministre en charge de l'Eau et de l'assainissement, la journée a été l'occasion pour le Ministère en charge de l'assainissement de faire un plaidoyer auprès des acteurs sur l'importance des toilettes pour le bien-être social.

Les activités majeures qui ont marqué cette journée sont :

- **La remise de matériels d'hygiène** : La remise de matériel composée de poubelles, et de kit d'hygiène au profit de l'UTS, du CENOU et des PDI de la région du Centre-Nord.
- **L'organisation d'une campagne de communication à travers** la réalisation et la diffusion de spots annonces télé et radio sur la JMT ; la production et la distribution de gadget de sensibilisation ; la réalisation de jeux radiophoniques ; la sensibilisation des étudiants de l'UTS ; la réalisation et la diffusion de capsules de sensibilisation ; la réalisation des fresques de sensibilisation sur les latrines institutionnelles.
- La réalisation d'une conférence publique sous le thème de « **la crise mondiale de l'assainissement** ». La conférence avait pour objectif de permettre aux acteurs de mieux comprendre les enjeux spécifiques du Burkina pour l'accès à l'assainissement adéquat et une meilleure protection des eaux souterraines.

#### 3) Mobilisation de ressources financières

En 2022, environ 47 millions de FCFA ont été mobilisés uniquement par les acteurs de la région du centre à travers les financements sur fonds propres des communes.

**Produit 7.1.3 : Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages**

**Tableau 37** : efforts des ménages

Régions	Nombre de latrines subventionnées homologuées	Nombre de latrines homologuées entièrement réalisées par les ménages	Nombre de latrines traditionnelles sans dalle à béton	Observations
Boucle du Mouhoun	0	0	0	
Cascades	0	0	0	
Centre	522	0	0	La DREA-C a programmé 600 latrines semi-finies dont 198 ont été achevées
Centre-Est	0	0	0	
Centre-Nord	0	0	0	
Centre-Ouest	1203	0	0	Contribution de 15 000 f par latrine et par bénéficiaire
Centre-Sud	0	0	0	
Est	0	0	0	
Hauts-Bassins	0	0	0	
Nord	0	0	0	
Plateau Central	0	0	0	
Sahel	0	0	0	
Sud-Ouest	0	0	345	
<b>Total National</b>	<b>1725</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	

Source : : rapports bilans régionaux 2022

Dans le cadre de l'atteinte des objectifs du PN-AEUE, les acteurs intervenant dans le domaine de l'assainissement familial utilisent des approches distinctes telles que la subvention partielle ou totale des ouvrages dans la mise en œuvre des activités. En effet, la subvention partielle consiste à apporter une contribution à travers la prise en charge soit de la superstructure de la latrine et/ou du creusage de la fosse, soit en apportant de la main d'œuvre et/ou des agrégats nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Par conséquent, le complément de la réalisation de l'ouvrage est apporté par le ménage. Aussi, des ménages réalisent entièrement des ouvrages eux-mêmes. L'ensemble des efforts des ménages, a permis de réaliser 1725 latrines subventionnées homologuées dans les régions du Centre et du Centre-Ouest et de construire 345 latrines traditionnelles sans dalle en béton dans la région du Sud-Ouest.

**Produit 7.1.4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance**

1) Situation des transferts de fonds

Dans le cadre du transfert des compétences de l'Etat aux collectivités, le Ministère en charge de l'Eau et de l'Assainissement octroie des financements ces dernières pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement. C'est dans ce cadre que pour l'année 2022, les régions ont bénéficié d'un transfert de fonds à hauteur de 612,732 millions de FCFA pour la réalisation de 5303 latrines familiales et la promotion de l'hygiène et l'assainissement familial. Le tableau ci-dessous présente l'état d'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural.

**Tableau 38:** Exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales en milieu rural

Régions	Nombre communes bénéficiaires	Année de transfert	Nouvelles réalisations de latrines							
			Nombre			Montants				
			Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu (millions)	Réalisé (engagé)	Réalisé (liquidé)	Taux (engagé) %	Taux (liquidé) %
Boucle du Mouhoun	3	2022	582	146	<b>25,1</b>	80,081	17,124	17,124	<b>21,4</b>	<b>21,4</b>
Cascades	1	2022	290	0	<b>0,0</b>	39,978	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Centre	2	2022	292	0	<b>0,0</b>	40,103	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Centre-Est	1	2022	264	88	<b>33,3</b>	36,381	26,71	8,853	<b>73,4</b>	<b>24,3</b>
Centre-Nord	1	2022	290	283	<b>97,6</b>	39,978	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Centre-Ouest	5	2022	1167	0	<b>0,0</b>	160,652	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Centre-Sud	5	2022	438	283	<b>64,6</b>	60,298	34	34	<b>56,4</b>	<b>56,4</b>
Est	1	2022	290	0	<b>0,0</b>	34,845	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Hauts-Bassins	2	2022	580	0	<b>0,0</b>	80	80	0	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Nord	2	2022	571	0	<b>0,0</b>	78,643	78,63	0	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Plateau Central	2	2022	378	0	<b>0,0</b>	51,928	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Sahel	1	2022	290	0	<b>0,0</b>	39,977	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Sud-Ouest	2	2022	378	0	<b>0,0</b>	52,049	0	0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Total National</b>	<b>27</b>	<b>2022</b>	<b>5 810</b>	<b>800</b>	<b>13,8</b>	<b>795</b>	<b>236</b>	<b>60</b>	<b>29,7</b>	<b>7,5</b>

Source : : rapports bilans régionaux

Pour une prévision de **5 810** latrines familiales à réaliser en 2022 sur les fonds transférés aux collectivités, 800 latrines ont été réalisées pour un montant engagé de 236 millions et un montant liquidé de 60 millions de FCFA soit un taux d'exécution physique de 13,8%.

Seules quelques communes des régions de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Est, du Centre Nord et du Centre Sud ont effectué de réalisation sur les fonds transférés en 2022. Cela s'explique par le remplacement des conseils municipaux par des délégations spéciales.

## 2) Evaluation de la mise en œuvre des fonds transférés aux communes

Un rapport de mise en œuvre des fonds transférés aux communes de 2015 à 2022 a été élaboré par la DGA. Il ressort après huit de transfert des fonds aux communes pour l'assainissement le bilan suivant :

- ✚ 115 communes dans les 13 régions ont bénéficié du transfert pour l'assainissement ;
- ✚ un montant de 4 999 993 450 FCFA ont été transféré pour la réalisation de 38 144 latrines familiales ;
- ✚ au 31/12/2022, on dénombre 26 239 latrines familiales réalisées soit 68,8% de taux d'exécution Physique pour un montant de 3 383 152 603 FCFA soit 67,7% de taux d'exécution financière.

Les latrines sont réalisées en semi-finie, et selon l'INOA, 40% de ces latrines restent inachevées. Cette situation pourrait compromettre l'atteinte des objectifs du Programme

### **Produit 7.1.5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance**

#### 1) Etudes réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain

**Tableau 39:** Voyages d'études et partage d'expérience réalisés

Régions	Voyage d'étude et partage d'expérience			Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Nombre d'activités réalisées dans le cadre de l'AMOC	Préciser les activités de l'AMOC réalisées
					Nombre d'hommes	Nombre de femmes	Nombre total		
	Prévisions	réalisations	thèmes						
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	10	0
<b>Total National</b>	5	0			0	0	0	10	0

Source : : rapports bilans régionaux.

Cinq (05) Voyages d'étude et partage d'expériences ont été programmés dont quatre (04) à l'Est et un (01) dans le Centre-Est, mais aucune réalisation n'a été effectuée. Seule la région du Sud-Ouest a réalisé dix (10) activités dans le cadre de l'Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communale.



2) Autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur

**Tableau 40** : autres formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur

Régions	Thèmes des formations réalisées	Public cible (nombre)										Nombre total de participants			Acteurs
		Agents du MEA	Autres agents de l'Etat	Agents des collectivités (maire, SG, ATC..)	ONG/associations	Enseignants	Vidangeurs	Maçons	Hygiénistes et ASBC	Animateurs et prestataires	Autres acteurs	Hommes	Femmes	Total	
Boucle du Mouhoun		8	5	3	4	0	0	0	0	0	0	15	5	20	ONG ; SNV
Cascades		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centre		0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	8	Croix rouge
Centre-Est		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centre-Nord		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Centre-Ouest	Formation et équipement de maçons pour la réalisation de latrines	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	PLAN Inter
Centre-Sud		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Est		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hauts-Bassins		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nord		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Plateau Central		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sahel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sud-Ouest	Techniques de construction de latrines améliorées Fabrication de dalles sanplat	0	0	0	0	0	0	29	28	0	0	44	13	57	PAEA ; Association Nobiel
DGA	Renforcer les capacités des acteurs	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	26	24	50	
<b>Total National</b>		8	5	53	4	0	0	79	36	0	0	143	42	185	

Source : : rapports bilan régionaux

Plusieurs acteurs ont été formés dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur. On dénombre 42 femmes formées sur un total de 185. Parmi ces formations, on peut retenir les thèmes suivants :

- Formation et équipement de maçons, des cadres de l'administration, des ONG et Assainissement pour la réalisation de latrines ;
- Le marketing de l'assainissement
- La gestion des boues de vidange

**Produit 7.1.6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires sont assurés par le Ministère en charge de l'Eau et de l'Assainissement à travers le comité de revue du programme**

1) Elaborer les rapports bilans et programmations

Au cours de l'année 2022 plusieurs rapports ont été rédigés par les DREA en vue du suivi de leurs activités et de celles des autres acteurs. Il s'agit entre autres de :

- Des rapports bilan annuel 2021 du PN-AEUE ;
- Des rapports de programmation 2022 du PN-AEUE ;
- Des rapports semestriels 2022 du PN-AEUE ;
- Des rapports de programmation révisé ;
- Des rapports trimestriels.

2) Cadres de concertation des acteurs de l'assainissement

**Tableau 41** : Cadres de concertation entres les acteurs

Régions	Type de cadre	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants		
			Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total
Boucle du Mouhoun		0	0	0	0
Cascades		0	0	0	0
Centre		0	0	0	0
Centre-Est		0	0	0	0
Centre-Nord		0	0	0	0
Centre-Ouest		0	0	0	0
Centre-Sud	Concertation communale		36	44	80
Est		0	0	0	0
Hauts-Bassins		0	0	0	0
Nord		0	0	0	0
Plateau Central		0	0	0	0
Sahel		0	0	0	0
Sud-Ouest		0	0	0	0
DGA	Concertation entre DGA et les ONG	chercheurs, vidangeurs, ONG, PTF	26	13	39
<b>Total National</b>			52	53	105

Source : : rapports bilans régionaux

Dans le cadre de la coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires, un cadre de concertation communal a été organisé par la DREA Centre-Sud et la commune de Pô pour rendre compte des activités en assainissement au niveau de la commune, coordonner les interventions des différents acteurs au niveau communal et réfléchir sur le maintien du statut des villages FDAL. Au total, 44 femmes sur 80 participants ont pris part à ladite rencontre.

Aussi, la DGA a organisé des rencontres de concertations avec les acteurs de l'assainissement tels les chercheurs, l'association des vidangeurs, les ONG et les PTF afin de mieux coordonner la mise en œuvre des

activités menées, d'échanger sur les difficultés rencontrées et de proposer des solutions/recommandations pour une meilleure mise en œuvre.

3) Tenir les sessions des groupes thématiques régionaux du PN-AEUE

Des sessions du groupe thématiques régionaux ont été tenues. Il s'agit de la session de février 2022 pour faire le bilan annuel des activités de l'année 2021 et la programmation des activités de 2022 et de la session de juin 2022 pour faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre des activités et la révision des activités déjà programmées.

4) Tenir les sessions du comité de revue

Au cours de l'année 2022 deux sessions ont été tenues. Il s'agit de la session pour examiner le bilan de l'année 2021, faire la programmation de 2022 et de la session à mi-parcours pour réviser les programmations et faire le bilan des activités déjà réalisées.

5) Élaborer le rapport annuel de performance et le plan annuel de performance

Deux sessions ont été tenues en vue d'élaborer le rapport annuel de performance et le plan annuel de performance.

❖ La mise en œuvre des activités des produits de l'action 7 a permis de réaliser un taux de 85,7%

## 5 BILAN FINANCIER

### 5.1 Action 1.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural

**Tableau 42** : Taux d'exécution financière des activités d'éradication de la DAL en milieu rural (produit1+2)

Régions	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	92,725	92,725	0	92,725	100	92,725	0	92,725	100
Cascades	22,048	22,048	0	22,048	100	22,048	0	22,048	100
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	8,877	5	11,88	16,88	56,3	5	11,88	16,88	56,3
Centre-Nord	13,963	4	0	4	28,6	4	0	4	28,6
Centre-Ouest	31,04	20,340	6,69	27,03	65,5	20,34	6,69	27,03	65,5
Centre-Sud	21,94	18,610	0,648	19,258	84,8	18,61	0,648	19,258	84,8
Est	40,1	40,100	21,12	61,22	100	40,1	21,12	61,22	100
Hauts-Bassins	21,5	16,7	0	16,7	77,7	5,5	0	5,5	25,6
Nord	49,9	0	0	0	0			0	0
Plateau Central	10,643	10,643	0	10,643	100	10,643	0	10,643	100
Sahel	0	0	0	0	0			0	0
Sud-Ouest	12,437	12,437	0	12,437	100	12,437	0	12,437	100
DGA	16,5	16,5	27,944	44,444	100			0	0
<b>Total National</b>	<b>341,673</b>	<b>259,103</b>	<b>68,282</b>	<b>327,385</b>	<b>75,8</b>	<b>231,403</b>	<b>40,338</b>	<b>271,741</b>	<b>67,7</b>

Source : rapports bilans régionaux

En matière d'éradication de la défécation à l'air libre en milieu rural, **327,385** millions de F CFA ont été engagés dont **68,282** millions en hors programmation. La programmation effectuée par l'ensemble des régions et la DGA s'élève à **341,673** millions de F CFA et est supérieure aux hors programmation contrairement à l'année 2021. Cela témoigne de la volonté des acteurs à communiquer leur planification car ayant compris la nécessité de déclarer leur programmation au moment opportun. Le taux d'engagement qui est de **75,8** est inférieur à celui de 2021 estimé à 94,7%. Le montant liquidé s'élève à **271,741** millions de F CFA soit **67,7** %.

**Tableau 43** : Taux d'exécution financière des activités de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu rural (produit3 )

Régions	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	19,85			0	0			0	0
Cascades	9,766	3,293	1,433	4,726	33,7	3,293	0	3,293	33,7
Centre	0	0	9,61	9,61	0	0	9,61	9,61	0,0
Centre-Est	34,023	19,703	10,641	30,344	57,9	17,68	10,191	27,871	52,0
Centre-Nord	3,957	1	0	1	25,3	1	0	1	25,3
Centre-Ouest	106,08	38,65	0	38,65	36,4	38,65	0	38,65	36,4
Centre-Sud	0,892	0	44,414	44,414	0	0	44,414	44,414	0
Est	155,811			0	0			0	0
Hauts-Bassins	22,97	15,87	4,59	20,46	69,1	15,87	4,85	20,72	69,1
Nord	32,967	0,378	1,622	2	1,1			0	0,0
Plateau Central	9,346	9,346	0	9,346	100	9,346	0	9,346	100,0
Sahel	11,092	11,06	16,6	27,66	99,7	11,06	16,6	27,66	99,7
Sud-Ouest	4,05	4,05	0	4,05	100	4,05	0	4,05	100,0
DGA	8,5	8,5	6	14,5	100			0	0,0
<b>Total National</b>	<b>419,304</b>	<b>111,85</b>	<b>94,91</b>	<b>206,76</b>	<b>26,7</b>	<b>100,949</b>	<b>85,665</b>	<b>186,614</b>	<b>24,1</b>

Source : rapports bilans régionaux

En matière d'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement, des sensibilisations de masse et de proximité ont été réalisées. A la date du 31 décembre 2022, un montant de **111,85** millions de F CFA ont été

engagé sur une programmation **419,304** millions F CFA. Il faut noter que la programmation a connu une baisse considérable comparativement à celle de 2021 qui était de 1 266,425 millions F CFA. Ce résultat pourrait s'expliquer par la faible mise en œuvre des activités d'ImS/IEC. Le taux d'engagement est de **26,7** %.

**Tableau 44** : Taux d'exécution financière globale de l'Action 1

Régions	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	112,575	92,725	0	92,725	82,4	92,725	0	92,725	82,4
Cascades	31,814	25,341	1,433	26,774	79,7	25,341	0	25,341	79,7
Centre	0	0	9,61	9,61	0	0	9,61	9,61	0
Centre-Est	42,9	39,703	22,521	62,224	57,6	22,68	22,071	44,751	52,9
Centre-Nord	17,92	5	0	5	27,9	5	0	5	27,9
Centre-Ouest	137,12	103,73	6,69	110,42	43	103,73	6,69	110,42	43
Centre-Sud	22,832	18,61	45,062	63,672	81,5	18,61	45,062	63,672	81,5
Est	195,911	100,1	21,12	121,22	20,5	90,1	21,12	111,22	20,5
Hauts-Bassins	44,47	32,57	4,59	37,16	73,2	31,37	4,85	36,22	48,1
Nord	82,867	10,632	1,622	12,254	0,5	0	0	0	0
Plateau Central	19,989	19,989	0	19,989	100	19,989	0	19,989	100
Sahel	11,092	11,06	16,6	27,66	99,7	11,06	16,6	27,66	99,7
Sud-Ouest	16,487	16,487	0	16,487	100	16,487	0	16,487	100
DGA	25	25	33,944	58,944	100	25	33,944	58,944	0
<b>Total National</b>	<b>760,977</b>	<b>500,947</b>	<b>163,192</b>	<b>664,139</b>	<b>65,8</b>	<b>462,092</b>	<b>159,947</b>	<b>622,039</b>	<b>60,7</b>

Source : rapports bilans régionaux

Dans le cadre de l'éradication de la défécation à l'air libre et la promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural, **500,947** millions de F CFA ont été engagés sur une programmation de **760,977** millions. De façon globale le taux d'exécution financière de l'action 1 est de **65,8** %. Ce taux est élevé comparativement au taux de 18,7% de 2021. Bien que les montants engagés soient approximativement les mêmes, on note une très grande baisse de la programmation.

## 5.2 Action 2.1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain

Le coût des activités de suivi des secteurs déclenchés dans les villes de Dano et de Léo pour l'obtention du statut FDAL, la formation des acteurs communaux dans les villes de Réo, Diébougou, Sabou et dans la zone d'intervention du PAEA, la production et la diffusion de spots radio dans les communes de Dori et de Gorom-Gorom s'élève à 61,5 millions de francs CFA base liquidation soit 63,15%.

## 5.3 Action 3.1 : Amélioration de l'accès des populations rurales au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

Tableau 4546 : Situation de l'exécution financière des ateliers ciblés, études diagnostiques, séances d'ImS et actions soft des produits 1 et 2 en milieu rural (en millions de FCFA)

Régions	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'ImS et actions softs								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	9,8	9,8	0	9,8	100	9,8	0	9,8	100
Cascades	70,645	54	0	54	76,4	21,47	0	21,47	30,4
Centre	27	26,977	0	26,977	99,9	26,977	0	26,977	99,9
Centre-Est	17	17	0	17	100	17	0	17	100
Centre-Nord	2,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	5,5	5,5	0	5,5	100	5,5	0	5,5	100
Centre-Sud	14,8	14,8	277,765	292,565	100	14,8	277,765	292,565	100
Est	44	44	9	53	100	44	9	53	100
Hauts-Bassins	5,65	5,65	0	5,65	100	5,65	0	5,65	100
Nord	36,08	36,08	18,704	54,784	100	36,08	18,704	54,784	100
Plateau Central	8,216	8,216	0	8,216	100	8,216	0	8,216	100
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-	76,18	76,18	0	76,18	100	29,11	0	29,11	38,2



Ouest									
Total National	<b>317,791</b>	<b>298,203</b>	<b>305,469</b>	<b>603,672</b>	<b>93,8</b>	<b>218,603</b>	<b>305,469</b>	<b>524,072</b>	<b>68,8</b>

Source : rapports bilans régionaux

Sur une programmation financière de **317,791** millions pour des ateliers de cibages, des études diagnostiques, des séances d'ImS et des actions soft, le montant engagé est de **298,203** millions soit un taux d'engagement de **93,8** %. Le montant liquidé est de **218,603** millions soit un taux de **68,8**%.

**Tableau 4647** : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

Régions	Réalisation de latrines familiales										Réhabilitation de latrines familiales							
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions					Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions		
	Programme révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Programme révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	1 020,50	722,237	26,785	749,022	70,8	722,237	26,785	749,022	2,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	1 063,83	1059,532	0	1059,532	99,6	402,81	0	402,81	0,0				0	0			0	0
Centre	109,23	98,492	0	98,492	90,2	98,492	0	98,492	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	379,41	321,274	58,88	380,154	84,7	288,397	58,88	347,277	15,5	5			0	0			0	0
Centre-Nord	136,8	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	345,49	136,75	4,12	140,87	39,6	113,22	4,12	117,34	1,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	150,035	24,035	29,925	53,96	16,0	24,035	29,925	53,96	19,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	578,462	461,58	0	461,58	79,8	428,58	0	428,58	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	1 181,72	1179,524	78	1257,524	99,8	510,649	78	588,649	6,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	460,03	204,781	0	204,781	44,5	171,496	0	171,496	0,0	0,95	0,95	0,01	0,96	100	0,95	0	0,95	100
Plateau Central	267,82	241,16	0	241,16	90,0	241,16	0	241,16	0,0	0			0	0			0	0
Sahel	88,85	88,85	73,15	162	100,0	105	57,549	162,549	64,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	1 052,90	1 052,90	62,08	1114,98	100,0	492,99	0	492,99	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>6 835,08</b>	<b>5 591,12</b>	<b>332,94</b>	<b>5 924,06</b>	<b>81,8</b>	<b>3 599,07</b>	<b>255,26</b>	<b>3 854,33</b>	<b>52,7</b>	<b>5,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,01</b>	<b>0,96</b>	<b>15,97</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,95</b>	<b>16,0</b>

Source : rapports bilans régionaux 2022

Sur une programmation financière de **6 835,08** millions de F CFA, le montant engagé est de **5 591,12** millions de F CFA soit un taux de **81,8** %. Ce taux est supérieur à celui de 2021 qui était de 59,5%. Pour les réhabilitations, seules les régions du Centre-Est et du Nord ont fait des programmations pour un montant total de **5,950** millions de F CFA. Sur cette prévision, on note que seulement 0,950 millions de F CFA a été engagé dans la région du Nord soit un taux de 16,0%.

**Tableau 4748** : Situation financière de la réalisation des puisards et fosses septiques

Régions	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Programmation (b)	Hors programmation (c)	Total	Taux (100*b/a) en %
				(b+c)				(b+c)	
Boucle du Mouhoun	24,34	21,84	0	21,84	89,7	21,84	0	21,84	89,7
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0,158	0,1575	0	0,158	99,7	0,1575	0	0,158	99,7
Centre-Est	46	46	0	46	100,0	46	0	46	100
Centre-Nord	17,8	9	0	9	50,6	9	0	9	50,6
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	17,102	11,815	5,287	17,102	69,1	11,815	5,287	17,102	69,1
Est	63	54,45	0	54,45	86,4	54,45	0	54,45	86,4
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	4,5	4,5	0	4,5	100	4,5	0	4,5	100
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	20,22	19,62	0	19,62	97,0	19,62	0	19,62	97,0
<b>Total National</b>	<b>193,12</b>	<b>167,383</b>	<b>5,287</b>	<b>172,670</b>	<b>86,7</b>	<b>167,383</b>	<b>5,287</b>	<b>172,670</b>	<b>86,7</b>

Source : rapport bilan régionaux 2022

*Pour un montant prévu de **193,120** millions de FCFA pour la réalisation des puisards et fosses septiques, le taux d'exécution est de 86,7% soit un montant engagé de **167,383** millions de FCFA. Ce taux est supérieur à celui de l'année 2021 qui était de 44,2%. Le montant liquidé s'élève à **167,383** millions de FCFA.*

**Tableau 4849** : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles

Régions	Réalisation de latrines dans les écoles									Réhabilitation de latrines dans les écoles								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programma- tion révisée (a)	Issues de la programma- tion (b)	Hors programma- tion (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %	Issues de la Programma- tion (b)	Hors programma- tion (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %	Programma- tion révisée (a)	Issues de la programma- tion (b)	Hors programma- tion (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %	Issues de la Programma- tion (b)	Hors programma- tion (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/ a) en %
Boucle du Mouho un	54,9	0	37,24	37,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascad es	91,855	91,855	45,862	137,7 17	100	91,855	45,862	137,7 17	100	40	25	0	25	62,5	25	0	25	62,5
Centre	137,066	137,066	26,316	163,3 82	100	111,557	20,12	131,6 77	81,4	7,5	7,5	13,75	21,2 5	100	7,5	13,75	21,2 5	100
Centre- Est	46,275	46,023	14	60,02 3	99,5	27,386	14	41,38 6	59,2	5			0	0			0	0
Centre- Nord	32	32	34	66	100	32	34	66	100	0			0	0			0	0
Centre- Ouest	192,255	119,57	0	119,5 7	62,2	119,57	0	119,5 7	62,2	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre- Sud	55,88	38,38	28,812	67,19 2	68,7	38,38	28,812	67,19 2	68,7	2	0	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5	0
Est	75,512	4,5	0	4,5	6,0	4,5	0	4,5	6,0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts- Bassin s	92,014	65,851	53,495	119,3 46	71,6	45,72	53,495	99,21 5	49,7	2,34	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	64,825	30,98	9,88	40,86	47,8	30,645	9,46	40,10 5	47,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	72,76	48,46	15,44	63,9	66,6	48,46	15,443	63,90 3	66,6	0			0	0			0	0
Sahel	3	0	0	0	0,0			0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sud-Ouest	73,46	35,415	12,565	47,98	48,2	35,415	0	35,415	48,2	0				0	0			0	0
DGA	131	131		131	100,0			0	0,0	0				0	0			0	0
<b>Total National</b>	<b>1 122,80</b>	<b>781,10</b>	<b>277,61</b>	<b>1 058,71</b>	<b>69,6</b>	<b>585,49</b>	<b>221,19</b>	<b>806,68</b>	<b>52,1</b>	<b>89,84</b>	<b>32,50</b>	<b>20,25</b>	<b>52,75</b>	<b>36,2</b>	<b>32,50</b>	<b>20,25</b>	<b>52,75</b>	<b>36,2</b>	

Source : rapports bilans régionaux 2022

Sur une programmation de **1 122,80** millions de F CFA pour la réalisation de latrines dans les écoles, on note un engagement financier de **781,100** millions de F CFA soit un taux de **69,6 %**. Le montant liquidé s'élève à **585,49** millions de F CFA soit un taux de **52,1%**. Concernant les réhabilitations, sur une programmation de **89,840** millions de F CFA, le taux d'exécution financière est de **36,2 %** pour un montant engagé de **32,500** millions de F CFA.

**Tableau 4950:** Situation de l'exécution financière des latrines dans les centres de santé

Régions	Réalisation de latrines dans les centres de santé									Réhabilitation de latrines dans les centres de santé								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions				Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Boucle du Mouhoun	27,5	0	7,5	7,500	0	0	7,5	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Casca des	69,326	21,086	0	21,086	30,4	21,086	0	21,086	30,4	10,969	10,969	3,031	14	100	10,969	3,031	14	100
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,5	3,5	0	3,5	100	3,5	0	3,5	100
Centre -Est	49,752	46,023	14	60,023	92,5	27,386	14	41,386	55,0	1,5			0	0			0	0
Centre -Nord	9	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre -Ouest	51,91	51,91	67,66	119,570	100	51,91	67,66	119,57	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centre-Sud	11,1	3,6	0	3,6	32,4	3,6	0	3,6	32,4	0,6	0	0,351	0,351	0	0	0,351	0,351	0
Est	79,227	6,5	0	6,5	8,2	6,5	0	6,5	8,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	22,84	16,785	19,64	36,425	73,5	0	0	0	0,0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	43,23	1,712	7,516	9,228	4,0	1,712	7,516	9,228	4,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	13,54	0	16,44	16,44	0,0	0	16,44	16,44	0,0	0				0	0			0
Sahel	25,413	4	2,612	6,612	15,7	4	2,612	6,612	15,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	12,4	0	6,613	6,613	0,0	0	6,613	6,613	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>415,238</b>	<b>151,616</b>	<b>141,981</b>	<b>293,597</b>	<b>36,5</b>	<b>116,194</b>	<b>122,341</b>	<b>238,535</b>	<b>28,0</b>	<b>17,569</b>	<b>14,469</b>	<b>3,382</b>	<b>17,851</b>	<b>82,4</b>	<b>14,469</b>	<b>3,382</b>	<b>17,851</b>	<b>82,4</b>

Source : rapports bilans régionaux

La programmation financière s'élève à **415,238** millions de F CFA pour les réalisations dans les centres de santé. Au 31 décembre 2022, un montant de **151,616** millions de F CFA a été engagé soit un taux de **36,5%**. Le montant liquidé est de **116,194** millions de F CFA soit un taux de 28,0%. On enregistre une hors programmation de **141,981** millions de F CFA.

Pour les réhabilitations dans les centres de santé, sur une prévision financière de **17,569** millions de F CFA, seulement **14,469** millions de F CFA ont été engagé par les régions des Cascades et du Centre soit un taux de **82,4 %**. Cependant on note des réhabilitations hors programmation à hauteur de **3,382** millions de F CFA.

**Tableau 5054** : Situation de l'exécution financière des latrines dans les lieux publics

Régions	Réalisation de latrines dans les dans les lieux publics										Réhabilitation de latrines dans les lieux publics							
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions					Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %

Boucle du Mouhoun	31,5	22,84	0	22,84	72,5	22,84	0	22,84	72,5	0	0	3	3	0	0	3	3	0
Casca des	12	0	7,787	7,787	0	0	7,787	7,787	0,0	0			0	0			0	0
Centre	0	0	35,395	35,395	0	0	35,395	35,395	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre -Est	35	16,74	9	25,74	47,8	16,74	8,475	25,215	47,8	0,5	0,5	0	0,5	100	0,5	0	0,5	100
Centre -Nord	99	14	25	39	14,1	14	25	39	14,1	0			0	0			0	0
Centre -Ouest	23,5	16,84	0	16,84	71,7	16,84	0	16,84	71,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre -Sud	19,79	14,79	2,17	16,96	74,7	14,79	2,17	16,96	74,7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	143,637	77,5	0	77,5	54,0	46,72	0	46,72	32,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	7,11	7,11	14	21,11	100,0	2,209	14	16,209	31,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	20,558	12	4	16	58,4	12	4	16	58,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0			0	0			0	0
Sahel	27,185	6	0	6	22,1	6	0	6	22,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	7,85	2,45	0	2,45	31,2	2,45	0	2,45	31,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>429,13</b>	<b>190,27</b>	<b>97,352</b>	<b>287,622</b>	<b>44,3</b>	<b>154,589</b>	<b>96,827</b>	<b>251,416</b>	36,0	<b>2,5</b>	<b>0,5</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>100</b>	<b>0,5</b>	<b>3</b>	<b>3,5</b>	<b>100</b>

Source : rapports bilans régionaux 2022



Sur une programmation révisée de **429,130** millions de F CFA, le montant engagé est de **190,270** millions de FCFA soit un taux de **44,3%**. Ce taux a connu une baisse par rapport à celui de 2021 qui était de 66,1%. Le montant liquidé est de **154,589** millions soit un taux de 36,0%. On enregistre des hors programmations de **97,352** millions de FCFA. Des réhabilitations de latrines ont été programmées dans les lieux publics à la hauteur de 2,5 millions de F CFA.

**Tableau 5152:** taux d'exécution financière des ouvrages (réalisations, réhabilitations de latrines, puisards et fosses septique)

Régions	Programmation révisée (a)	OUVRAGES							
		Montant engagé en millions				Montant liquidé en millions			
		Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la Programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	1 158,74	766,92	74,53	841,44	66,2	766,92	37,29	804,20	66,2
Cascades	1 287,98	1 208,44	56,68	1 265,12	93,8	551,72	56,68	608,40	42,8
Centre	257,45	246,72	75,46	322,18	95,8	221,21	69,27	290,47	85,9
Centre-Est	568,44	476,56	95,88	572,44	83,8	406,41	95,36	501,76	71,5
Centre-Nord	294,60	55,00	59,00	114,00	18,7	55,00	59,00	114,00	18,7
Centre-Ouest	634,16	325,07	71,78	396,85	51,3	301,54	71,78	373,32	47,5
Centre-Sud	258,51	92,62	73,05	165,67	35,8	92,62	73,05	165,67	35,8
Est	951,84	604,53	0,00	604,53	63,5	540,75	0,00	540,75	56,8
Hauts-Bassins	1 307,02	1 269,27	165,14	1 434,41	97,1	558,58	145,50	704,07	42,7
Nord	589,59	250,42	21,41	271,83	42,5	216,80	20,98	237,78	36,8
Plateau Central	360,62	294,12	31,88	326,00	81,6	294,12	31,88	326,00	81,6
Sahel	144,45	98,85	75,76	174,61	68,4	115,00	60,16	175,16	79,6
Sud-Ouest	1 166,83	1 110,39	81,26	1 191,64	95,2	550,48	6,61	557,09	47,2
<b>Total National</b>	<b>9 111,23</b>	<b>6 929,90</b>	<b>881,81</b>	<b>7 811,71</b>	<b>76,1</b>	<b>4 671,14</b>	<b>727,54</b>	<b>5 398,68</b>	<b>51,3</b>

Source : rapports bilans régionaux 2022

Sur un montant total de 9 111,23 millions de F CFA programmé pour l'ensemble des ouvrages c'est-à-dire les nouvelles réalisations de latrines, de puisards et les réhabilitations de latrines, 6 929,90 millions de FCFA a été engagé au titre des investissements donnant ainsi un taux d'exécution financière de 76,1%. Bien que le montant programmé soit légèrement inférieur à celui de 2022, le taux d'engagement reste supérieur à celui de l'année précédente qui était de 64,57%. Le montant liquidé est de 4 671,14 millions de FCFA soit un taux de **51,3%**. On note des hors programmation d'un montant 881,81 millions de FCFA

**Tableau 5253** : Situation de l'exécution financière du produits 3 (en millions de FCFA)

Régions	Ateliers de ciblage, études diagnostiques, séances d'IMS, actions softs et autres								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	6	6	0	6	100	6	0	6	100
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	2,45	2,45	0	0	2,45	2,45	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0,7	0	9,346	9,346	0		9,346	9,346	0
Sahel	1,329	1	0	1	75,2	1	0	1	75,2

Sud-Ouest	0	0	76,18	76,18	0	0	76,18	76,18	0
<b>Total National</b>	8,029	7	87,976	94,976	87,2	7	87,976	94,976	87,2

Source : rapports bilans régionaux 2022

Sur une programmation de 8,029 millions de FCFA enregistrée en 2022 dans les régions des Cascades, plateau central et Sahel, on note une réalisation de 7 millions de F CFA. On note également une hors programmation de 87,976 millions de F CFA.

**Tableau 5354:** Taux d'exécution financière de l'action 3

Régions	ACTION 3								
	Programmation révisée (a)	Montant engagé (en millions de FCFA)				Montant liquidé (en millions de FCFA)			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	1168,54	1076,717	74,525	1151,242	92,1	1076,717	37,285	1114,002	92,1
Cascades	1364,625	1318,442	56,68	1375,122	96,6	950,1285	56,68	1006,8085	69,63
Centre	284,454	273,6925	75,461	349,1535	96,2	248,1835	69,265	317,4485	87,25
Centre-Est	585,437	493,56	95,88	589,44	84,3	423,409	95,355	518,764	72,32
Centre-Nord	297,52	255	59	314	85,7	255	59	314	85,71
Centre-Ouest	639,655	550,57	71,78	622,35	86,1	507,04	71,78	578,82	79,27
Centre-Sud	273,307	207,42	353,26	560,68	75,9	107,42	353,26	460,68	39,30
Est	995,838	948,53	9	957,53	95,2	784,75	9	793,75	78,80
Hauts-Bassins	1312,674	1274,92	165,135	1440,055	97,1	964,228	145,495	1109,723	73,46
Nord	625,673	536,503	40,11	576,613	85,7	402,883	39,68	442,563	64,39

Plateau Central	369,536	332,336	41,226	373,562	89,9	302,336	41,229	343,565	81,82
Sahel	145,777	119,85	75,762	195,612	82,2	116	60,161	176,161	79,57
Sud-Ouest	1243,01	1216,565	157,438	1374,003	97,9	629,585	82,793	712,378	50,65
DGA	131	131		131	100,0	131	0	131	100,00
<b>Total National</b>	<b>9547,446</b>	<b>8735,1055</b>	<b>1275,257</b>	<b>10010,3625</b>	<b>91,5</b>	<b>6898,68</b>	<b>1120,983</b>	<b>8019,663</b>	<b>72,3</b>

Source : rapports bilans régionaux 2022

La programmation globale de l'action 3 est de **9547,446** millions de F CFA en 2022. Sur cette programmation, un montant de **6898,68** millions de F CFA a été liquidé soit un taux de **72,3** %. Ce taux est supérieur à celui de 2021 qui était de 46,1%. On note une hors programmation de **1275,257** millions de F CFA.

#### 5.4 Action 4.1 : Amélioration de l'accès des populations urbaines au service adéquat d'hygiène et d'assainissement

**Tableau 5455** : Situation de l'exécution financière des latrines familiales (réalisations et réhabilitations), puisards et fosses septiques

Régions	Latrines familiales, puisards et fosses septiques								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	138	85		85	61,6	85		85	61,6
Cascades	88	0		0	0,0	0		0	0,0
Centre	1629	586		586	36,0	586		586	36,0
Centre-Est	205	74		74	36,1	74		74	36,1
Centre-Nord	133	86		86	64,7	86		86	64,7
Centre-Ouest	150	14		14	9,3	14		14	9,3
Centre-Sud	123	0		0	0,0	0		0	0,0

Est	70	0		0	0,0	0		0	0,0
Hauts-Bassins	944	341		341	36,1	341		341	36,1
Nord	116	73		73	62,9	73		73	62,9
Plateau Central	159	23		23	14,5	23		23	14,5
Sahel	19	0	109	109	0,0	0		0	0,0
Sud-Ouest	50	6		6	12,0	6		6	12,0
<b>Total National</b>	<b>3824</b>	<b>1288</b>	<b>109</b>	<b>1397</b>	<b>33,7</b>	<b>1288</b>	<b>0</b>	<b>1288</b>	<b>33,7</b>

Source : rapports bilans régionaux, ONEA 2022

Sur une programmation de 3824 millions de FCFA pour la réalisation et la réhabilitation des latrines familiales, puisards et fosses septiques le montant engagé et liquidé est de 1288 millions de FCFA, soit un taux de 33,7%.

**Tableau 5556** : Situation de l'exécution financière des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain

Régions	Latrines institutionnelles et publiques								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	64	0		0	0,0	0		0	0,0
Cascades	36	0		0	0,0	0		0	0,0
Centre	100	100	54	154	100,0	154		154	154,0
Centre-Est	44	42		42	95,5	42		42	95,5
Centre-Nord	56	26		26	46,4	26		26	46,4

Centre-Ouest	50	50	12	62	100,0	62		62	124,0
Centre-Sud	36	10		10	27,8	10		10	27,8
Est	12	12	6	18	100,0	18		18	150,0
Hauts-Bassins	64	64	114	178	100,0	178		178	278,1
Nord	52	44		44	84,6	44		44	84,6
Plateau Central	62	8		8	12,9	8		8	12,9
Sahel	4	0	120,24	120,24	0,0	0	95,72	95,72	0,0
Sud-Ouest	20	0		0	0,0	0		0	0,0
<b>Total National</b>	<b>600</b>	<b>356</b>	<b>306,24</b>	<b>662,24</b>	<b>59,3</b>	<b>542</b>	<b>95,72</b>	<b>637,72</b>	<b>90,3</b>

Source : rapports bilans régionaux

Sur une programmation de 600 millions de FCFA pour la réalisation des latrines dans les écoles, centre de santé et lieux publics en milieu urbain, le montant liquidé est de 542 millions, soit un taux de **90,3** % et ce, pour le compte de l'ONEA.

## 5.5 Action 5.1 : Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

**Tableau 5657:** Exécutions financières de l'action 5

Régions	Action5								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONEA	2 156,00	983,25	0	983,25	45,6	983,25	0	983,25	45,6
<b>Total National</b>	<b>2 165,00</b>	<b>983,25</b>	<b>0</b>	<b>983,25</b>	<b>45,4</b>	<b>983,25</b>	<b>0</b>	<b>983,25</b>	<b>45,4</b>

Source : rapports bilans régionaux 2022



Cette action vise une meilleure structuration et un développement de la filière de gestion des eaux usées et des boues de vidange. Dans le Nord, il était prévu l'organisation de groupements de vidangeurs pour un montant de 9 millions de FCFA mais aucune réalisation n'a été effectuées.

### 5.6 Action 6.1 : Développement de la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta

**Tableau 5758:** Exécution financière des actions de la recherche

Régions	Action6								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cascades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centre-Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Est	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plateau Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sud-Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total National</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Source : rapports bilans régionaux 2022

Concernant le développement de la recherche dans le domaine de l'AEUE, cette action n'a enregistré aucune programmation *ni de réalisation*

## 5.7 Action 7.1 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

Tableau 5859 : Exécution financière de l'action

structures	Action7								
	Montant engagé en millions					Montant liquidé en millions			
	Programmation révisée (a)	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %	Issues de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100*b/a) en %
Boucle du Mouhoun	0	0	17,125	17,125	-	0	17,125	17,125	-
Cascades	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Est	0	3	0	3	-	3	0	3	-
Centre-Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Centre-Ouest	15,73	10,3	3	13,3	65,4799746	9,6	3	12,6	61,0
Centre-Sud	0	0	3	3	-	0	3	3	-
Est	1	1	0	1	100	1	0	1	100
Hauts-Bassins	2	2	0	2	100	2	0	2	100
Nord	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Plateau Central	0	0	2,52	2,52	-	0	2,52	2,52	-
Sahel	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sud-Ouest	5,197	5,197	0	5,197	100	5,197	0	5,197	100
DGA	177,913	170	0	170	95,6	141,933	0	141,933	79,8
<b>Total National</b>	<b>201,84</b>	<b>191,497</b>	<b>25,645</b>	<b>217,142</b>	<b>94,9</b>	<b>162,73</b>	<b>25,645</b>	<b>188,375</b>	<b>80,6</b>

Source : rapports bilans régionaux 2022

Concernant le renforcement des capacités, un montant de **191,497** millions de F CFA a été engagé sur une prévision de **201,84** millions de F CFA pour les différentes formations. Les hors programmation s'élèvent à 25,645 millions F CFA.

**Tableau 5960** : Exécution financière globale du PN-AEUE

	Milieu	Prévision (en millions de FCFA)	Exécution (engagé) (millions francs CFA)	Taux engagé (%)	Exécution (liquidé) (millions francs CFA)	Taux liquidé (%)
<b>National</b>	Rural	10 543,81	8 518,38	80,79%	6009,759	57,0%
	Urbain	7 390,56	3 644,00	49,31%	1830	24,8%
	<b>National</b>	17 934,36	12 162,38	67,82%	7839,759	43,7%

Source : rapports bilan régionaux 2022

Tableau 6064: Suivi des procédures de passation des marchés publics : Plan de passation des marchés

Régions	Mode de passation des marchés							Total de marchés inscrits dans le plan de passation			
	Nbre Demande de prix		Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition		Demande de proposition allégée						
	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Acquisitions, Fournitures, bien et services	Travaux	Etudes	Global
Boucle du Mouhoun	0		1					1	0	0	1
Cascades	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Centre	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	4
Centre-Est	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
Centre-Nord	1	2	0	1	0	0	1	0	2	3	5
Centre-Ouest	3	1	6	0	0	3	0	6	6	1	13
Centre-Sud	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Est	2	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3
Hauts-Bassins	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Nord	1							0	1	0	1

Plateau Central	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Sahel	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sud-Ouest	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
<b>Total National</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>36</b>

Source : DGA, DREA

En 2022, 36 marchés ont été inscrit dans le plan de passation dont 22 pour les travaux et 07 pour les prestations intellectuelles.

**Tableau 6162:** Suivi des procédures de d'évolution des marchés publics : état d'exécution des marchés

Régions	Engagés				Liquidé	Payé				Taux d'exécution base paiement %				Nombre de marchés en souffrance
	Acquisitions, Fournitures, bien et services	travaux	Etudes	Global	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	travaux	Etudes	Global	Acquisitions, Fournitures, bien et services	travaux	Etudes	Global	
Boucle du Mouhoun	11	4	6	21	21	11	4	6	21	52%	19%	28,57	100%	
Cascades	2	2	2	6	6	2	3	2	7	33%	50%	33,33	100%	
Centre	9	5	0	14	14	9	5	0	14	64%	36%	-	100%	
Centre-Est				0					0	0%	0%	-	0%	
Centre-Nord	0	4	3	7	6	0	3	3	6	0%	43%	42,86	86%	
Centre-Ouest	7	9	1	17	17	7	9	1	17	41%	53%	5,88	100%	
Centre-	4	7	0	11	10	0	0	0	0	0%	0%		0%	


Sud												-		
Est	1	8	0	9	7	1	6	0	7	11%	67%	-	78%	
Hauts-Bassins	0	3	1	4	18	14	3	1	18	350%	75%	25,00	450%	
Nord	6	3	4	13	11	0	0	0	0	0%	0%	-	0%	
Plateau Central	15	6	4	25	15	15	0	0	15	60%	0%	-	60%	
Sahel	8	6	2	16	16	9	5	2	16	56%	31%	12,50	100%	1
Sud-Ouest	11	3	0	14	14	11	3	0	14	79%	21%	-	100%	0
<b>Total National</b>	<b>74</b>	<b>60</b>	<b>23</b>	<b>157</b>	<b>155</b>	<b>79</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>135</b>	<b>50%</b>	<b>26%</b>	<b>9,55</b>	<b>86%</b>	<b>1</b>

Source : DGA, DREA

En 2022, sur 171 marchés inscrits dans le plan de passation, 155 ont été engagés soit un taux d'engagement global de 90,64%. Tous les marchés de travaux et de prestations intellectuelles ont été engagés. Au total 79 marchés ont été liquidés et payés dont 41 pour les travaux et 15 pour les prestations intellectuelles. Le taux d'exécution global base liquidation est de 100%.

7.1 Assainissement en milieu rural

Figure 1 : Taux d'accès à l'assainissement familial en 2022 par région

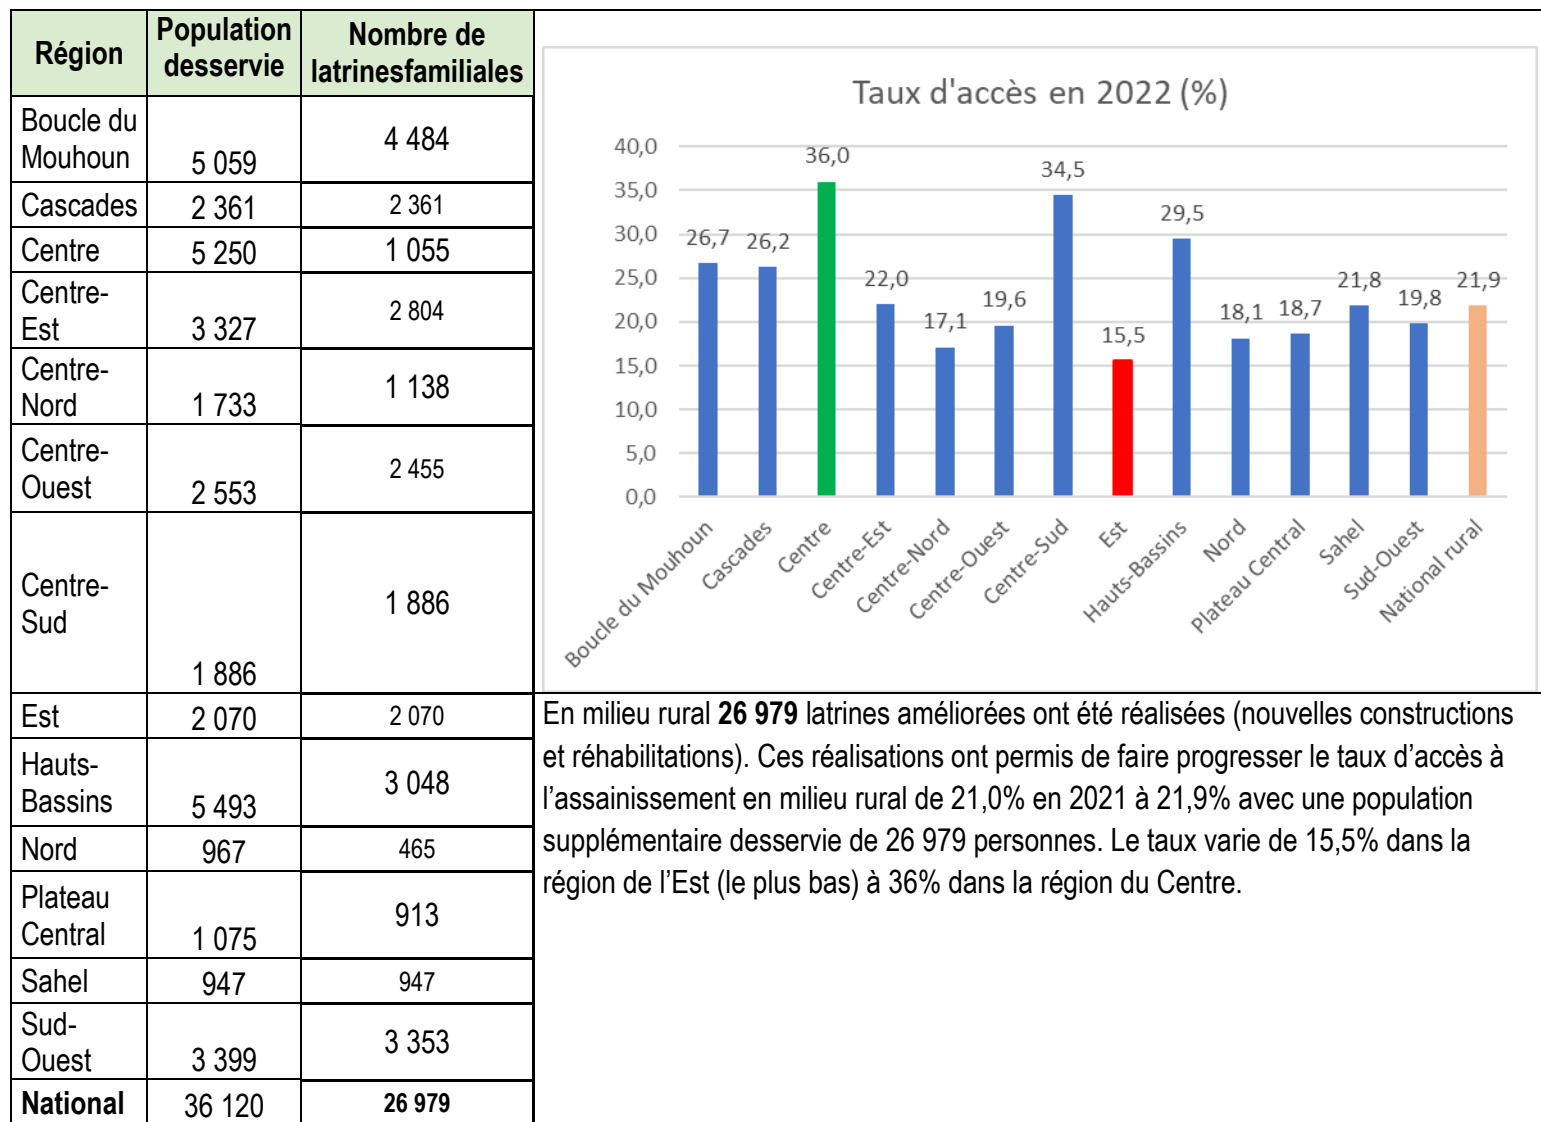

Source : BD\_INOA, DGA 2022

**Tableau 6263:** Evolution du taux d'accès à l'assainissement familial en milieu rural par région

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Boucle du Mouhoun	13,2	16,4	18,2	20,6	24,0	24,6	26,7
Cascades	9,6	10,3	11,6	14,3	18,3	19,0	26,2
Centre	30,6	34	35,6	37,5	43,7	50,7	36,0
Centre-Est	18,2	20,3	20,5	21	21,8	22,2	22,0
Centre-Nord	15,2	13,8	14,5	14,8	17,9	18,8	17,1
Centre-Ouest	12,5	14	14,7	15,7	16,9	19,5	19,6
Centre-Sud	6,8	8,7	10,1	12,4	23,3	26,4	34,5
Est	10,6	13,7	13,9	14,2	14,1	15,1	15,5
Hauts-Bassins	12,8	15,2	19,4	22,6	25,5	25,7	29,5
Nord	13,6	17,4	19,1	20,1	22,1	23,4	18,1
Plateau Central	19,7	20,2	20,7	20,9	21,3	21,7	18,7
Sahel	11,5	12,4	13,1	13,9	14,0	14,3	21,8
Sud-Ouest	13,4	14,3	16,2	16,6	17,0	18,6	19,8
National rural	<b>13,4</b>	<b>15,1</b>	<b>16,4</b>	<b>17,6</b>	19,9	<b>21,0</b>	<b>21,9</b>


Source : BD INOA 2022

L'évolution du taux d'accès par région montre que quatre régions à savoir les régions du Centre-Sud, des cascades, du Sahel, des Hauts-Bassins enregistrent les meilleures progressions annuelles avec respectivement 8,1 points pourcentage, 7.2 points pourcentage et 3,5 points pourcentage. Par contre 5 régions que sont le Centre, le Centre-Est, le Centre-Nord, le Nord le Plateau-Central, ont vu leur taux d'accès régressé avec un niveau de régression le plus prononcé de 14,7 points de pourcentage pour la région Centre. Ces régressions sont en partie liées par la différence des fluctuations de population intervenues avec le RGPH 2019 dont les données finales ont été rendues disponible courant 2022.

Au regard de cette situation des efforts supplémentaires doivent être consentis par l'ensemble des acteurs pour résorber ces gaps.




**Figure 2 : évolution du taux d'accès et population additionnelle desservie**

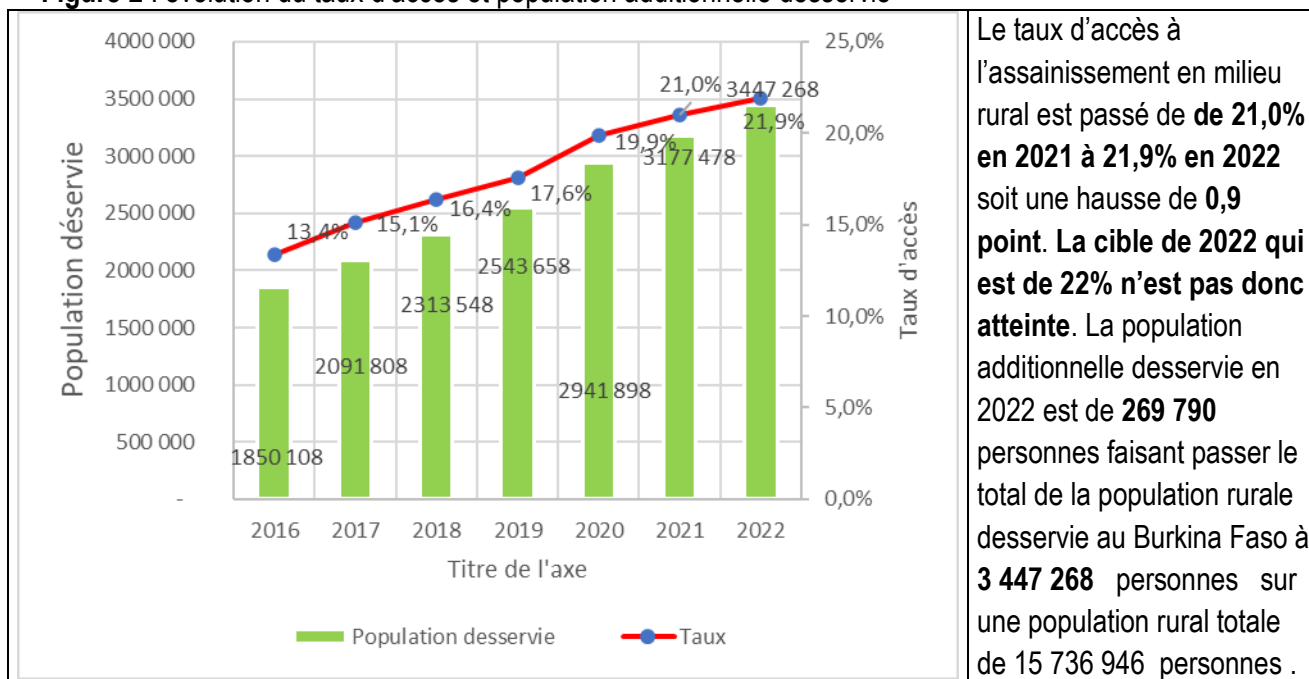

Le taux d'accès à l'assainissement en milieu rural est passé de **de 21,0% en 2021 à 21,9% en 2022** soit une hausse de **0,9 point**. La cible de 2022 qui est de **22% n'est pas donc atteinte**. La population additionnelle desservie en 2022 est de **269 790** personnes faisant passer le total de la population rurale desservie au Burkina Faso à **3 447 268** personnes sur une population rural totale de 15 736 946 personnes .

Source : BD INOA, DGA 2022


**Figure 3 : Situation de disponibilité de dispositif de lavage des mains (DLM)**

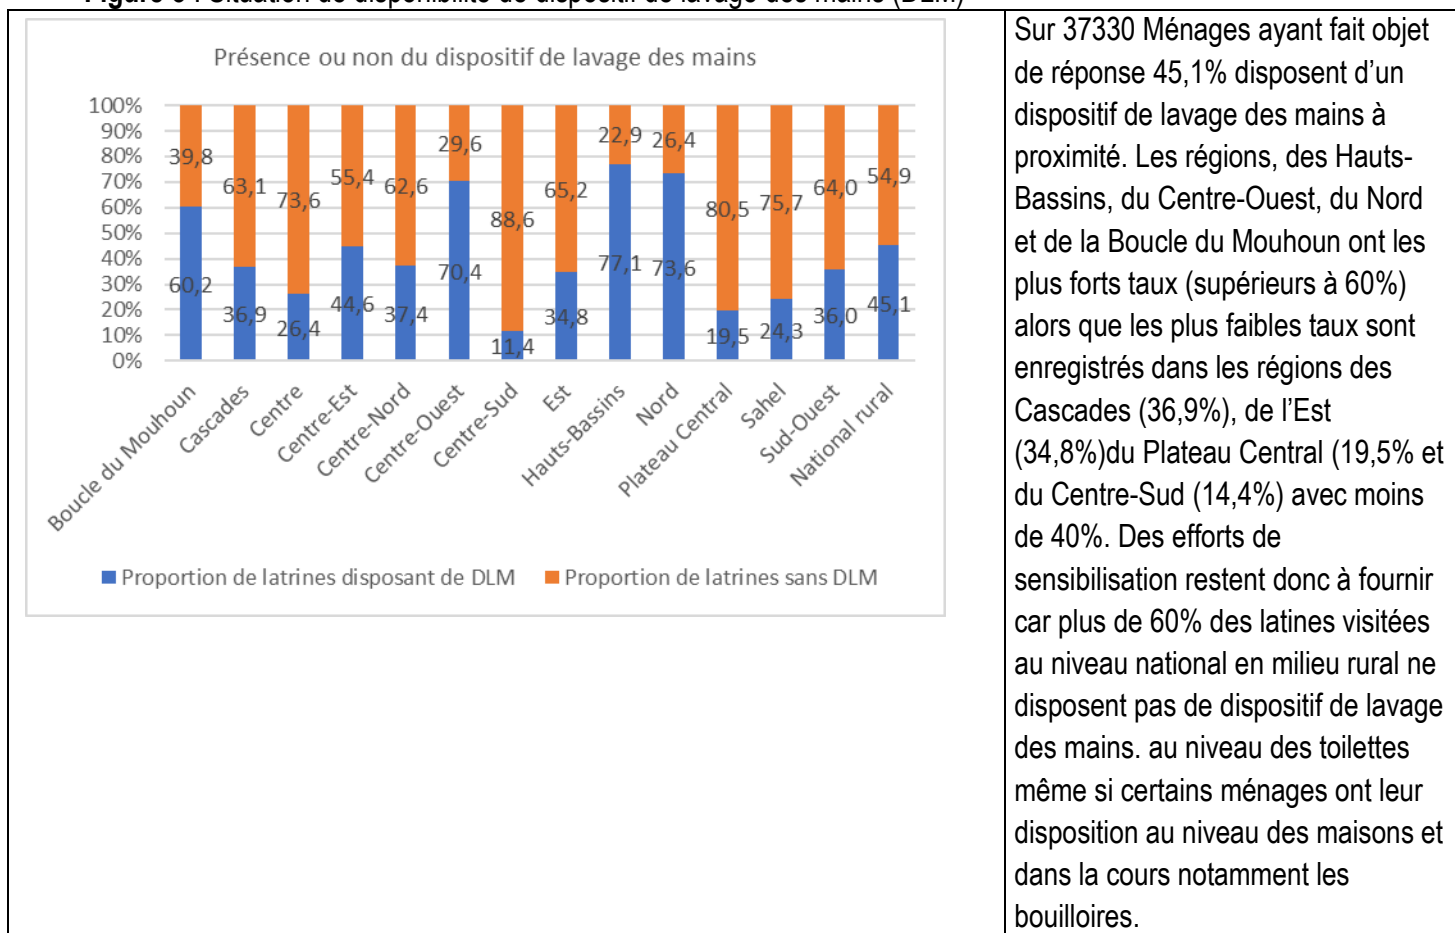

Sur 37330 Ménages ayant fait objet de réponse 45,1% disposent d'un dispositif de lavage des mains à proximité. Les régions, des Hauts-Bassins, du Centre-Ouest, du Nord et de la Boucle du Mouhoun ont les plus forts taux (supérieurs à 60%) alors que les plus faibles taux sont enregistrés dans les régions des Cascades (36,9%), de l'Est (34,8%) du Plateau Central (19,5% et du Centre-Sud (14,4%) avec moins de 40%. Des efforts de sensibilisation restent donc à fournir car plus de 60% des latrines visitées au niveau national en milieu rural ne disposent pas de dispositif de lavage des mains. au niveau des toilettes même si certains ménages ont leur disposition au niveau des maisons et dans la cours notamment les bouilloires.


Source : BD INOA, DGA 2022

**Figure 4 : Situation de la pratique de lavage des mains par les ménages**

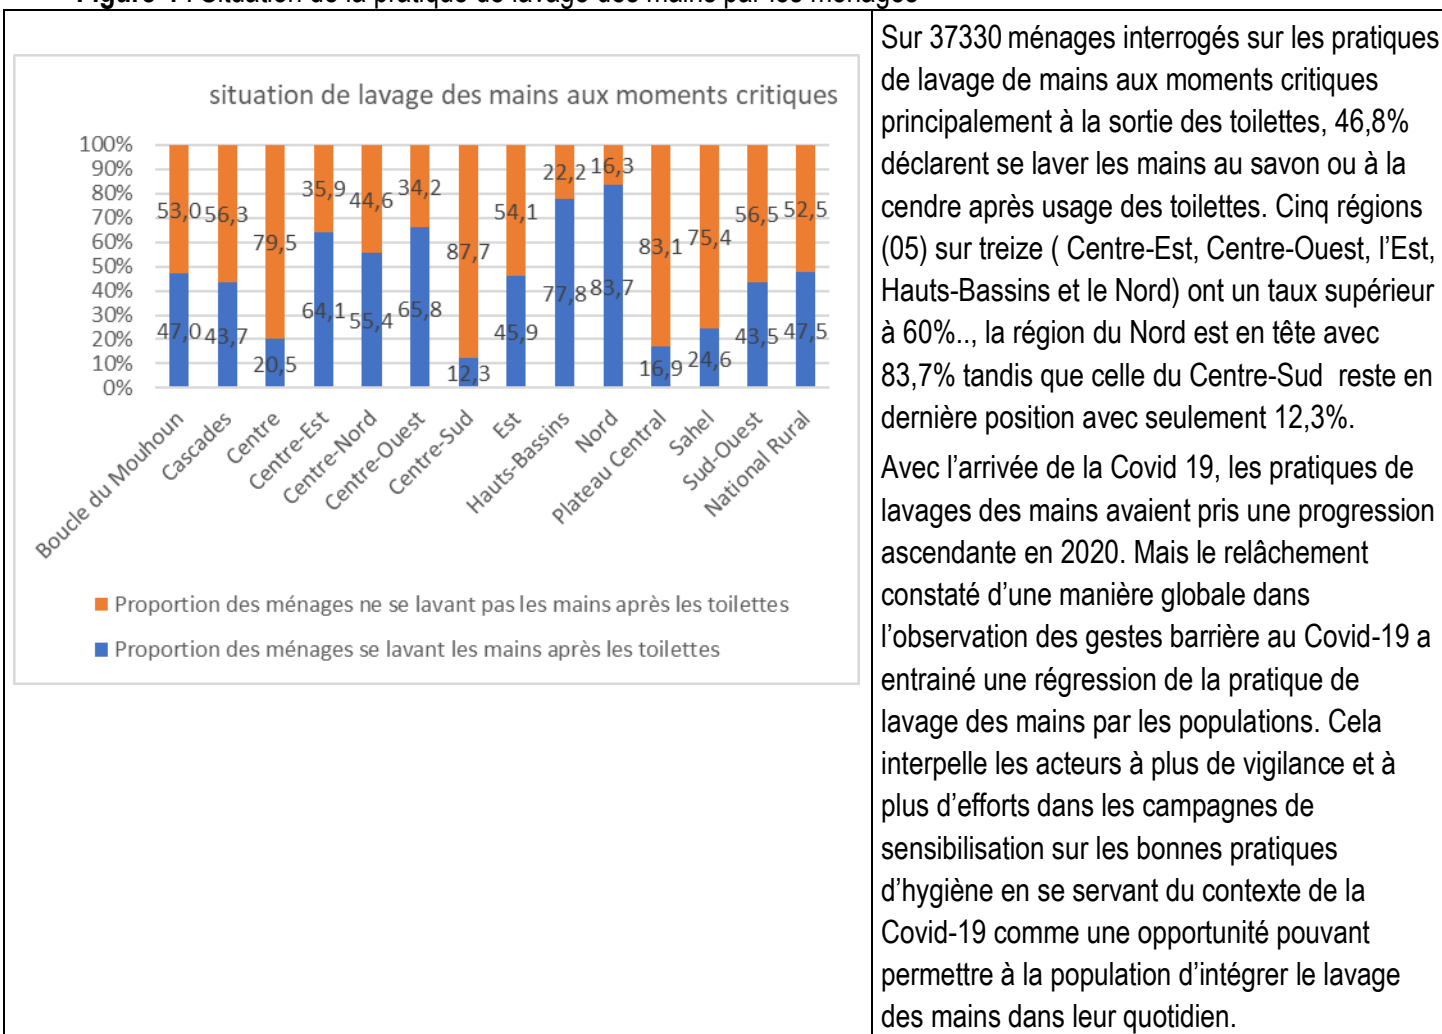

Source : BD INOA, DGA 2022

**Figure 5 : situation de l'entretien des latrines dans les ménages**

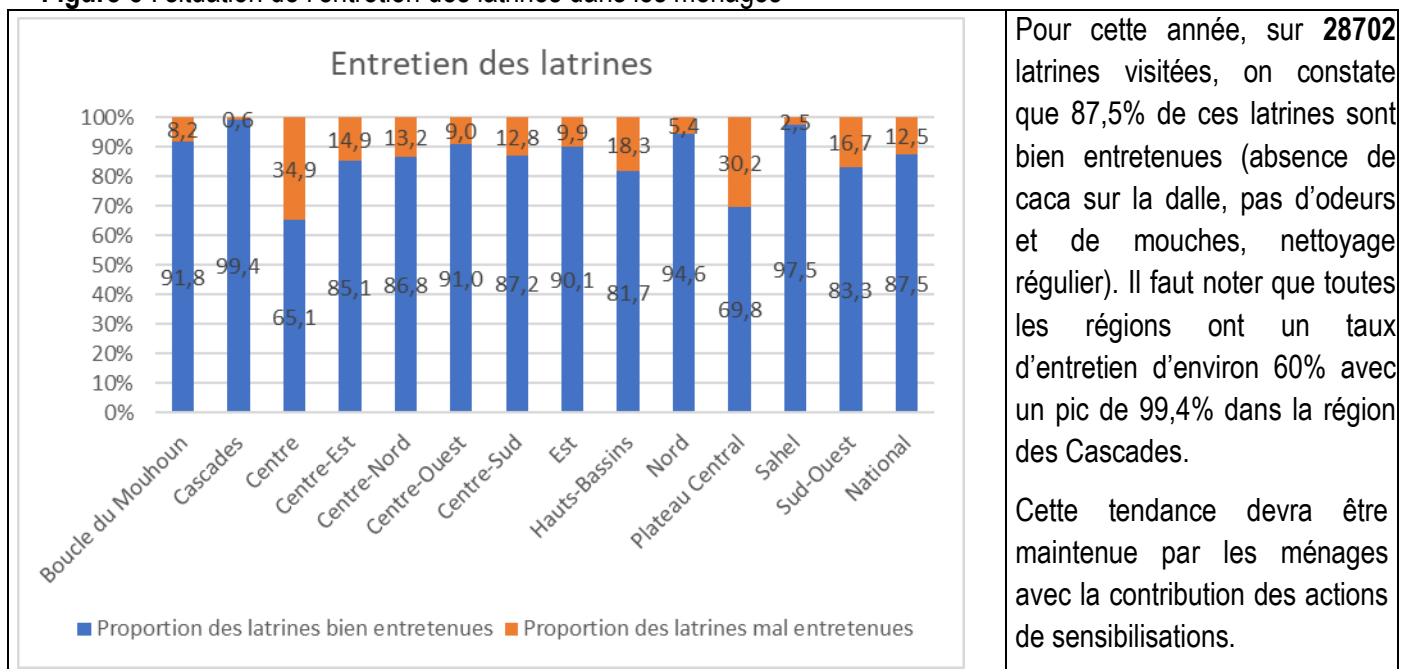

Source : BD INOA, DGA 2022

**Tableau 6364** : Proportion des latrines par acteur

	Total (nombre de latrines réalisées)	Etat	Part Etat (%)	Autres acteurs (collectivités +ONG/AD)	Part autres acteurs (%)	Ménages	Part ménages (%)
Boucle du Mouhoun	4 484	2 071	46,2	1 390	31,0	1 023	22,8
Cascades	2 361	2 215	93,8	65	2,8	81	3,4
Centre	1 055	232	22,0	191	18,1	632	59,9
Centre-Est	2 804	646	23,0	1 906	68,0	252	9,0
Centre-Nord	1 138	201	17,7	710	62,4	227	19,9
Centre-Ouest	2 455	311	12,7	1 322	53,8	822	33,5
Centre-Sud	1 886	891	47,2	939	49,8	56	3,0
Est	2 070	594	28,7	1 346	65,0	130	6,3
Hauts-Bassins	3 048	2 502	82,1	458	15,0	88	2,9
Nord	465	93	20,0	181	38,9	191	41,1
Plateau Central	913	624	68,3	159	17,4	130	14,2
Sahel	947	88	9,3	820	86,6	39	4,1
Sud-Ouest	3 353	3 115	92,9	6	0,2	232	6,9
<b>Total national</b>	<b>26 979</b>	<b>13 583</b>	<b>50,3</b>	<b>9 493</b>	<b>35,2</b>	<b>3 903</b>	<b>14,5</b>

Source : BD INOA 2022

Sur un total de 26 979 latrines familiales réalisées (réhabilitations y compris), l'effort de l'Etat est de 50,3% soit 13 583 latrines supérieur à celui de 2021 qui était 28,7% . En ce qui concerne les autres acteurs (collectivités et ONG/AD) leur part de réalisations s'élève à 9 493 latrines soit 35,2% du total annuel. Ce nombre est largement inférieur à celui de 2021 qui était de 11840 latrines soit 20% de moins. Cela pourrait s'expliquer du fait de l'aggravation de la situation sécuritaire en 2022 qui a restreint l'accès à certains sites de travaux mais aussi et plusieurs acteurs ont intervenu dans l'humanitaire au détriment du développement.

Les latrines non subventionnées (autoréalisations par les ménages) qui traduisent l'effort de la population sont au nombre de 3 903 soit 14,5%. Ce taux est inférieur à celui de 2021 qui était de 21%.

Dans un contexte, d'amenuisement des financements l'Etat et les ménages devront doubler d'effort dans la mise en œuvre du programme en vue de désresponsabiliser progressivement des partenaires au développement, contre une montée progressive des financements internes dans l'optique de la pérennité et de la durabilité.

Pour ce qui est des ménages, des efforts doivent toujours être consentis dans la communication pour le changement de comportement des populations afin de susciter davantage les autoréalisations.

**Tableau 6465** : Situation de l'état de Fin de défécation à l'air libre

Régions	Nombre de villages (a)	Cumul de villages déclenchés (b)	Cumul de villages déclarés FDAL (c)	Taux de déclaration FDAL (d=c/a)*100	Cumul de villages certifiés FDAL (e)	Taux de certification FDAL (f=e/a)*100
Boucle du Mouhoun	985	284	20	2,0	0	0,0
Cascades	291	175	1	0,3	0	0,0
Centre	188	44	0	0,0	0	0,0
Centre-Est	753	551	17	2,3	4	0,5
Centre-Nord	965	230	46	4,8	8	0,8
Centre-Ouest	595	362	225	37,8	186	31,3
Centre-Sud	541	195	29	5,4	22	4,1
Est	846	461	274	32,4	155	18,3
Hauts-Bassins	483	224	0	0,0	0	0,0
Nord	914	215	30	3,3	0	0,0
Plateau Central	581	155	10	1,7	0	0,0
Sahel	701	294	89	12,7	39	5,6
Sud-Ouest	1066	77	41	3,8	6	0,6
<b>Total National</b>	<b>8909</b>	<b>3267</b>	<b>782</b>	<b>8,8</b>	<b>420</b>	<b>4,7</b>

Source : Rapports bilans regionaux2022

Le taux de déclaration est passé de 6,6% en 2021 à 8,8% en 2022 soit une progression de 2,2 points pourcentage. La cible de déclaration FDAL fixé à 7% est donc atteinte. Cependant, le taux de déclaration FDAL reste toujours faible au regard du nombre élevé de villages déclenchés (3267).

Quant à la certification, le taux est passé de 3,9% en 2021 à 4,7% en 2022 soit une progression de 0,8 point. La cible de 4,5% est donc réalisé.

Les régions du Centre-Ouest, de l'Est et du Sahel ont les plus forts taux de déclaration FDAL et de certification.

Par ailleurs, les régions des Hauts-Bassins, du Centre, de la Boucle de Mouhoun, des Cascades, du Nord et du Plateau Central n'ont toujours pas enregistré de villages ayant mis fin à la défécation à l'air libre. Dans ces régions, plusieurs acteurs ont entamé le processus de l'abandon de la Défécation à l'Air Libre sans pour autant l'achever. Aussi, les acteurs ont plus mis l'accent ces dernières années sur la relance des villages abandonnés avant certification. Il est nécessaire de poursuivre les sensibilisations et le suivi des communautés afin d'atteindre le statut FDAL des villages touchés par l'ATPC.

La province de la Sissili dans la région du Centre-Ouest a atteint le statut FDAL pour ce qui est du milieu rural. Cela démontre une avancée en termes de réussite de l'ATPC au Burina Faso et interpelle les autres acteurs à concentrer leurs efforts dans une zone d'intervention bien définie pour l'atteinte de meilleurs résultats et ceci à travers la mise en œuvre de l'approche commune définie le Plan d'action 2021-2025 du PN-AEUE.

**Tableau 6566** : Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural

Regions	Ecoles			Centre de santé		
	Nombre d'écoles (a)	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (b)	Taux (%) (b/a)	Nombre de CSPS (c)	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (d)	Taux (%) (d/c)
Boucle du Mouhoun	882	721	81,7	172	150	87,4
Cascades	532	456	85,7	103	103	100,0
Centre	525	476	90,7	56	56	100,0
Centre-Est	1052	895	85,1	187	160	85,7
Centre-Nord	972	848	87,2	105	105	100,0
Centre-Ouest	1202	1 093	90,9	233	233	100,0
Centre-Sud	636	566	89,0	143	142	99,3
Est	504	427	84,7	154	141	91,8
Hauts-Bassins	986	783	79,4	177	174	98,3
Nord	910	707	77,7	207	178	86,2
Plateau Central	737	691	93,8	154	152	98,7
Sahel	117	110	94,0	123	114	92,7
Sud-Ouest	813	623	76,6	139	135	97,4
<b>National</b>	9868	8396	85,1	1953	1845	94,5

Source : Rapports bilans régionaux 2022

Le taux d'équipement des écoles a évolué de 84,5% en 2021 à 85,1% en 2022 pour une cible de 85%, la cible est donc atteinte. Les taux varient de 76,6% dans la région du Sud-Ouest à 94, dans la région du Sahel. Cependant, ce taux pourrait comporter d'énormes disparité à cause de la fermeture des écoles pour raisons d'insécurité.

Quant aux CSPS, le taux d'équipement a progressé de 5,1 points pourcentage, passant de 89,4% en 2021 à 94,5% en 2022. La cible de 2022 fixée à 90% est donc atteinte. Cet élan devra être soutenu par les acteurs et accompagné par le développement et la mise en place de mécanismes de gestion adéquats des latrines dans les institutions (écoles et centres de santé) et les lieux publics.

## 7.2 Assainissement en milieu urbain


**Tableau 6667** : taux d'accès 2022 par région en milieu urbain

Région	Communes concernés	Réalisations 2022	Population totale desservie 2022	Taux (%)
Boucle du Mouhoun	Dédougou, Toma, Tougan, Boromo, Nouna, Solenzo	575	91 731	38,8
Cascades	Banfora, Bérégadou, Niangoloko, Sindou	0	50 658	27,1
Centre	Ouagadougou, Saaba, Pabré	4195	1 521 866	48,6
Centre-Est	Tenkodogo, Koupela, Zabré, Bittou, Garango, Poytenga	523	89 625	26,0
Centre-Nord	Kaya, Kongoussi, Boulsa	595	76 351	32,2
Centre-Ouest	Koudougou, Sabou, Réo, Léo, Fara, Poura	98	130 280	37,2
Centre-Sud	Manga, Kombissiri, Pô	0	29 464	32,7
Est	Fada N'Gourma, Bogandé, Gayeri, Kompienga, Diapaga, Pama	0	61 189	36,5
Hauts-Bassins	Bobo Dioulasso, Orodara, Houndé	2445	448 472	38,2
Nord	Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy	502	109 033	37,7
Plateau-Central	Ziniare, Lombila, Boussé, Zorgho	162	25 667	23,0
Sahel	Dori, Djibo, Gorom-Gorom (+ Arbinda), Sebba	0	40 115	19,9
Sud-Ouest	Diébougou, Gaoua	46	40 681	31,5
<b>Total National</b>		<b>9141</b>	<b>2 715 133</b>	<b>40,8</b>

Source : ONEA 2022


En 2022, le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain est resté identique à celui de 2021 c'est-à-dire 40,8%. La cible de 2022 fixée à 41% n'est pas atteinte. Cette contre-performance s'explique par le faible niveau de réalisation des latrines par l'ONEA en 2022 à cause de la suspension de travaux des ouvrages du PAEA. Ce taux varie de 19,9% dans les zones urbaines du Sahel à 48,6% dans la région du Centre. En clair toutes les régions ont un taux en-dessous de 50%. Une telle situation en milieu urbain ne favorise pas un optimisme quant à l'accès universel pour tous.

**Figure 6:** Evolution du taux d'accès en milieu urbain

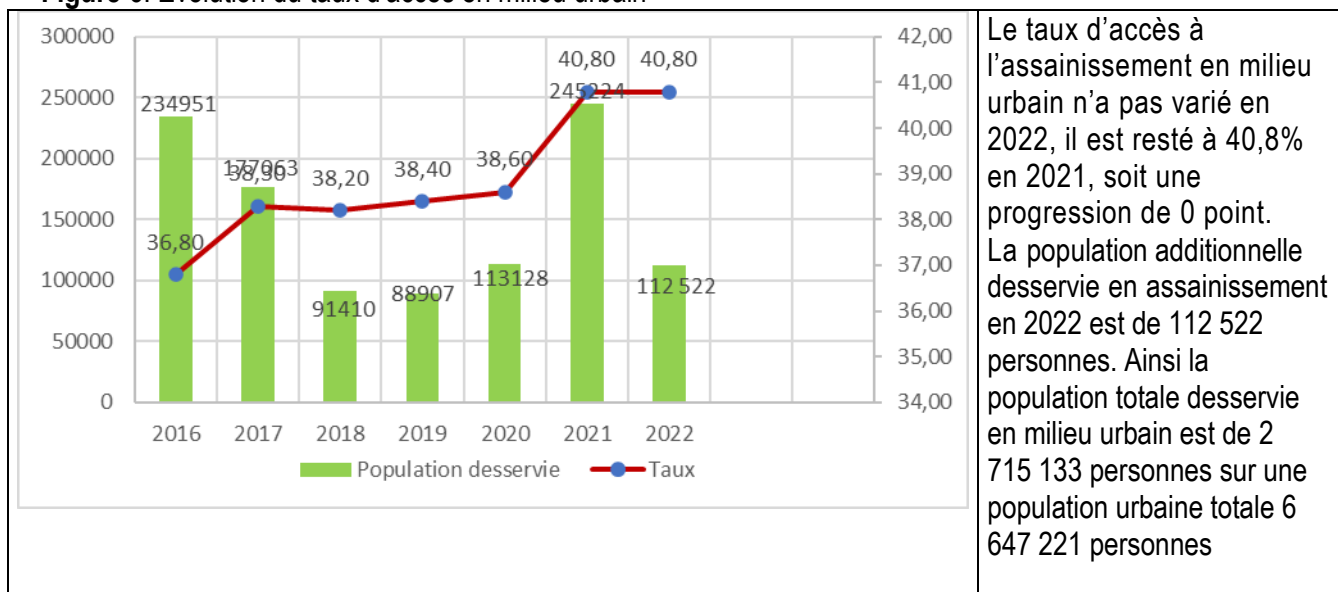

### 7.3 Assainissement national

**Figure 7:** Taux globaux de l'assainissement

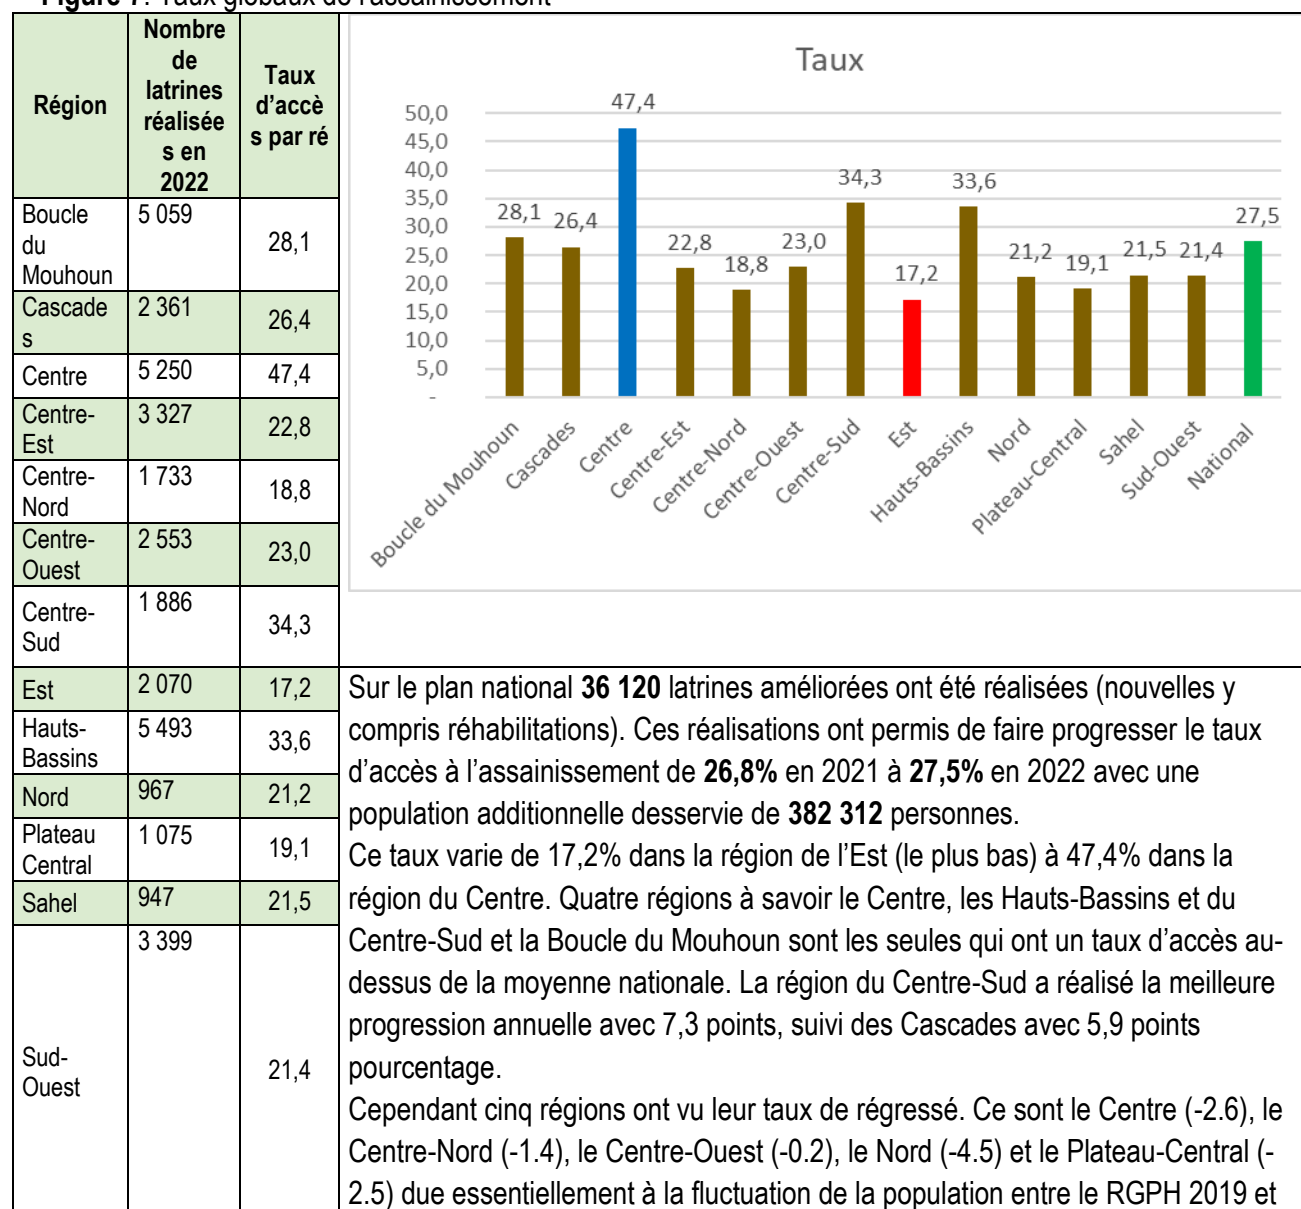


			les projections du RGPH 2006.
National	<b>36 120</b>	<b>27,5</b>	

Source : BD INOA 2021, ONEA 2022



**Figure 8:** Evolution du taux d'accès national

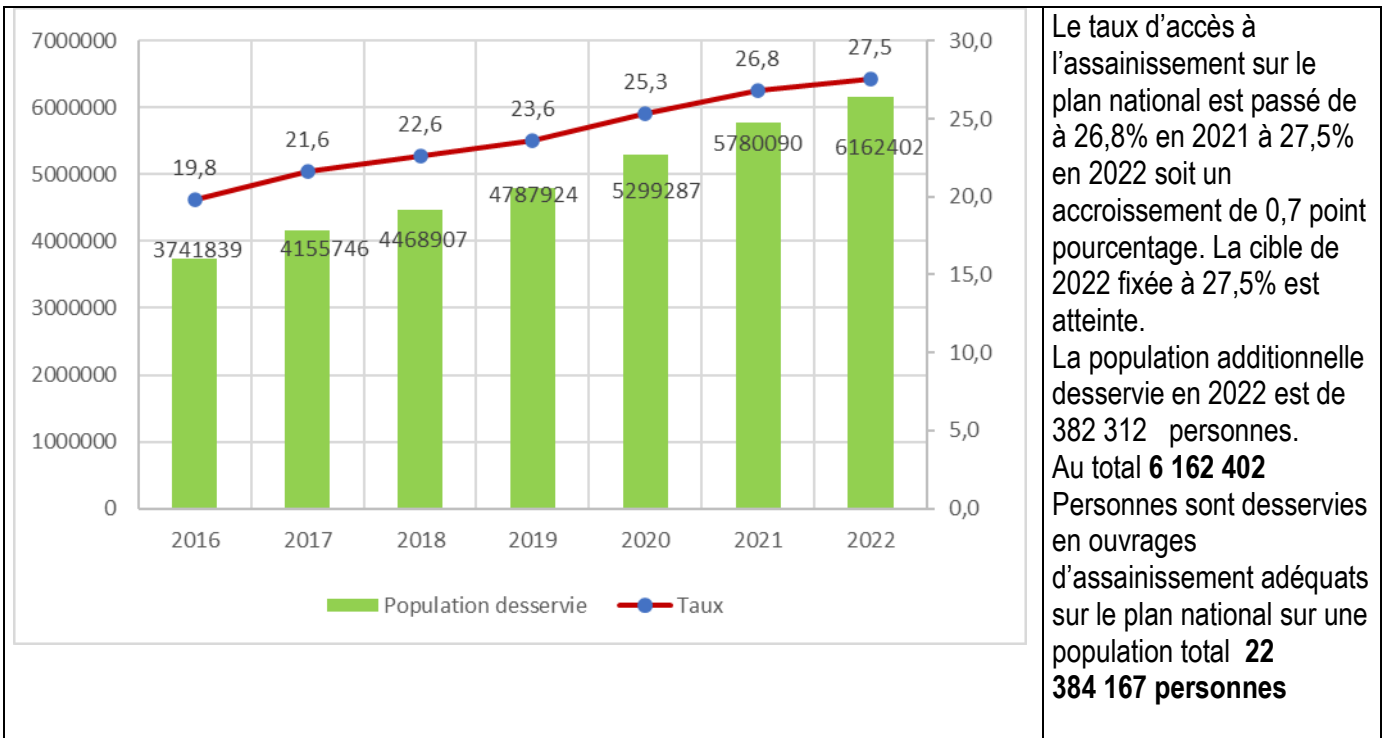

Source : DGA 2022

**Tableau 6768:** situation des indicateurs de performance du PN-AEUE

Indicateur	Réalisation 2021	Cible 2022	Réalisation 2022	Commentaire
Taux d'accès national à l'assainissement	26,8	27,5	27,5	
Taux d'accès à l'assainissement en milieu rural	21,0	41,0	40,8	La cible de 2022 n'est pas atteinte, Cela pourrait s'expliquer par le faible niveau de réalisation des latrines par l'ONEA en 2022 à cause de la suspension de travaux de réalisation des ouvrages du PAEA
Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain	40,8	22,0	21,9	La cible de cet indicateur n'est pas atteinte pour diverses raisons dont la principale est la dégradation de la situation sécuritaire.
Nombre de villages touchés par le déclenchement (annuellement)	279	368	239	La cible de 2022 n'est pas atteinte, principalement dû à la situation sécuritaire défavorable.
Proportion de village déclarés FDAL (%)	20,6	7,0	8,6	
Taux d'équipement des écoles en latrine	84,5	85,0	85,1	
Taux d'équipement des centres de santé en latrine	89,4	90,0	94,5	
Nombre de sites de dépotages réalisés	0	0	0	Aucune réalisation faite en 2022 cependant la région du Nord a mené une étude diagnostique pour la réalisation d'une station de boue de vidange.
Nombre de latrines familiales hygiéniques construites en milieu péri-urbain	Données non collectées par l'ONEA	10 000	-	Cet indicateur était renseigné dans le cadre du projet Périsan qui est achevé depuis 2016

Source : DGA 2022

## 8 FINANCEMENT DU PROGRAMME

**Tableau 6869 :** Financements acquis par rapport aux besoins de financement (en milliards de FCFA)

Coût Total du PN-AEUE 2016-2030	Financement acquis 2016-2020	Taux de mobilisation par rapport au plan d'action 2016-2020	Coût du plan d'action 2021-2025 en milieu rural	Financement acquis du plan d'action 2021-2025	Taux de mobilisation du plan d'action 2021-2025	Montant exécuté	Taux d'exécution du montant mobilisé	Montant total réalisé depuis 2016 à 2022	Taux global de réalisation depuis la mise en œuvre du PN-AEUE
			(en milliards)	(en milliards)					
(en milliards)	(en milliards)					(en milliards)			

(a)	(b)	$c = b/a * 100$	d	(e)	$f = e/d * 100$	g	$h = g/e * 100$	$i = b + g$	$j = i/a * 100$
<b>1 215,95</b>	<b>79,01</b>	<b>6,50%</b>	<b>151,758</b>	<b>33,50</b>	<b>22,1%</b>	<b>23,06</b>	<b>68,8%</b>	<b>102,07</b>	<b>8,39%</b>

Source : DGA 2023

**Commentaire** : le taux du financement acquis pour la mise en œuvre du Programme est très faible au regard du temps restant pour clôturer la phase du programme.

9.1 Principaux freins

Tableau 6970: Difficultés et propositions de solutions

Difficultés	Propositions de solutions	Responsables
Défaillance de certaines entreprises dans l'exécution des travaux	Plus de rigueur et de vigilance dans le recrutement des entreprises, appliquer les sanctions réservées aux entreprises défaillantes Assurer la mise en œuvre de l'AMOC	Communes, MEEA
Insuffisance de ressources humaines qualifiées	Renforcer les compétences et le personnel du service en charge du volet eau potable et assainissement dans certaines communes	Partenaires ; MEEA
Insuffisance de ressources financières	Allouer plus de ressources financières aux communes dans le domaine de l'assainissement. Développer des mécanismes endogènes de mobilisation des finances.	Partenaires ; Ministères en charge de l'eau ; de la santé, de l'éducation, Collectivités territoriales
Non mise à disposition de données relatives à la situation physique et financière par certains acteurs	Renforcer la collaboration entre acteurs pour la mise à disposition de leurs bilans et programmations à bonne date	Partenaires ; MEEA
Difficultés d'accès liées au contexte sécuritaire dans certaines localités des régions	Orienter les réalisations/ réhabilitations des ouvrages d'assainissement vers les sites plus accessibles et dans les familles d'accueil DGDI Respecter les consignes sécuritaires Adopter les mesures de résiliences	MEEA, Partenaires
Faible appropriation de l'assainissement familial par les populations	Mettre l'accent sur les activités d'intermédiation sociale.	MEEA, Partenaires
Non-respect des documents stratégiques en matière d'assainissement dans l'intervention de certains acteurs	Organiser des ateliers de coordination et de vulgarisation des différents documents	DGA, DREA
Multiplicité des acteurs sur un même site avec des approches différentes	Maintenir activement les cadres de concertation	MEEA, DREA
Changement institutionnel entravant la bonne mise en œuvre des activités	Plus de diligence dans la mise en œuvre des activités et d'exécution des travaux	MEEA, DREA, Partenaires
Lourdeur administrative concernant les fonds transférés	Accélérer les procédures d'attribution des fonds transférés Accélérer les procédures de passation des marchés Accélérer les procédures administratives	MEEA, DREA, MEFP

Suspension du PAEA	Reprendre les travaux en vue de réaliser les latrines prévues	MEEA, PAEA
--------------------	---	------------

Source : DGA, DREA

---

## 10 CONCLUSION

---

En milieu rural, pour l'année 2022, le bilan physique des réalisations des ouvrages d'assainissement est assez satisfaisant. On note la réalisation de **26 979** latrines familiales (nouvelles réalisations et réhabilitations), 723 latrines institutionnelles et publiques ainsi que la réalisation de 3356 puisards. Ces réalisations ont permis de desservir 269 790 personnes supplémentaires portant le taux d'accès à l'assainissement à 21,9% pour une cible de 22%.

Quant à l'éradication de la défécation à l'air libre, 121 villages supplémentaires ont été déclarés FDAL portant ainsi le nombre de villages déclaré FDAL à 782 soit un taux de déclaration FDAL de 8,8% pour une cible de 7%. En outre, 79 nouveaux villages ont été certifiés FDAL, augmentant le nombre total de village certifié à 420 soit un taux de certification de 4,7% pour une cible de 4,5%.

Plusieurs actions de sensibilisations de proximité dans les ménages, les lieux institutionnels et publics, ont permis de toucher 806 455 personnes dont 51% (414 918) de femmes et de filles, dans 98 104 ménages, 93 écoles et centres de formation, 65 centres de santé et 524 lieux publics.

En milieu urbain, le nombre de latrines familiales réalisées est de 9141, celui des latrines institutionnelles et publiques est de 347 et 7273 puisards. Ces réalisations ont permis de desservir 112 522 personnes additionnelles. Le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain n'a pas varié en 2022, il est resté à 40,8% en 2021, soit une progression de 0 point. La cible de 41% n'est donc pas atteinte.

Sur le plan national, au total 37 443 latrines familiales ont été réalisées, 1070 latrines institutionnelles et publiques et 10 629 puisards. Ces réalisations ont permis de porter le taux d'accès national à l'assainissement à 27,5% contre une cible de 27,8% qui n'est donc atteinte.

La population totale desservie en assainissement au plan national est de **6 162 402** personnes sur une population totale de **22 384 167**.

Il faut noter que la mise en œuvre des activités s'est déroulée dans un contexte national particulièrement difficile marqué par la situation socio-politique instable et l'insécurité ayant occasionné des restrictions et/ou des régulations budgétaires de l'Etat. A cette difficulté, on peut ajouter l'insuffisance de suivi des activités surtout en fin d'année, qui ne favorise pas la collecte effective des informations relatives à toutes les activités menées sur le terrain, créant ainsi une insuffisance dans la performance ; d'où le non atteint de certains des indicateurs.

---

## ANNEXES

---

**Tableau 7074:** Evolution du taux d'accès par province

Régions	Provinces	Populati on urbaine projetée	Populati on rurale projetée	Populati on totale projetée	Populati on desservi e urbaine	Populati on desservi e rurale	Populati on totale desservi e	Taux d'accès urbain	Taux d'accès rural	Taux d'accès provinci al
BOUCLE DU MOUHOUN	BALE	56 471	264 031	320 502	25 597	162 160	187 757	45,3	61,4	58,6
BOUCLE DU MOUHOUN	BANWA	27 091	340 060	367 151	4 494	72 225	76 719	16,6	21,2	20,9
BOUCLE DU MOUHOUN	KOSSI	35 404	342 623	378 027	16 718	67 907	84 625	47,2	19,8	22,4
BOUCLE DU MOUHOUN	MOUHOUN	71 280	347 670	418 950	24 674	85 483	110 157	34,6	24,6	26,3
BOUCLE DU MOUHOUN	NAYALA	16 775	223 017	239 792	3 653	31 039	34 692	21,8	13,9	14,5
BOUCLE DU MOUHOUN	SOUROU	29 131	273 020	302 151	16 596	59 523	76 119	57,0	21,8	25,2
<b>BOUCLE DU MOUHOUN</b>		<b>236 151</b>	<b>1 790 421</b>	<b>2 026 572</b>	<b>91 731</b>	<b>478 337</b>	<b>570 068</b>	<b>38,8</b>	<b>26,7</b>	<b>28,1</b>
CASCADES	COMOE	178 699	520 821	699 520	49 465	116 269	165 733	27,7	22,3	23,7
CASCADES	LERABA	7 956	187 339	195 295	1 193	69 619	70 812	15,0	37,2	36,3
<b>CASCADES</b>		<b>186 655</b>	<b>708 160</b>	<b>894 815</b>	<b>50 658</b>	<b>185 888</b>	<b>236 546</b>	<b>27,1</b>	<b>26,2</b>	<b>26,4</b>
<b>CENTRE</b>	<b>KADIOGO</b>	<b>3 130 798</b>	<b>323 575</b>	<b>3 454 373</b>	<b>1 521 866</b>	<b>116 450</b>	<b>1 638 316</b>	<b>48,6</b>	<b>36,0</b>	<b>47,4</b>
CENTRE-EST	BOULGOU	166 855	625 552	792 407	67 753	100 987	168 740	40,6	16,1	21,3
CENTRE-EST	KOULPELOGO	14 343	387 245	401 588	1 721	96 224	97 945	12,0	24,8	24,4
CENTRE-EST	KOURITTENGA	163 594	359 635	523 229	20 151	104 100	124 251	12,3	28,9	23,7
<b>CENTRE-EST</b>		<b>344 792</b>	<b>1 372 432</b>	<b>1 717 224</b>	<b>89 625</b>	<b>301 311</b>	<b>390 936</b>	<b>26,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,8</b>
CENTRE-NORD	BAM	63 853	475 520	539 373	7 662	92 378	100 041	12,0	19,4	18,5
CENTRE-NORD	NAMENTENGA	25 936	542 577	568 513	16 052	101 937	117 989	61,9	18,8	20,8
CENTRE-NORD	SANMATENGA	146 973	804 745	951 718	52 637	117 279	169 916	35,8	14,6	17,9
<b>CENTRE-NORD</b>		<b>236 762</b>	<b>1 822 842</b>	<b>2 059 604</b>	<b>76 351</b>	<b>311 594</b>	<b>387 945</b>	<b>32,2</b>	<b>17,1</b>	<b>18,8</b>
CENTRE-OUEST	BOULKIEMDE	200 858	543 522	744 380	66 353	108 959	175 312	33,0	20,0	23,6
CENTRE-OUEST	SANGUIE	57 326	361 247	418 573	23 389	78 132	101 521	40,8	21,6	24,3
CENTRE-OUEST	SISSILI	60 237	318 563	378 800	36 108	46 163	82 271	59,9	14,5	21,7
CENTRE-OUEST	ZIRO	31 327	229 539	260 866	4 429	51 633	56 062	14,1	22,5	21,5
<b>CENTRE-OUEST</b>		<b>349 748</b>	<b>1 452 871</b>	<b>1 802 619</b>	<b>130 280</b>	<b>284 887</b>	<b>415 166</b>	<b>37,2</b>	<b>19,6</b>	<b>23,0</b>
CENTRE-SUD	BAZEGA	29 960	261 716	291 676	12 785	106 691	119 476	42,7	40,8	41,0
CENTRE-SUD	NAHOURI	29 026	186 501	215 527	3 663	42 135	45 798	12,6	22,6	21,2
CENTRE-SUD	ZOUNDWEOGO	31 131	296 216	327 347	13 016	107 705	120 721	41,8	36,4	36,9
<b>CENTRE-SUD</b>		<b>90 117</b>	<b>744 433</b>	<b>834 550</b>	<b>29 464</b>	<b>256 531</b>	<b>285 995</b>	<b>32,7</b>	<b>34,5</b>	<b>34,3</b>
EST	GNAGNA	23 312	730 519	753 831	2 797	168 874	171 671	12,0	23,1	22,8
EST	GOURMA	83 311	387 068	470 379	51 087	63 070	114 157	61,3	16,3	24,3
EST	KOMANDJARI	18 748	94 889	113 637	2 250	9 397	11 647	12,0	9,9	10,2
EST	KOMPIENGA	24 248	112 696	136 944	2 910	23 246	26 156	12,0	20,6	19,1
EST	TAPOA	17 875	652 987	670 862	2 145	42 890	45 035	12,0	6,6	6,7
<b>EST</b>		<b>167 494</b>	<b>1 978 159</b>	<b>2 145 653</b>	<b>61 189</b>	<b>307 477</b>	<b>368 667</b>	<b>36,5</b>	<b>15,5</b>	<b>17,2</b>

Régions	Provinces	Populati on urbaine projetée	Populati on rurale projetée	Populati on totale projetée	Populati on desservi e urbaine	Populati on desservi e rurale	Populati on totale desservi e	Taux d'accès urbain	Taux d'accès rural	Taux d'accès provinci al
HAUTS-BASSINS	HOUET	1 032 006	643 625	1 675 631	401 821	159 628	561 449	38,9	24,8	33,5
HAUTS-BASSINS	KENEDOUG OU	36 303	395 873	432 176	5 846	128 823	134 668	16,1	32,5	31,2
HAUTS-BASSINS	TUY	104 638	255 772	360 410	40 806	93 031	133 837	39,0	36,4	37,1
<b>HAUTS-BASSINS</b>		<b>1 172 947</b>	<b>1 295 270</b>	<b>2 468 217</b>	<b>448 472</b>	<b>381 481</b>	<b>829 953</b>	<b>38,2</b>	<b>29,5</b>	<b>33,6</b>
NORD	LOROUM	59 719	146 323	206 042	16 396	21 816	38 213	27,5	14,9	18,5
NORD	PASSORÉ	43 747	443 488	487 235	22 370	79 793	102 162	51,1	18,0	21,0
NORD	YATENGA	140 876	745 618	886 494	46 545	139 103	185 648	33,0	18,7	20,9
NORD	ZONDOMA	44 936	214 798	259 734	23 722	40 342	64 064	52,8	18,8	24,7
<b>NORD</b>		<b>289 278</b>	<b>1 550 227</b>	<b>1 839 505</b>	<b>109 033</b>	<b>281 054</b>	<b>390 087</b>	<b>37,7</b>	<b>18,1</b>	<b>21,2</b>
PLATEAU-CENTRAL	GANZOURG OU	40 171	490 984	531 155	5 230	67 415	72 645	13,0	13,7	13,7
PLATEAU-CENTRAL	KOURWEOG O	27 795	165 271	193 066	7 705	36 229	43 934	27,7	21,9	22,8
PLATEAU-CENTRAL	OUBRITENG A	43 462	292 485	335 947	12 731	73 303	86 034	29,3	25,1	25,6
<b>PLATEAU-CENTRAL</b>		<b>111 428</b>	<b>948 740</b>	<b>1 060 168</b>	<b>25 667</b>	<b>176 946</b>	<b>202 613</b>	<b>23,0</b>	<b>18,7</b>	<b>19,1</b>
SAHEL	OULDALAN	9 965	145 894	155 859	1 196	25 792	26 987	12,0	17,7	17,3
SAHEL	SENO	55 833	386 431	442 264	22 570	58 681	81 250	40,4	15,2	18,4
SAHEL	SOUM	123 123	236 417	359 540	14 775	85 342	100 117	12,0	36,1	27,8
SAHEL	YAGHA	13 122	161 703	174 825	1 575	33 470	35 044	12,0	20,7	20,0
<b>SAHEL</b>		<b>202 043</b>	<b>930 445</b>	<b>1 132 488</b>	<b>40 115</b>	<b>203 283</b>	<b>243 399</b>	<b>19,9</b>	<b>21,8</b>	<b>21,5</b>
SUD-OUEST	BOUGOURIB A	27 908	141 196	169 104	12 096	43 021	55 117	43,3	30,5	32,6
SUD-OUEST	IOBA	28 652	258 121	286 773	6 748	40 625	47 373	23,6	15,7	16,5
SUD-OUEST	NOUMBIEL	20 561	86 732	107 293	3 704	31 086	34 790	18,0	35,8	32,4
SUD-OUEST	PONI	51 888	333 322	385 210	18 133	47 297	65 430	34,9	14,2	17,0
<b>SUD-OUEST</b>		<b>129 009</b>	<b>819 371</b>	<b>948 380</b>	<b>40 681</b>	<b>162 029</b>	<b>202 710</b>	<b>31,5</b>	<b>19,8</b>	<b>21,4</b>
<b>BURKINA FASO</b>		<b>6 647 221</b>	<b>15 736 946</b>	<b>22 384 167</b>	<b>2 715 133</b>	<b>3 447 268</b>	<b>6 162 402</b>	<b>40,8</b>	<b>21,9</b>	<b>27,5</b>



