

**MINISTRE DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT**

SECRETARIAT GENERAL


**DIRECTION REGIONALE DE
DU CENTRE**



BURKINA FASO

Unité- Progrès- Justice

**PROGRAMME NATIONAL D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET
EXCRETA**

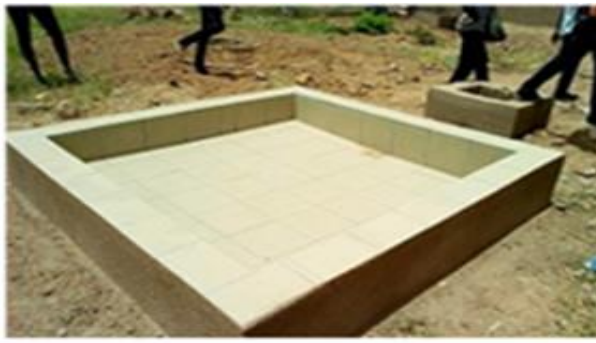

RAPPORT-BILAN REGIONAL ANNUEL DU CENTRE

PERIODE CONSIDEREE : 2018 – JANVIER A DECEMBRE

Janvier 2019

TABLE DES MATIERES

1	Le contexte _____	5
2	Présentation du programme _____	6
2.1	Objectif _____	6
2.2	POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION _____	7
	Source : Rapport bilan PN-AEUE CRP JUIN 2018, DREA-CEN _____	7
3	bilan physique _____	8
3.1.1	Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural _____	8
3.2	Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural _____	9
Produit 1:	La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages administratifs _____	9
Produit 2 :	Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement : _____	10
3.3	Action 3 : Réalisation de l'Accès Universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural _____	16
3.4	Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur _____	29
4	bilan financier _____	33
4.1	Action1 _____	33
4.2	Action3 _____	33
4.3	Action7 _____	36
5	Suivi des procédures de dévolution des marchés _____	38
6	Financement du programme _____	39
7	Principaux freins, actions correctives et recommandations _____	40
	Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020 ____	42

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : récapitulatif des résultats de la dernière session	7
Tableau 2 : Synthèse de l'exécution physique et financière régionale du programme	8
Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l'abandon de la DAL dans les communes de la région au cours de l'année	9
Tableau 4 : Sensibilisation de masse	10
Tableau 5 : Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint)	10
Tableau 6 : Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural	17
Tableau 7 : Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural	18
Tableau 8 : performance physique relative aux réalisations de latrines familiales, de puisards domestiques neufs en milieu rural	19
Tableau 9 : performance physique relative aux réhabilitations des latrines familiales	20
Tableau 10 : Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en milieu rural	21
Tableau 11 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural	22
Tableau 12 : Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de santé en milieu rural	23
Tableau 13 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural	24
Tableau 14 : Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics en milieu rural	25
Tableau 15 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural	25
Tableau 16 : Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural	26
Tableau 17 : Activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l'assainissement.	27
Tableau 18 : mobilisation de ressources financières	29
Tableau 19 : Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales au niveau régional/national sur l'AEUE en année N : au niveau régional, cela s'effectuera par commune bénéficiaire)	30
Tableau 20 : Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux	30
Tableau 21 : Études et partage d'expérience réalisés dans le cadre des voyages	31
Tableau 22 : taux d'exécution financière de l'action 1	33
Tableau 23 : taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA)	33
Tableau 24 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)	33
Tableau 25 : taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l'action 3	35
Tableau 26 : Taux d'exécution financière de l'action 7	36
Tableau 27 : taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l'action 7	37
Tableau 28 : Procédure de dévolution des marchés publics	38
Tableau 29 : financement du programme	39
Tableau 30 : difficultés et propositions de solutions	40
Tableau 31 : Plan d'opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE	42
Tableau 32 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO)	52

SIGLES ET ABBREVIATIONS

ABS	: Appui Budgétaire Sectoriel
ACF	: Association Chant de Femme
AEP	: Approvisionnement en eau potable
AEPA	: Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
AEPHA	: Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement
AEUE	: Assainissement des Eaux Usées et Excréta
AFDH	: Approche Fondée sur les Droits Humains
AMOC	: Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
ATPC	: Assainissement Total Piloté par les Communautés
AUE	: Association des Usagers de l'Eau
BD	: Base de Données
BPO	: Budget Programme par Objectif
CCEA	: Cadre de Concertation sur l'Eau et l'Assainissement
CEMEau	: Centre des Métiers de l'Eau
CNP	: Comité National de Pilotage
CRP	: Comité Régional de Pilotage
CSPS	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
CUCA	: Cadre Unifié de Coordination de l'Assainissement
CUI	: Cadre Unifié d'Intervention
DAL	: Défécation à l'Air Libre
DGA	: Direction Générale de l'Assainissement
DGESS	: Direction Générale des Études et Statistiques Sectoriels
DGEP	: Direction Générale de l'Eau Potable
DPEA	: Direction Provinciale de l'Eau et de L'Assainissement
DREA	: Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement
ENA	: Enquête Nationale sur l'Assainissement
FDAL	: Fin de Défécation à l'Air Libre
IEC	: Information-Éducation-Communication
IMS	: Intermédiation Sociale
INO	: Inventaire National des Ouvrages d'approvisionnement en eau potable en milieu rural
MOC	: Maitrise d'Ouvrage Communal
ODD	: Objectifs du Développement Durable
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONEA	: Office National de l'Eau et de l'Assainissement
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
PAAMU	: Promotion de l'Assainissement Autonome en milieu urbain
PCD-EPA	: Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement
PEA/GIZ	: Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande
PN-AEPA	: Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement
PN-AEUE	: Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta
PNDES	: Plan National de Développement Économique et Sociale
SAMOC	: Service Assistance à la Maitrise d'Ouvrage Communal
STBV	: Station de Traitement des Boues de Vidange
UNICEF	: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
VIP	: Ventilated Improved Pit (Latrine à fosses ventilées)

1 . LE CONTEXTE

La Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre (DREA-CEN) est responsable de la mise en œuvre du Programme National d'Assainissement des Eaux usées et Excréta (PN-AEUE) à l'horizon 2030, adopté par arrêté Ministériel du 02017/041/MEA/CAB dans son ressort territorial.

Le Programme est dirigé par un Comité d'orientation et supervisé par le Comité de Pilotage des Programmes de la Stratégie Nationale de l'Eau qui réunit les représentants de l'Etat et les autres parties prenantes (collectivités territoriales, société civile, partenaires techniques et financiers).

Par ce rapport, le responsable du Programme entend porter à la connaissance des instances de pilotage que sont : le comité d'orientation et le comité de pilotage, les informations relatives à l'avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le plan opérationnel en cohérence avec le PNDES.

Cette juxtaposition de données a pour objet d'apporter aux parties prenantes en toute transparence et selon des procédures qui garantissent la qualité, la sincérité, l'exhaustivité l'assurance que : i) le programme se déroule conformément à la prévision et/ou selon des processus maîtrisés et ii) que les acteurs de mise en œuvre (DGA, ONEA, DREA, Communes...) ont les capacités et l'organisation nécessaires pour assurer la régulation du service et l'accompagnement des communes dans le développement et la gestion du service.

Le présent rapport présente le bilan annuel de la mise en œuvre du PN-AEUE dans la région du Centre pour la période du 1er janvier au 31 Décembre 2018.

2 . PRESENTATION DU PROGRAMME

2.1 Objectif

L'objectif stratégique du PN-AEUE est d'assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta.

Les objectifs spécifiques du PN-AEUE sont les suivants :

- Éradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement ;
- Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement conformément à l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ;
- Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale ;
- Développer la recherche dans le domaine de l'assainissement des eaux usées et excréta en soutien à l'amélioration de l'offre technologique et des pratiques ;
- Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

2.2 POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION

Tableau 1: récapitulatif des résultats de la dernière session

Désignation	Programmation physiques révisées au 30 juin de l'année n	Réalisations physiques au 30 juin de l'année n	Programmation financières révisées au 30 juin de l'année n (en millions)	Montant engagé au 30 juin de l'année n(en millions)
Latrines familiales neuves	1734	294	249.39	49.448
Latrines familiales réhabilitées	0	0	0	0
Latrines écoles neuves	19	4	22.5	22.29
Latrines écoles réhabilitées	0	0	0	0
Latrines CSPS neuves	4	0	14.5	0
Latrines CSPS réhabilitées	0	0	0	0
Latrines publiques neuves	12	4	8.98	0
Latrines publiques réhabilitées	0	0	0	0
Puisards domestiques neufs	0	0	0	0
Taux d'accès à l'assainissement de l'année n-1	33.20%			

Source : Rapport bilan PN-AEUE, CRP JUIN 2018, DREA-CEN

Commentaire : L'analyse du tableau fait ressortir un faible niveau d'exécution des travaux à la date du 30 juin 2018. En effet sur une programmation révisée de 1734 latrines familiales, 294 réalisations physiques ont été enregistrées soit un taux d'exécution de 16.95%. En ce qui concerne les latrines institutionnelles et publiques on note 8 ouvrages réalisés pour une programmation de 35 ouvrages soit un taux de 22.85%. Ces faibles taux peuvent s'expliquer de façon générale par le temps mis pour les procédures de passation de marchés des partenaires. Il faut noter aussi que les programmations physiques de la direction régionale en ce qui concerne les latrines familiales et dans les CSPS ont été révisées compte tenu de la régulation budgétaire.

3 BILAN PHYSIQUE

Tableau 2: Synthèse de l'exécution physique et financière régionale du programme

Actions mise en œuvre en région	Taux d'exécution physique	Montant prévu	Montant réalisé	Taux d'exécution financier
Action 1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	-	-	-	-
Action 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-
Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	50.65%	295.37	176.9047	59.89%
Action 4 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	-	-	-	-
Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	-	-	-	-
Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine l'assainissement des eaux usées et excréta	-	-	-	-
Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	-	-	-	-
Programme	50.65%	295.57	176.9047	59.89%

Source : Fiche de collecte de données, Rapport bilan semestriel juin 2018

Commentaire : Au cours de l'année 2018, seul les activités concernant l'action 3 ont été programmées dans le milieu rural de la région du centre. Pour ce qui est de ces activités, la région a connu un taux d'exécution physique de 50.65%. Le montant prévu pour ces activités s'élevait à 295.57 millions de FCFA pour un montant réalisé à la date du 31 décembre de 176,904 millions soit un taux d'exécution financière de 59.89%. Le montant des investissements effectifs en prenant en compte les réalisations hors programmation s'élève à 226.386 millions de FCFA. Il a été également enregistré des activités en hors programmation en lien avec les actions 1 et 7. Ce sont notamment les activités de sensibilisation de proximité pour un montant réalisé de 8,037 millions et la tenue d'un voyage d'étude réalisé par la direction régionale pour un montant de 0.169 million de FCA. Mais dans le calcul du taux de réalisation physique et financière, ces activités n'ont pas été prises en compte tenu de leur caractère « hors programmation ».

3.1 ACTION 1 : ERADICATION DE LA DEFECATION A L'AIR LIBRE ET PROMOTION DES PRATIQUES ADEQUATES D'HYGIENE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL

Produit 1 : La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages administratifs

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l'abandon de la DAL dans les communes de la région au cours de l'année

Structures	Bailleurs	Nbre de village total	Nbre de villages déclenchés	Nbre de villages déclarés FDAL	Nbre de village certifiés FDAL
NEANT	NEANT	-	-	-	-
Total région		-	-	-	-

Source : rapport bilan à mi-parcours régional ; Atelier de Collecte 2018

Commentaire : Au cours de l'année 2018, la région n'a mené aucune activité de déclenchement, de déclaration ou de certification de villages. Cependant il faut noter que depuis 2009, ce sont au total 31 villages qui ont été déclenchés dans la région du centre sur les 201 villages hors champ ONEA. À ce jour aucun village n'a été déclaré ou certifié FDAL. Les différents acteurs de mise en œuvre ont été interpellés au niveau régional afin que des efforts soient consentis pour l'accompagnement des villages déclenchés à atteindre le statut FDAL. En outre une rencontre avec ces acteurs a été tenue le 16 Novembre au sein de la Direction à cet effet.

Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement :

Tableau 4 : Sensibilisation de masse

Structures	Bailleurs	nombre d'émissions	Thèmes abordés	Coût global des émissions de la région
NEANT	-NEANT	0	0	0
Total région		0	0	0

Source : rapport bilan à mi-parcours régional ; Atelier de Collecte 2018

Commentaire : Aucune activité de sensibilisation de masse n'a été réalisée dans la région du Centre au cours de l'année 2018.

Tableau 5 : Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d'un groupe restreint)

Structures	Bailleurs	nombre de personnes touchées dans les	nombre de femmes touchées dans	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (b)	Nombre d'élèves filles touchées (b1)	Nombre de centres de santé	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre de lieux publics (marché,	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)+(d)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)+(d1)	thèmes
------------	-----------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	--	---	--------

Structures	Bailleurs	nombre de personnes touchées dans les	nombre de femmes touchées dans	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (b)	Nombre d'élèves filles touchées (b1)	Nombre de centres de santé	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre de lieux publics (marché,	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)+(d)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)+(d1)	thèmes
ASMA DE	AADC	ND	ND	2	ND	ND	0	0	0	1	10	0	10	0	IEC dans le cadre des latrines familiales IEC dans les écoles Formation de 10 hygiénistes dans cinq villages

Structures	Baillleurs	nombre de personnes touchées dans les	nombre de femmes touchées dans	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (b)	Nombre d'élèves filles touchées (b1)	Nombre de centres de santé	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre de lieux publics (marché,	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)+(d)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)+(d1)	thèmes
OCAD ES	Secours Catholique	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	Formation et équipement des relais villageois : Hygiène et assainissement
KOMK I IPALA	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200	60	200	60	Formation à l'utilisation des latrines Ecosan et des produits dévirés

Structures	Baillleurs	nombre de personnes touchées dans les	nombre de femmes touchées dans	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (b)	Nombre d'élèves filles touchées (b1)	Nombre de centres de santé	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre de lieux publics (marché,	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)+(d)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)+(d1)	thèmes
															de l'assainissement dans le domaine de l'agriculture
KOMS ILGA	-	ND	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ND	ND	IEC latrines fonds transférés
PABRE	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16000	8700	16000	8700	Campagne de sensibilisation sur l'eau, l'hygiène et

Structures	Bailleurs	nombre de personnes touchées dans les	nombre de femmes touchées dans	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (b)	Nombre d'élèves filles touchées (b1)	Nombre de centres de santé	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre de lieux publics (marché,	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)+(d)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)+(d1)	thèmes
															l'assainissement
TANGHINDASSOURI	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	ND	ND	ND	ND	Session de formation sur l'entretien des latrines ECOSAN et l'utilisation des fertilisants
DREA-CEN	Etat	0	0	2	637	374	0	0	0	0	0	0	637	374	IEC dans le cadre de la réalisation de latrine dans les

Structures	Bailleurs	nombre de personnes touchées dans les	nombre de femmes touchées dans	Nombre d'écoles touchées	Nombre d'élèves touchés (b)	Nombre d'élèves filles touchés (b1)	Nombre de centres de santé	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre de lieux publics (marché,	Nombre de personnes touchées dans les	Nombre de femmes touchées dans	Nombre total de personnes touchées (a)+(b)+(c)+(d)	Nombre total de femmes touchées (a1)+(b1)+(c1)+(d1)	thèmes
															écoles.
Total régional		4	2	4	637	374	0	0	0	4	16210	8760	16851	9136	➤

Source : rapport bilan à mi-parcours régional ; Atelier de Collecte 2018

Commentaire : Sept (07) acteurs au total ont mené des activités de sensibilisation de proximité au cours de l'année 2018 dans la région du Centre. Ce sont principalement les ONG OCADES et ASMADE, les communes de Komki-Ipala, Komsilga, Pabré et Tanghin-Dassouri et la DREA-Cen. Les thématiques abordées sont entre autre l'intermédiation sociale dans le cadre de la réalisation des latrines familiales et institutionnelles, la formation d'hygiénistes, de relais communautaires et de sensibilisation sur l'entretien des latrines Ecosan ainsi que l'utilisation des fertilisants dans l'agriculture. Ces activités ont permis de sensibiliser 16 851 personnes dont 9 136 femmes. La principale difficulté rencontrée est la non disponibilité de données concernant le nombre de personnes ou de femmes touchés lors de certaines activités menées par les partenaires.

3.2 ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL

Produit 1 : Développement de l'assainissement familial en milieu rural (conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur)

Les principales activités menées dans le cadre de l'intermédiation sociale dans la région du Centre sont entre autre :

- IEC dans le cadre de la réalisation de latrines dans les Écoles par la DREA-Cen et l'ONG ASMADE ;
- IEC dans la cadre de la réalisation de latrines familiale par l'ONG ASMADE et la commune de Komsilga ;
- La formation de 10 hygiénistes dans 5 villages de la région par l'ONG ASMADE ;
- Campagne de sensibilisation sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement par la commune de Pabré ;
- Formation de 4 relais villageois : hygiène et assainissement par l'ONG OCADES.

Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques :

Tableau 6: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural

Structures	Bailleurs	Traditionnelles sans dalle en béton (a)	Traditionnelles avec dalle en béton (b)	Sanplat / VIP une fosse (c)	VIP double fosse (d)	Ecosan (e)	Toilette à chasse d'eau manuelle (f)	Toilette à chasse d'eau mécanique (g)	Puisard	Fosse septique	Total (a+b+c+d+e+f+g)
KOMSILGA	Fonds transférés du MEA	0	0	525	0	0	0	0	0	0	525
KOMKI IPALA	Fonds transférés du MEA	0	0	548	0	0	0	0	0	0	548
KOMKI IPALA	Jumelage	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
OCADES	-	0	0	0	28	0	0	0	0	0	28
TANGHIN DASSOURI	Jumelage BELFORT	0	0	0	0	41	0	0	0	0	41
ASMADE	-	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
Total Région		0	0	1073	88	141	0	0	0	0	1302

Source : Fiches de Collecte BPO décembre 2018

Commentaire : A la date du 31 Décembre 2018, il a été comptabilisé pour le compte de la région du Centre 1302 latrines familiales dont 1073 latrines sanplat/VIP une fosse, 88 latrines VIP double fosse et 141 latrines Ecosan. Ces réalisations sont à l'actif de l'OCADES (28 Latrines VIP double fosse), de l'ASMADE (60 latrine VIP double fosse), des Communes (1073 latrines VIP une fosse et 141 latrines ECOSAN). La programmation de la DREA-CEN a été révisée compte tenu de la régulation budgétaire 2018.

Tableau 7: Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

Structures	Bailleurs								Total
		Traditionnelles sans dalle en béton (a)	Traditionnelles avec dalle en béton (b)	Sanplat / VIP une fosse (c)	VIP double fosse (d)	Ecosan (e)	Toilette à chasse d'eau manuelle (f)	Toilette à chasse d'eau mécanique (g)	
NEANT	NEANT	-	-	-	-	-	-	-	-
Total régional		-	-	-	-	-	-	-	-

Source : Fiches de Collecte BPO décembre 2018*

Commentaire : Aucune réhabilitation de latrine familial n'a été enregistrée dans la région du Centre au cours de l'année 2018.

Tableau 8: performance physique relative aux réalisations de latrines familiales, de puisards domestiques neufs en milieu rural

Structures	Bailleurs	Latrines Familiales					Puisards domestiques				
		Programmation révisée (a)	Réalizations				Program -mation révisée (a)	Réalizations			
			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %		Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux de réalisation (100*b/a) en %
KOMSILGA	FONDS TRANSFERES	675	525	0	525	77.77	0	0	0	0	0
KOMKI IPALA	FONDS TRANSFERES	675	548	0	548	81.18	0	0	0	0	0
KOMKI IPALA	JUMELAGE BELFORT	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0
TANGHIN DASSOUR I	JUMELAGE BELFORT	120	41	0	41	34.16	0	0	0	0	0
ASMADE	AADC	58	58	2	60	100	0	0	0	0	0
AMUS	WATER AID	60	ND	ND	ND	-	0	0	0	0	0
OCADES		46	28	0	28	60.86	0	0	0	0	0
Total régional		1734	1300	2	1302	74.97	0	0	0	0	0

Source : rapports bilan à mi-parcours régional, fiches de collecte BPO 2018

Commentaire : A la date du 31 décembre 2018, sur une programmation révisée de 1 734 latrines familiales, nous avons capitalisé la réalisation de 1300 latrines soit un taux de réalisation de 74.97%. Les programmations des communes pour ce qui concerne les fonds transférés ont connu un taux de réalisation de 79.48% soit 1 073 ouvrages sur une programmation de 1350.

Les communes de Tanghin Dassouri et de Komki Ipala ont par ailleurs bénéficié de latrines Ecosan par Jumelage BELFORT, sur les 220 latrines programmées, 141 ont faits l'objet de réalisation au 31 décembre 2018. Il faut également noter la réalisation de deux latrines en hors programmation par l'ONG ASMADE ce qui donne une réalisation totale de 60 latrines sur 58 programmées. L'acteur OCADES a quant à lui, réalise 28 latrines sur les 46 programmées. Cependant, nous n'avons pas pu capitaliser les réalisations de l'ONG AMUS par absence de données.

L'analyse de la performance quant à la programmation des latrines familiales de la région du centre montre qu'en termes de programmation physique, on enregistre une hausse de 504 latrines familiales pour l'année 2018 comparé à celle de 2017 dont la programmation était de 1230 latrines contre 1734 en 2018. En termes de réalisation physique, l'année 2018 enregistre également une hausse en matière de réalisation de latrine familiale. Mais nous notons une baisse considérable de réalisation des latrines familiales en hors programmation qui passe de 180 en 2017 contre 02 en 2018. Cela traduit une bonne maîtrise par rapport à la programmation.

Concernant les puisards domestiques, aucune programmation n'a été faite au cours de l'année 2018. La cible annuelle pour l'atteinte des objectifs était de 1 687 puisards. Des efforts sont à faire en ce qui concerne ces ouvrages pour les programmations des années à venir afin de combler le GAP. En 2017 il avait été réalisé par la Direction régionale 50 puisards. Contre 0 réalisation en 2018.

Tableau 9: performance physique relative aux réhabilitations des latrines familiales

Structures	Bailleurs	Programmation révisée(a)	Réhabilitations			Taux (100*b/a) en %
			Issue de la programmation (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
-	-	-	-	-	-	-
	Total régional	-	-	-	-	-

Source : rapports bilan à mi-parcours régional, Fiches de collecte BPO 2018

Commentaire : Pour ce qui est des réhabilitations de latrines familiales, aucune programmation n'avait été faite en 2018 et ainsi qu'en 2017. A la date du 31 Décembre, aucune réalisation n'a été enregistrée dans la Région du Centre.

Produit 2 : Développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural
Activité1 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics

Tableau 10: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en milieu rural

Structures	Bailleurs	Total réalisations	Total réalisations réservées aux filles	Total réhabilitations	Total réhabilitations réservées aux filles
DREA-CEN	ETAT	4	2	-	-
ASMADE	AADC	2	0	-	-
KOMSILGA	Fonds Propre	3	0	-	-
SAABA	Fonds propre	8	0	-	-
PABRE	Fonds propre	2	0	-	-
TANGHIN-DASSOURI	Fonds propre	2	0	-	-
TOTAL REGIONAL		21	2	-	-

Source : rapports bilan à mi-parcours régional, Fiches de collecte BPO 2018

Commentaire : En ce qui concerne les réalisations et réhabilitation de latrines dans les écoles, la Région a enregistré 21 nouvelles réalisations. Ces réalisations sont à mettre à l'actif de la DREA-Cen, de l'ONG ASMADE ainsi que des communes de SAABA, PABRE, TANGHIN DASSOURI et de KOMSILGA. En 2017, 9 nouvelles réalisations avaient été enregistrées dans la région.

Tableau 11: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural

Structures	Bailleurs	Programmation révisée		Réalizations						Programmation révisée		Réhabilitations					
		Globale (a)	Réservée aux filles(b)	Globale (c) issue de la	Réalisées issues de la programmation	Hors programmation	total f= c+e	Taux global programmé (c/a*100)	Taux réservé aux filles	Globale (a)	Réservée aux filles(b)	Globale (c) issue de la	Réalisées issues de la programmation	Hors programmation	total f= c+e	Taux global programmé (c/a*100)	Taux réservé aux filles
DREA-CEN	ETAT	4	2	4	2	0	4	100	50	0	0	0	0	0	0	-	-
ASMADE	-	4	0	2	0	0	2	50	0	0	0	0	0	0	0	-	-
KOMSILG A	Fonds Propre	-	0	0	0	3	3	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
SAABA	Fonds propre	-	0	0	0	8	8	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
PABRE	Fonds propre	2	0	2	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0	-	-
TANGHIN -	Fonds propre	9	0	2	0	0	2	22.22	0	0	0	0	0	0	0	-	-

DASSOURI																	
REGIONAL	19	2	10	2	11	21	52.63	100	0	0	0	0	0	0	0	-	-

Source : rapport bilan à mi-parcours régional, Fiches de collecte 2018

Commentaire : au titre de l'année 2018, 21 nouvelles réalisations de latrines dans les écoles ont été enregistrées pour la région du Centre. Sur ces 21 réalisations, 10 sont issues de la programmation révisée et 11 ont été réalisées en hors programmation. Le taux de réalisation est estimé à 52.63%. Les ouvrages hors programmation sont à mettre à l'actif des communes de KOMSILGA (3 Blocs de latrines) et de SAABA (8 blocs de latrines). En ce qui concerne les ouvrages programmés, la DREA-Cen et la commune de Pabre ont chacun un taux de réalisation de 100%. L'acteur ASMADE quant à lui a pu réaliser deux ouvrages sur les 4 programmés. La commune de TANGHIN DASSOURI enregistre le plus faible taux avec 2 réalisations sur 9 programmés soit un taux de 22.22%. Comparativement à 2017 on note une progression considérable des réalisations dans les écoles passant de 9 à 21 ouvrages. Cependant on note une faible réalisation des acteurs issus de la programmation. De plus il faut noter une faible prise en compte de la question du genre par les acteurs. En effet seule la DREA-Cen a dans ses réalisations prévue deux blocs de latrines réservés aux filles et des cabines pour les personnes à mobilité réduite.

Tableau 12: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de santé en milieu rural

Structures	Bailleurs	Total réalisations	Total réhabilitations
PABRE	Fonds propre	3	0
SAABA	Fonds propre	2	0
TANGHIN-DASSOURI	Fonds propre	1	0
TOTAL REGIONAL		6	0

Source : rapports bilan à mi-parcours régional, Fiches de collecte

Commentaire : Les centres de santé de la région ont bénéficié de 6 nouvelles réalisations de latrines sur fond propre par les communes de Pabre, Saaba et de Tanghin Dassouri. En 2017, la région avait bénéficié de 4 blocs de latrines. La programmation de la DREA-CEN a été révisée compte tenue de la régulation budgétaire 2018.

Tableau 13: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural

Structures	Bailleurs	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
			Issue de la programmation	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a)		Issue de la programmation	Hors programmation (c)	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a)
PABRE	Fonds propre	-	-	3	3	-	0	0	0	0	-
SAABA	Fonds propre	-	-	2	2	-	0	0	0	0	-
TANGHIN-DASSOURI	Fonds propre	4	1	0	1	25	0	0	0	0	-
Total régional		4	1	5	6	25	0	0	0	0	-

Source : rapports bilan à mi-parcours régional, Fiches de collecte

Commentaire : En ce qui concerne les nouvelles réalisations de latrines dans les Centres de Santé, 6 ouvrages ont pu être enregistrés sur une programmation de 4 latrines. Cependant sur ces 6 ouvrages seule une latrine est issue de la programmation soit un taux de réalisation de 25%. Ce faible taux peut s'expliquer par le fait que la plupart des ouvrages (5) ont été réalisés en hors programmation par les communes de Pabré (3 blocs) et de Saaba (2 blocs) sur fond propre. La commune de Tanghin Dassouri a quant à elle réalisé 1 seul bloc sur 4 programmés. Comparativement à 2017 on note une progression des réalisations passant de 4 à 6 nouvelles réalisations.

Tableau 14: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics en milieu rural

Structures	Bailleurs	Total réalisations	Total réhabilitations
ASMADE	AADC	4	0
KOMKI-IPALA	Fonds propres	5	0
KOUBRI	Fonds propres	0	0
SAABA	Fonds propres	2	2
TANGHIN-DASSOURI	Fonds propres	0	2
	Régional	11	4

Source : rapports bilan à mi-parcours régional, Fiches de collecte

Commentaire : Le bilan des réalisations et réhabilitations des latrines dans les lieux publics fait état de 11 ouvrages réalisés et de 4 réhabilitations. Ces réalisations sont à l'actif de l'ONG ASMADE (4 blocs), la commune de Komki-Ipala (5 blocs) et Saaba (2 blocs) pour les nouveaux ouvrages et des communes de Saaba (2 blocs) et Tanghin Dassouri (2 blocs) pour les réhabilitations. La DREA-CEN n'avait pas fait de programmation de latrine dans les lieux publics.

Tableau 15 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural

Structures	Bailleurs	Programmation révisée (a)	Réalizations				Programmation révisée (a)	Réhabilitations			
			Issue de la programmation	Hors programmation	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a)		Issue de la programmation	Hors programmation	Total (d=b+c)	Taux de réalisation (100*d/a)
ASMADE	AADC	4	4	0	4	100	0	0	0	0	-
KOMKI-IPALA	Fonds propres	0	0	5	5	-	0	0	0	0	-
KOUBRI	Fonds propres	4	0	0	0	0	0	0	0	0	-
SAABA	Fonds propres	2	2	0	2	100	0	0	2	2	-

TANGHIN-DASSOURI	Fonds propres	2	0	0	0	0	0	0	2	2	-
TOTAL REGIONAL		12	6	5	11	50	0	0	4	4	-

Source : rapports bilan à mi-parcours régional, Fiches de collecte 2018

Commentaire : En ce qui concerne les nouvelles réalisations dans les lieux publics dans la région du Centre, 11 nouvelles réalisations ont été enregistrées sur une programmation de 12 ouvrages. Sur ces 11 nouvelles réalisations, 6 sont issus de la programmation et 5 en hors programmation. La performance de la réalisation a été estimée à 50%. Les ouvrages réalisés issus de la programmation sont à mettre à l'actif des acteurs ASMADE (4 blocs) et la commune de Saaba (2 blocs). Quant aux ouvrages hors programmation, ils ont été réalisés par la commune de Komki-Ipala (5 blocs). Les communes de Koubri et de Tanghin Dassouri comptabilisent à elle deux 0 réalisations physiques sur une programmation de 6 ouvrages. En 2017 la région avait aussi bénéficié de 11 nouvelles réalisations dans les lieux publics avec une performance de 90%.

Tableau 16 : Taux d'équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural

Structures	Bailleurs	Ecoles				Centre de santé			
		Nombre d'écoles (a)	Nombre d'écoles équipées de latrines (b)	Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (c)	Taux (%) (c/a)	Nombre de CSPS (a)	Nombre de CSPS équipés de latrines (b)	Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (c/a)	Taux (%) (c/a)
Région du Centre		216	189	ND	ND	56	56	ND	ND
Total régional		216	189	ND	ND	56	56	ND	ND

Source : DRS, DRENA 2016

Commentaire : De l'analyse du tableau, il ressort que pour ce qui est des écoles, sur les 216 que compte la région, 189 sont dotées de latrines soit un taux d'équipement de 87.5%. Ce taux était de 78.70% en 2017. Pour les centres de santé sur l'ensemble des 56 que compte la région, tous les 56 sont dotés de bloc de latrines soit un taux d'équipement de 100%.

Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d'assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

a) Finalisation et mise en œuvre des outils existants en l'adaptant aux principes d'accès durable à l'assainissement, d'équité avec un rôle plus affirmé et plus systématique de recours au secteur privé :

La Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre, au cours de l'année 2018 a :

- Participer à l'atelier de validation de la procédure harmonisée de mise en œuvre de l'assainissement des eaux usées excréta
- Participer à la validation du projet de la stratégie Nationale de Gestion de la Filière de l'Assainissement des Eau Usées et Excréta
- Participer à la validation de la stratégie pour mettre fin à la défécation à l'air libre dans le milieu rural (FDAL)

Elle a en outre pris part au processus de relecture des prescriptions techniques relatives aux ouvrages d'assainissement des eaux usées et excréta toujours en cours.

b) Formations des acteurs au niveau communal (formation à l'endroit des acteurs de mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures : maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES...

Tableau 17: Activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l'assainissement.

Communes	Types de latrines (institutionnelles, publiques)	Nombre de latrines prévues pour être gérées par un gestionnaire	Mode de gestion	Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements...)	Public cible	Nombre de participants			Coût	observation
						Nombre d'hommes	Nombre de femmes	Nombre total		
KOUBRI	Institutionnelle	2	Club santé de l'école bénéficiaire	-Etat des lieux -Sensibilisation à travers l'approche	- Elèves - Enseignants	147	150	297	2,496 5	Ecole primaire de Kuiti

				SARAR – PHAST -Mise en place et formation des Clubs de Santé Scolaires	- APE-AME					
SAABA	Institutionnelle	2	Club santé de l'école bénéficiaire	-Etat des lieux -Sensibilisation à travers l'approche SARAR – PHAST -Mise en place et formation des Clubs de Santé Scolaires	- Elèves - Enseignant s - APE-AME	172	236	408	2.496 5	Ecole primaire de Wapassi
Komsilga	Institutionnelle	2	beneficiaire	IEC dans le cadre de la réalisation des latrines	-Elèves - Enseignant s - APE-AME	-	-	-	0.565	Bangma, Rawilgue
Total Région	-	6	-	-	-	319	386	705	5,558	-

Source : rapport bilan à mi-parcours régional, fiches de collecte BPO 2018

Commentaire : Trois communes (Saaba , Koubri et Komsilga) ont bénéficié d'activités dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l'assainissement.. Ces activités ont concerné 4 écoles pour la mise en place des Club santé pour la gestion des ouvrages. Ainsi au total 705 élèves ont été touchés dont 386 filles pour un cout total de 5.558.000 FCFA.

3.3 ACTION 7 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE FINANCEMENT, DE GESTION ET DE PILOTAGE DU SOUS-SECTEUR

Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

Tableau 18: mobilisation de ressources financières

provinces	communes	Montant total mobilisé	sanithon	Mécanismes endogènes de financement		Stratégie de mobilisation de ressources extérieures				Autres stratégies (à préciser)
				Fonds propres	ménages	ressortissants extérieurs	Coopération décentralisée (jumelage)	PTF	tables-rondes	
Kadiogo	Tanghin Dassouri	8.815	-	ND	-	-	8.815	-	-	-
Kadiogo	Komki Ipala	23.01	-	1.51	-	-	21.5	-	-	-
Kadiogo	Komsilga	8.448678	-	6,148.678	2,3	-	-	-	-	-
Kadiogo	Pabré	9.5	-	9.5	-	-	-	-	-	-
Kadiogo	Saaba	35.409	-	35,409	-	-	-	-	-	-
total régional		85.182678	-	52.567678	2.3	-	30.315	-	-	-

Source : rapport bilan à mi-parcours régional, atelier de collecte 2018

Commentaire : Sur les 6 communes que compte la région du Centre, 5 ont réalisé des ouvrages d'assainissement dans les écoles, CSPS, lieux publics et ménages. Trois mécanismes de mobilisation de fond dans le domaine de l'AEUE ont été identifiés dans la région. Ce sont :

- Les fonds propres des communes : les communes de Tanghin Dassouri, Komki-Ipala, Komsilga, pabré et Saaba ont enregistré des réalisations sur fonds propre pour un montant de 52.567.678 FCFA.
- Financement endogène : une école de la commune de Komsilga a bénéficié d'un bloc de latrine réalisé par les populations elle-même d'un montant de 2.3 millions.
- La coopération décentralisée : les communes de tanghin-Dassouri et de Komki-Ipala ont chacune bénéficié de la réalisation de latrines familiales issues du JUMELAGE BELFORT dont le cout total est estimé à **30.315. 000.FCFA**.

Le montant global mobilisé par les communes est estimé à 85. 182.278 FCFA

Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance

Tableau 19: Situation de l'exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales au niveau régional/national sur l'AEUE en année N : au niveau régional, cela s'effectuera par commune bénéficiaire)

provinces	Nombre communes	Nombre communes bénéficiaires	Nouvelles réalisations de latrines						Réhabilitations de latrines					
			Nombre			Montants			Nombre			Montants		
			Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu	Réalisé	Taux %	Prévu	Réalisé	Taux %
Kadiogo	6	2	1350	1073	79.48	150	104.3197	69.546	0	0	0	0	0	0
total région	6	2	1350	1073	79.48	150	104.3197	69.546	0	0	0	0	0	0

Source : Atelier de Collecte 2018

Commentaire : Deux communes de la région ont bénéficié de fonds transférés pour la réalisation de latrines semi fini, ce sont les communes de Komki-Ipala et de Komsilga. Ils ont chacune bénéficié de 75 millions pour la réalisation de 675 latrines. A la date du 31 Décembre 2018, le taux d'exécution financière a été estimé à 69.546%.

Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

Tableau 20: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux

Province	commune	Formations réalisées (sujet)	Public cible	Nombre de participants			Coût	Acteurs/ commanditaires
				Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total		
Kadiogo	Komki Ipapa	Néant	-	-	-	-	-	
Kadiogo	Komsilga	Néant	-	-	-	-	-	
Kadiogo	Koubri	Néant	-	-	-	-	-	
Kadiogo	Pabre	Néant	-	-	-	-	-	
Kadiogo	Saaba	Néant	-	-	-	-	-	

Kadiogo	Tanghin Dassouri	Néant	-	-	-	-	-	-
Total Région		Néant	-	-	-	-	-	-

Source : rapport bilan à mi-parcours régional, Fiches de collectes 2018

Commentaire : Aucune formation n'a été réalisée dans la région dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux.

Études réalisées dans le cadre de l'exécution des activités terrain

Provinces	communes	Intitulé de l'étude réalisée	Acteurs/commanditaires	Coût (en millions)
Kadiogo	Néant	Néant	Néant	Néant
Total Région		Néant	Néant	Néant

Source : rapport bilan à mi-parcours régional, Fiches de collectes 2018

Commentaire : Aucune étude dans le cadre de l'exécution des activités terrain n'a été réalisée dans la région du Centre au cours de l'année 2018.

Tableau 21: Études et partage d'expérience réalisés dans le cadre des voyages

Provinces	communes	Voyage d'étude et partage d'expérience	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Acteurs/commanditaires	Coût (en millions)
				Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total		
Kadiogo	Ouagadougou	Voyage d'étude et partage d'expérience sur la réalisation des latrines ECOSAN dans	Agents de la DREA-Cen	2	1	3	DREA-CEN	0.169

		la commune de Ziniare /Plateau Central						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Source : Rapport bilan DREA-Cen 2018

Commentaire : Le service assainissement a bénéficié d'un voyage d'étude dans la région du Plateau Central en vue d'un partage d'expérience sur la réalisation et la gestion des latrines type ECOSAN. Ce voyage a concerné deux agents du service assainissement et un agent du service AEP pour un cout total de 0.169 million.

Cadre de concertation ou de revu (réservée à la commune)

Provinces	communes	Type de cadre	Public cible ou bénéficiaires	Nombre de participants			Coût (en millions)
				Nombre d'homme	Nombre de femmes	Nombre total	
Kadiogo	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant	Néant

Source : Atelier collecte de donnée 2018

Commentaire : Aucun cadre de concertation n'a été réalisé dans la région du Centre par les communes au cours de l'année 2018.

4 BILAN FINANCIER

4.1 ACTION 1

a) Exécution globale

Tableau 22: taux d'exécution financière de l'action 1

Intitulé de l'activité	Programmation révisée (a)	Montant engagé			Taux (100*d/a) en
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	
Sensibilisation de proximité	-	--	8,037572	8.037572	-

Commentaire : Aucune programmation financière n'avait été faite concernant des activités liées à l'action 1 en 2018. Néanmoins il faut noter que des activités de sensibilisation de proximité ont été faite en hors programmation pour un coût de 8.037572 millions.

b) Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

Tableau 23: taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA)

Source de financement	Budget (a)	Paiement (b)	Taux d'exécution base paiement (100*b/a) en %
ONG	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Commentaire : Aucun budget n'avait été alloué pour cette action dans la loi de finance 2018 au niveau de la direction régionale du centre.

4.2 ACTION 3

a) Détails de l'exécution globale

Tableau 24 : Situation de l'exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

In titulé de l'activité	Program mation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Tot al (b +c)	Taux (100* b/a) en %
Réalisation de latrines familiale	249.39	150.6147	0.98	151.5 947	60.78	-	-	-	-

s									
Réhabilitation de latrines familiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réalisation de puisards domestiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réalisations de latrines dans les écoles	22.5	20.8	38.521678	59.321678	92.44	16 785	0	16 785	74.48 %
Réalisations de latrines dans les centres de santé	14.5	0	9.48	9.48	0	-	-	-	-
Réalisations de latrines dans les lieux publics	8.98	5.49	0	5.49	61.13	-	-	-	-
Réhabilitation de latrine dans les lieux publique	0	0	2	2	-				

Source : Fiches de collecte 2018

Commentaire :

➤ **Latrine familiale**

Sur une prévision financière révisée de 249.39 millions de FCFA pour la réalisation des latrines familiales, 150.6147 millions de FCFA ont été engagée à la date du 31 décembre soit un taux d'exécution de 60.78%. Les programmations de la Direction Régionale ont connu un taux de réalisation de 0% dû à la régulation budgétaire opérée sur ces lignes. En outre les communes de Komki-Ipala et de Komsilga bénéficiaires des fonds transférés des communes ont connu un taux de réalisation de 69.546%. Cependant les données financières de l'ONG ASMADE n'ont pas pu être prises en compte pour cause d'indisponibilité. Comparativement

à l'année 2017 les programmations financières en ce qui concerne les latrines familiales ont connu une hausse considérable passant de 189.10 millions à 249.39 millions.

➤ **Latrines dans les écoles**

En ce qui concerne les latrines dans écoles, la programmation financière révisée s'élevait à 22.5 millions de e FCFA Les montants engagés à la date du 31 Décembre s'élève à 59.321678 millions de F CFA dont 38.521678 en hors programmation soit un taux d'exécution financière de 92.44%. La prévision initiale de 14.5 millions de la Direction Régionale a connu une hausse de 2.2 millions passant ainsi à 16.7 millions de F CFA. L'ONG ASMADE quant à elle a engagé la somme de 5.8 millions de FCFA sur une prévision de 8 millions. Le bilan financier de la commune de Tanghin Dassouri n'est pas disponible. Comparativement à 2017, on constate une augmentation considérable des investissements dans les écoles passant de 22.36 millions de FCFA en 2017 à 59.321678 millions de F CFA en 2018.

➤ **Latrines dans les centres de santé**

Les programmations financières dans les CSPS quant à elles ont connu un taux d'exécution de 0%. En effet, la seule programmation connue est celle de la Direction Régionale ayant fait l'objet de régulation budgétaire. Néanmoins les communes de Pabré et de Saaba ont réalisé en hors programmation des blocs de latrines pour un montant de 9.48 millions de FCFA. En 2017 la programmation était estimée à 19.67 millions et le taux d'exécution financière à 79.10%

➤ **Latrines dans les lieux publics**

Pour ce qui est des investissements au niveau des lieux publics, la programmation était de 8.98 millions de FCFA et le montant engagé à la date du 31 décembre est estimé à 5.49 millions. Il faut noter par ailleurs que la commune de Saaba a réalisé deux blocs en hors programmation pour un montant de 5.568 millions.

De plus la région a bénéficié de la réhabilitation de 2 blocs de latrines publiques dans la commune de Saaba pour un montant de 2. Millions FCFA et de deux blocs à Tanghin Dassouri dont le cout est indisponible. Les programmations en termes de latrines publics ont connu une baisse passant de 27.77 millions en 2017 à 8.89 millions en 2018.

b) Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

Tableau 25: taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l'action 3

Source de financement	Budget (a)	Paiement (b)	Taux d'exécution base paiement (100*b/a) en %
ABS	79.620	26.202	32,90
TOTAL	79.620	26.202	32.90

Commentaire : la programmation financière suivant la loi de finances est de 79.620 FCFA, le paiement est estimé à 26.202 FCFA soit un taux d'exécution de 32.90%.

4.3 ACTION 7

a) Exécution globale

Tableau 26: Taux d'exécution financière de l'action 7

Intitulé de l'activité	Programmation révisée (a)	Montant engagé				Montant liquidé			
		Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %	Issues de la programmation révisée (b)	Hors programmation (c)	Total (b+c)	Taux (100* b/a) en %
Voyage d'étude et partage d'expérience sur la réalisation des latrines ECOSAN dans la commune de Ziniare /Plateau Central Agents de la DREA-Cen	0	0	0.169	0.169	-	-	-	-	-

Source : Rapport bilan2018 DREA-Cen

Commentaire : La Direction Régionale a réalisé en hors programmation un voyage d'étude à Ziniaré dans le cadre d'un partage d'expérience sur la réalisation et utilisation des latrines ECOSAN. Le montant engagé de cette activité a été estimé à 0.169 millions de FCFA

b) Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural

Tableau 27: taux d'exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l'action 7

Source de financement	Budget (a)	Paiement (b)	Taux d'exécution base paiement (100*b/a) en %
ABS	-	-	-
TOTAL	-	-	-

Source : Budget 2018 DREA-CEN

Commentaire : Aucune activité n'avait été programmée et budgétisée dans la loi de finance 2018.

5 SUIVI DES PROCEDURES DE DEVOLUTION DES MARCHES

Tableau 28 : Procédure de dévolution des marchés publics

Mode de passation des marchés							Total de marchés inscrits dans le plan de passation		État d'exécution							
Appels d'offres		Demande de prix		Manifestation d'intérêt + Demande de proposition		Entente directe			Engagés		Non engagés		Taux d'engagement			
Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Travaux	Acquisitions, Fournitures et Prestations de services	Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)	Autres	Demande de cotation	Travaux et prestations intellectuelles	Autres	Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles	Global	Travaux et prestations intellectuelles	Global
0	0	2	0	3	0	12	0	2	6	20	16.7	16.	51,34	51,34	28,62	28,62

Source : rapport bilan DREA-Cen 2018

Commentaire : Le tableau de suivi des procédures de dévolution des marchés passés au titre du PN-AEUE fait ressortir un taux d'engagement en travaux et prestation intellectuelle de **28.62%**, Ce faible taux d'exécution s'explique par le réajustement budgétaire opéré en début d'année 2018 et a touché les lignes devant servir pour la réalisation des ouvrages d'assainissement.

6 . FINANCEMENT DU PROGRAMME

Tableau 29: financement du programme

Actions	Coût du PN-AEUE (a)	Financement acquis (BPO) (b)	Gap de financement (a-b)	Taux de mobilisation (100*b/a)
Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	-	-	-	-
Action 2 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-
Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural	-	-	-	-
Action 4 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain	-	-	-	-
Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale	-	-	-	-
Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine l'assainissement des eaux usées et excréta	-	-	-	-
Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur	-	-	-	-

Source : rapport d'activités 2018 DREA-CEN

Commentaire : Le financement du programme a été orienté vers l'action 3 en 2018. Les 6 autres actions n'ont pas été financées par le budget de la DREA-CEN et les autres acteurs de la région. Le cout du programme pour la région n'est pas disponible.

7 . PRINCIPAUX FREINS, ACTIONS CORRECTIVES ET RECOMMANDATIONS

7.1 Principaux freins

Tableau 30: difficultés et propositions de solutions

Difficultés	Propositions de solutions	Acteurs de mise en œuvre	Échéance
Non programmation par les acteurs des activités de sensibilisation de masse	Encourager les acteurs à la réalisation des activités de sensibilisation de masse	DREA	-
Non priorisation par les acteurs des activités de la mise en œuvre de l'ATPC tel que défini dans la stratégie nationale de mise en œuvre de l'ATPC	Plaidoyer auprès des acteurs pour une mise en œuvre de l'ATPC suivant la stratégie nationale	DREA	-
Insuffisance du suivi des villages déclenchés par les acteurs responsables	Travailler avec les partenaires pour le suivi et l'évaluation des villages déclenchés	DREA	Janvier 2020
Insuffisance de capitalisation des activités IMS menées par les acteurs	Meilleure communication sur l'activité d'IEC	DREA	-
Insuffisance des investissements dans le domaine de l'AEUE dans la région	Accroître des investissements dans la région notamment à la direction régionale du centre	ETAT	
Difficulté de suivi des fonds transférés aux communes	Meilleure collaboration entre DREA et commune	DREA/COMMUNES	2020
Difficultés de capitalisation des investissements des acteurs dans le domaine de l'AEUE dans la région	Sensibiliser les acteurs sur la nécessité de fournir l'information financière de leur réalisation	DREA/COMMUNES	2020

Source : DREA-Cen 2018

7.2 Recommandations

- Encourager les acteurs à la mise en œuvre de l'ATPC tel que défini dans la stratégie nationale de l'ATPC
- Améliorer la communication entre les acteurs du domaine.
- Augmenter l'enveloppe financière allouée à la DREA-CEN pour les activités d'assainissement.

CONCLUSION

En conclusion nous pouvons dire que les activités d'AEUE menées au sein de la région en ont principalement concerné l'action 3 du plan opérationnel du PN-AEUE. Les ouvrages programmés ont concerné aussi bien les ouvrages institutionnels et publics que familiales avec un taux d'exécution physique au 31 décembre 2018 de **50.65%**. Ces réalisations sont à mettre à l'actif de la DREA-CEN, des ONG et des communes. Le taux d'exécution financière a été estimé à **59.89%**. Aussi nous pouvons remarquer que les activités se sont portés majoritairement vers les réalisations physiques occultant l'aspect adoption des bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement sans lesquelles les objectifs du PN-AEUE ne pourrait être atteint. Aussi un accent particulier doit être mis sur ce point pour les prochaines années.

ANNEXES

Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020

Tableau 31 : Plan d'opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalizations 2016	Réalisation s 2017	Programm ations révisées au 30 juin 2018	Réalisation s au 31 décembre 2018
Action 1 : Eradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural					
Objectif Opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène en milieu rural					
Produit1: La défécation à l'air libre est abandonnée dans l'ensemble des villages administratifs					
Mettre en place des comités régionaux de coordination de l'ATPC	Comité Régional	0	0	0	0
Déclencher des villages	Village déclench é	5	26	0	0
Suivre et évaluer les villages déclenchés (post déclenchement)	Village suivi et évalué	0	0	31	0
Certifier les villages déclarés FDAL	Village déclaré	0	0	31	0
Produit2: Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes					

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta

Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmations révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
pratiques d'hygiène et d'assainissement					
Sensibiliser en milieu scolaire (PHA en milieu scolaire)		0	3	2	2
Sensibiliser en milieu sanitaire (PHA en milieu sanitaire)		0	3	2	0
sensibiliser dans les espaces publics (PHA dans les espaces publics)&	-		4	0	0
Sensibiliser à travers des visites à domicile	Campagne de sensibilisation de proximité	26	64	0	0
Mener des sensibilisations de masse (médias)	Campagne de sensibilisation de masse	0	0	0	0
TOTAL ACTION 1					
Action 3 : Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural					
Objectif Spécifique 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d'assainissement en milieu rural					
Produit1: Le					

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmations révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
développement de l'assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur					
Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance	Planification annuelle	01	01	01	01
Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome	Etudes réalisées	01	01	01	01
Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des latrines autonomes	Mission effectuée	01	01	00	00
Réaliser des latrines familiales	Latrines réalisées	937	1354	1734	1302
Réhabiliter des latrines familiales	Latrines réhabilités	0	0	0	0
Réaliser les puisards domestiques	Puisard domestique réalisé	0	50	25	0
Produit2: Le					

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmations révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
développement du service de l'assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l'AFDH et aux normes en vigueur					
Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics	Etude réalisée	0	0	0	0
Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des ouvrages institutionnels et publics	Mission effectuée	0	1	1	1
Réaliser des latrines dans les écoles	Latrine réalisée	0	11	19	21
Réhabiliter des latrines dans les écoles	Latrine réhabilitée	0	0	0	0
Réaliser des latrines dans les centres de santé	Latrine réalisée	0	4	4	6
Réhabiliter des latrines dans les centres de santé	Latrine réhabilitée	0	0	0	0
Réaliser des latrines dans les lieux publics	Latrine réalisée	0	14	12	11

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmations révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
Réhabiliter des latrines dans les lieux publics	Latrine réhabilitée	0	0	0	4
Produit3: La gestion durable des infrastructures d'assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural					
Accompagner les communes dans l'exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages	Mission effectuée	0	0	0	0
Organiser des campagnes d'information/sensibilisation des communes sur l'intercommunalité, les dispositions légales et réglementaires, leurs importances pour le développement local	Campagne d'information/sensibilisation	0	0	0	0
Inciter, accompagner et Suivre des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d'assainissement ;	Session de travail	0	0	0	0
Evaluer des processus d'intercommunalités mis en place pour	Mission effectuée	0	0	0	0

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmes révisés au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d'actions.					
Formations des acteurs au niveau communal (formation à l'endroit des acteurs de mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures : maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES)	Formation	0	7	4	2
TOTAL ACTION 3					
Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale					
Objectif Spécifique 5 : Optimiser la gestion des eaux usées et boues de vidange					
Produit1: La chaîne de valeur de l'assainissement est structurée et					

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta

Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmations révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
développée					
Vulgariser la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement pour sa mise en œuvre	Séance de vulgarisation	0	0	0	0
Mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement	Campagne d'information	0	0	0	0
Valoriser les sous-produits de l'assainissement.	Sous-produits valorisés	0	0	0	0
Produit2: Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal					
Mettre en œuvre les actions du PGES	Action mis en œuvre	0	0	0	0
TOTAL ACTION 5					
Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur					
Objectif Spécifique 7 : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.					
Produit1: Les ressources financières nécessaires à la mise					

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmations révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
en œuvre du programme sont progressivement mobilisées					
Organiser des sanithons pour la collecte de fonds	Sanithon	0	0	0	0
Organiser des tables rondes avec les bailleurs de fonds ou avec la diaspora pour le financement de l'assainissement	Table ronde	0	0	0	0
Elaborer les BPO régionaux	BPO	1	1	1	1
Développer de nouveaux mécanismes de financement endogène de l'assainissement (boutiques d'assainissement, micro crédits, crédits-bail)	-	0	0	0	0
Produit3: Une part de plus en plus importante de l'assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.					
Identifier et médiatiser des "champions d'assainissement"	Champion identifié	0	0	0	0
Produit4: Le transfert de compétences et des ressources aux					

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmations révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
communes en matière d'assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance					
Poursuivre la mise en œuvre à l'échelle du transfert des compétences et des ressources financières aux communes	Montant transféré	0	0	150.000.000	
Evaluer les expériences de transferts des ressources aux communes	Rapport d'évaluation	0	0	0	0
Produit5: Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance					
Renforcer les capacités des acteurs de l'assainissement à travers des formations, des voyages d'études, des partages d'expérience.....	Acteur touché	0	0	8	8
Réaliser des formations dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-	Formation	0	0	0	0

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmations révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux					
Renforcer les capacités des acteurs de l'assainissement à travers des voyages d'études et des partages d'expérience	Voyage d'étude	0	0	0	1
Développer les projets d'investissement dans le cadre du Partenariat Public Privé en matière d'assainissement	Projet	0	0	0	0
Produit6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA					
Elaborer les rapports bilan et programmation du PN-AEUE	Rapport	3	3	3	3
Elaborer les outils d'opérationnalisation du programme (manuel de suivi évaluation, manuel de procédures administrative, financières et comptable...)					
Opérationnaliser le plan de communication	Plan de communi	0	0	0	0

PROGRAMME 1 : Programme National d'Assainissement des Eaux Usées et Excréta					
Activités	unité	Réalisations 2016	Réalisations 2017	Programmations révisées au 30 juin 2018	Réalisations au 31 décembre 2018
du secteur de l'AEPA	cation				
Tenir des ateliers nationaux, régionaux, provinciaux et communaux de programmation et de revues bilans du secteur de l'AEUE	Atelier	2	2	2	2
TOTAL ACTION 7					
TOTAL PROGRAMME AEUE					

Source : plan opérationnel du programme PN-AEUE (version finale)

Tableau 32 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO)

	OBJECTIF OPERATIONNEL	INDICATEURS	CODE DISE	Réalizations		Cibles		
				2016	2017	2018	2019	2020
ACTION 1 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural	Objectif opérationnel : Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages déclenchés	2A1bis.1	5	26	ND	ND	ND
		Nombre de villages déclarés FDAL	??	0	0	ND	ND	ND
		Proportion de villages certifiés FDAL	2A1.1	0	0	ND	ND	ND
		Nombre de latrines familiales construites	2A5.1	937	1354	250	250	1075

	OBJECTIF OPERATION NEL	INDICATEUR S	CODE DISE	Réalizations		Cibles		
				2016	2017	2018	2019	2020
ACTION 1 & 2 : Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement au niveau régional	Objectif Opérationnel : Eradiquer la défécation à l'air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d'adoption pérenne de pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement	Nombre de villages et secteurs déclenchés	2A1bi					
		Nombre de villages et secteurs déclarés FDAL	??					
		Proportion de villages et secteurs certifiés FDAL	2A1s					
		Nombre de latrines familiales construites	2A5					
		Proportion des ouvrages d'assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation	4A12					
ACTION 11207: Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage	Objectif Opérationnel : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du	Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de financement du PN-AEUE	1A1	10.7 %	11.74 %	3.55 %	5.22 %	35.66 %

	OBJECTIF OPERATION NEL	INDICATEUR S	CODE DISE	Réalizations		Cibles		
				2016	2017	2018	2019	2020
du sous- secteur	sous-secteur	Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta base engagement	1A2	100 %	100%	100 %	100 %	100%
		Taux d'exécution du budget du programme national d'assainissement des eaux usées et excréta base liquidation	1A2bis	100 %	100%	100 %	100 %	100%
		Proportion des fonds publics AEUE transférés aux collectivités territoriales	1G2	0	0	0.16	0.2	0.2
		Nombre de personnes bénéficiaires d'un renforcement de capacité dans le domaine de l'AEUE		26	21	0	20	20

	OBJECTIF OPERATION NEL	INDICATEUR S	CODE DISE	Réalizations		Cibles		
				2016	2017	2018	2019	2020
		Taux de réalisation des cadres de concertation du PN-AEUE (cadres règlementaire)		100 %	100%	100 %	100 %	100%
		Taux de renseignement des indicateurs de suivi-évaluation intégré du PN-AEUE.	4A11	0	0	0	100 %	100%

Source : Document du DISE, Aout 2017 et Document du PN-AEUE, mai 2016
